


# 東京外環 用地取得の状況

R3年8月末現在

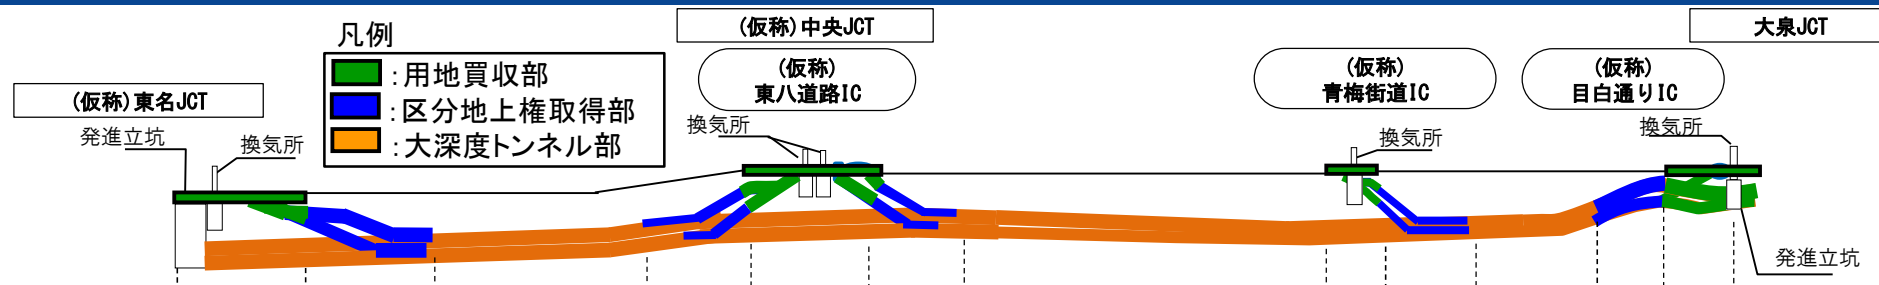

用地取得の 態様	東名JCT		-	中央JCT			-	青梅街道IC		-	大泉JCT	
	買収	区分 地上権		区分 地上権	買収	区分 地上権		買収	区分 地上権		買収	

面積ベース

	東名JCT		中央JCT		青梅街道IC		大泉JCT	合計
買収	99%(±0%)	-	99%(±0%)	-	32%(+3%)	-	99%(±0%)	93%(±0%)
区分地上権	98%(+1%)	-	96%(+1%)	-	37%(+10%)	-	100%(±0%)	86%(+2%)
合計	99%(+1%)	-	99%(±0%)	-	35%(+7%)	-	99%(±0%)	91%(+1%)


件数ベース

	東名JCT		中央JCT		青梅街道IC		大泉JCT	合計
買収	97%(±0%)	-	99%(±0%)	-	43%(+6%)	-	99%(±0%)	93%(+1%)
区分地上権	92%(+2%)	-	93%(+1%)	-	33%(+9%)	-	100%(±0%)	83%(+2%)
合計	95%(+2%)	-	96%(±0%)	-	37%(+7%)	-	99%(±0%)	89%(+2%)

残件数

	東名JCT		中央JCT		青梅街道IC		大泉JCT	合計
買収	8(±0)	-	2(±0)	-	73(-8)	-	3(±0)	86(-8)
区分地上権	20(-7)	-	24(-2)	-	117(-16)	-	0(±0)	161(-25)
合計	28(-7)	-	26(-2)	-	190(-24)	-	3(±0)	247(-33)

※用地取得は、国、東京都、NEXCO東日本、NEXCO中日本が分担して実施  
 ※用地買収部については平成26年度より土地収用法に基づく収用手続きを活用中  
 (事業者からの裁決申請・明渡裁決申立後は東京都収用委員会において手続きを実施)

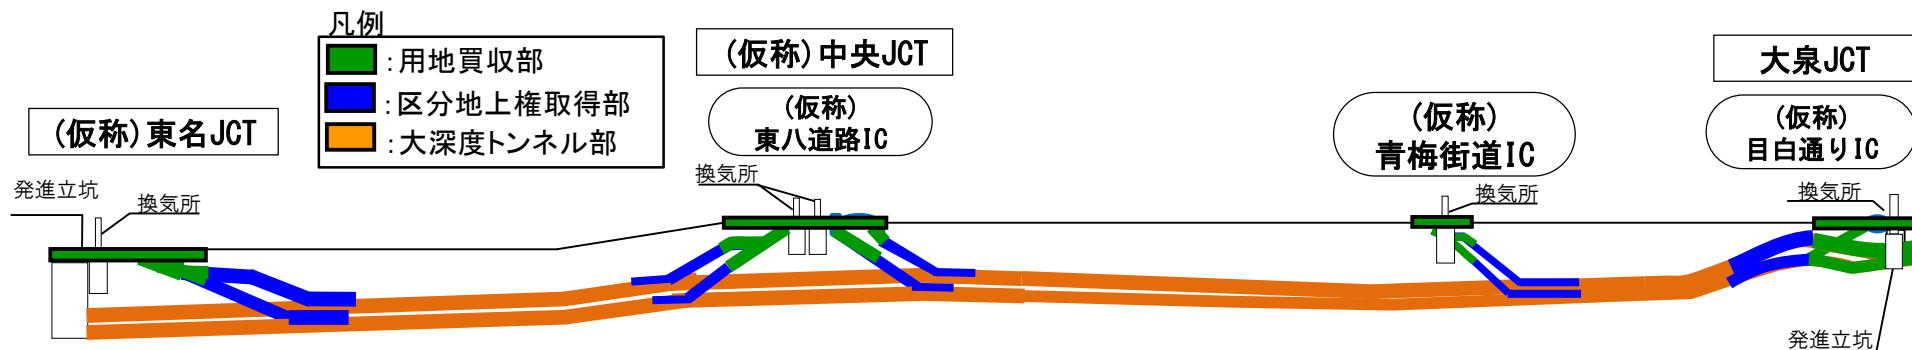

## 埋蔵文化財調査対象地のうち 着工可能な面積の割合

	※(注) 東名JCT	中央JCT	青梅街道IC	大泉JCT	合計
進捗率	98% (+2%)	100% (±0%)	0% (±0%)	100% (±0%)	88% (+1%)

※( )内の数値は、R2年6月(前回会議資料)比

※東京都との調整により調査必要範囲を事前に確定  
 ※調査必要範囲について、工事着工前に区市の立ち会いのもと試掘調査(確認調査)を実施し、その結果を踏まえ、必要に応じて東京都にて本掘調査を実施

$$\text{※進捗率} = \frac{\text{調査済み面積}}{\text{調査対象面積}}$$
