


# 東京外環 用地取得の状況

※R4年1月末現在

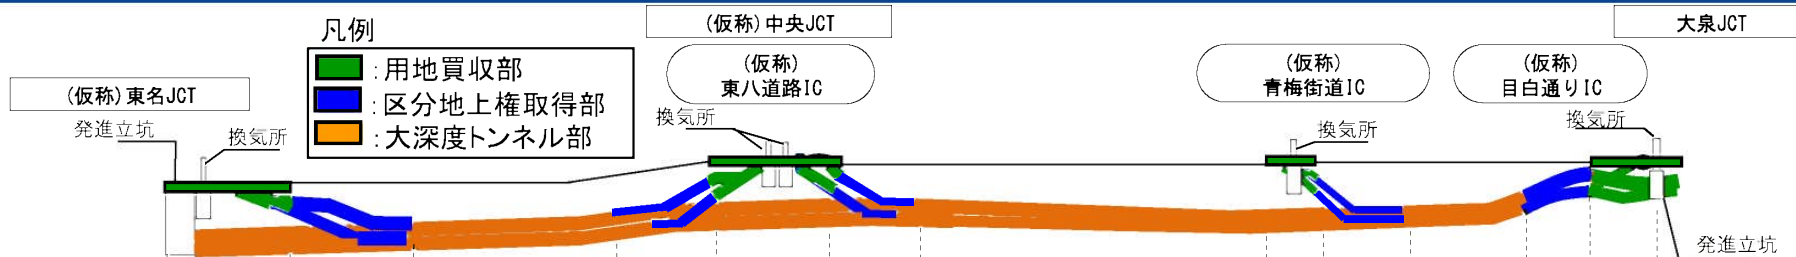

用地取得の 態様	東名JCT		中央JCT			青梅街道IC		大泉JCT	
	買収	区分 地上権	—	区分 地上権	買収	区分 地上権	—	区分 地上権	買収

面積ベース

	東名JCT	—	中央JCT	—	青梅街道IC	—	大泉JCT	合計
買収	99% (±0%)	—	99% (±0%)	—	33% (+1%)	—	99% (±0%)	93% (±0%)
区分地上権	98% (±0%)	—	96% (±0%)	—	43% (+6%)	—	100% (±0%)	87% (+1%)
合計	99% (±0%)	—	99% (±0%)	—	38% (+3%)	—	99% (±0%)	92% (+1%)

件数ベース

	東名JCT	—	中央JCT	—	青梅街道IC	—	大泉JCT	合計
買収	97% (±0%)	—	99% (±0%)	—	46% (+3%)	—	99% (±0%)	93% (±0%)
区分地上権	92% (±0%)	—	94% (+1%)	—	41% (+8%)	—	100% (±0%)	85% (+2%)
合計	95% (±0%)	—	97% (+1%)	—	43% (+6%)	—	99% (±0%)	90% (+1%)

残件数


	東名JCT	—	中央JCT	—	青梅街道IC	—	大泉JCT	合計
買収	7(-1)	—	2(±0)	—	70(-3)	—	3(±0)	82(-4)
区分地上権	20(±0)	—	20(-4)	—	103(-14)	—	0(±0)	143(-18)
合計	27(-1)	—	22(-4)	—	173(-17)	—	3(±0)	225(-22)

※用地取得は、国、東京都、NEXCO東日本、NEXCO中日本が分担して実施  
 ※用地買収部については平成26年度より土地収用法に基づく収用手続きを活用中  
 (事業者からの裁決申請・明渡裁決申立後は東京都収用委員会において手続きを実施)

※( )内の数値は、R3.8月(前回会議資料)比

# 東京外環 埋蔵文化財調査の状況

※R4年1月末現在

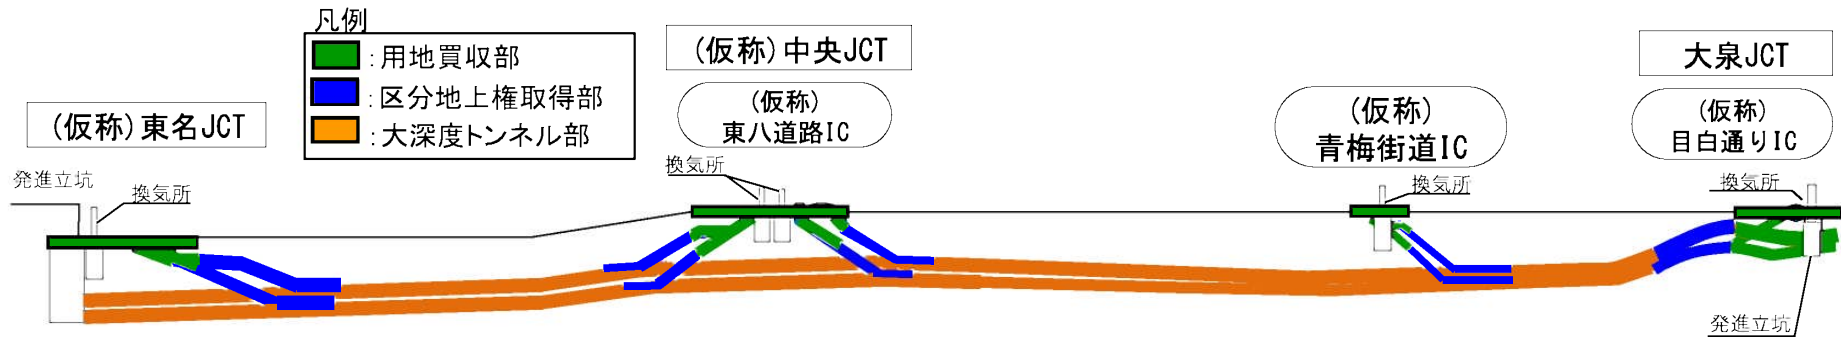

## 埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合

	※(注) 東名JCT	中央JCT	青梅街道IC	大泉JCT	合計
進捗率	98% (±0%)	100% (±0%)	0% (±0%)	100% (±0%)	88% (±0%)

※()内の数値は、R3.8月(前回会議資料)比

※東京都との調整により調査必要範囲を事前に確定  
 ※調査必要範囲について、工事着工前に区市の立ち会いのもと試掘調査(確認調査)を実施し、その結果を踏まえ、必要に応じて東京都にて本掘調査を実施

$$\text{※進捗率} = \frac{\text{調査済み面積}}{\text{調査対象面積}}$$
