

直轄河川緊急復旧工事実施状況

[平成23年東北地方太平洋沖地震による河川被災箇所]



千葉県野田市関宿江戸町地先
江戸川(左岸58.0k ~ 58.2k)

平成23年3月19日 10:00

国土交通省 関東地方整備局河川部

今後の工事進捗に伴い、掲載している情報が変更されることがあります。

東北地方太平洋沖地震 関東地方整備局 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

水系名	河川名	箇所数
利根川	利根川下流	9
	利根川上流	1
	江戸川	2
	小貝川	5
	霞ヶ浦(常陸利根川)	12
那珂川	那珂川	6
久慈川	久慈川	8
合計	3水系7河川	43

平成23年 3月19日 10時現在



準備中
山田川(左岸6.5k)

準備中
久慈川(左岸15.0k)
久慈川(左岸16.0k)
久慈川(右岸19.8k)

準備中
那珂川(左岸5.5k)

工事着手
利根川(右岸41.0k)

- 凡例
- 準備中
 - 工事着手
 - 工事中
 - 完了


<トピックス>

- ・那珂川(左岸5.5k)、久慈川(左岸15.0k、左岸16.0k、右岸19.8k)久慈川(山田川左岸6.5k)で5箇所の工事箇所を追加
- ・復旧工事中は36箇所(現地測量含む)
- ・利根川(右岸157.0k)、那珂川(左岸30.0k)の2箇所は完了

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

1 地先名：茨城県神栖市横瀬地先
河川名：利根川下流(左岸18.6k～19.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在

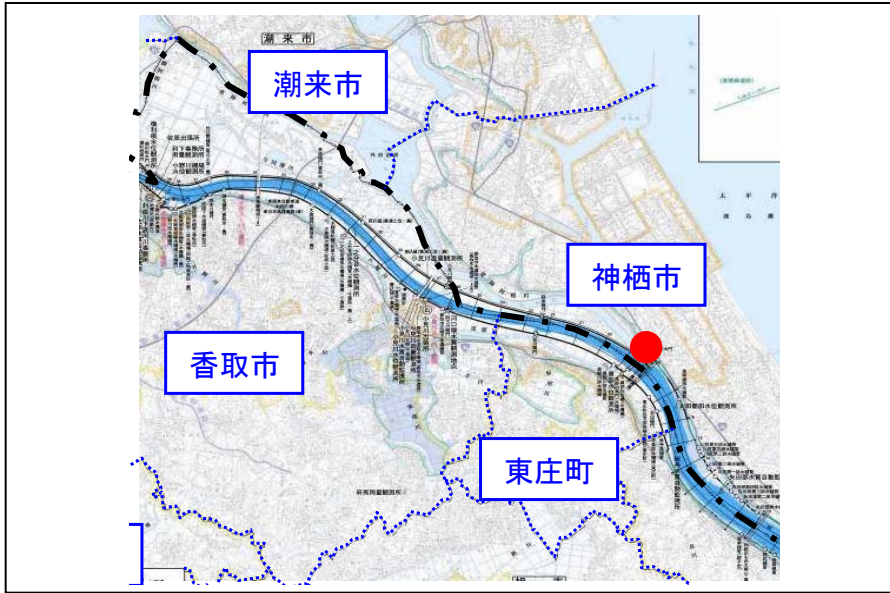


- 被災内容：堤防陥没 L=389m
- 復旧工法：盛換工法 約14,000m³
シート張 約5,600m²
大型土嚢 約780袋
- 着手日：平成23年3月13日
- 工事期間：8日間程度
- 現在の状況：舗装撤去工完了
掘削工完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

2 地先名:千葉県香取市小見川地先
河川名:利根川下流(右岸27.1k~27.2k)

平成23年 3月19日 10:00現在

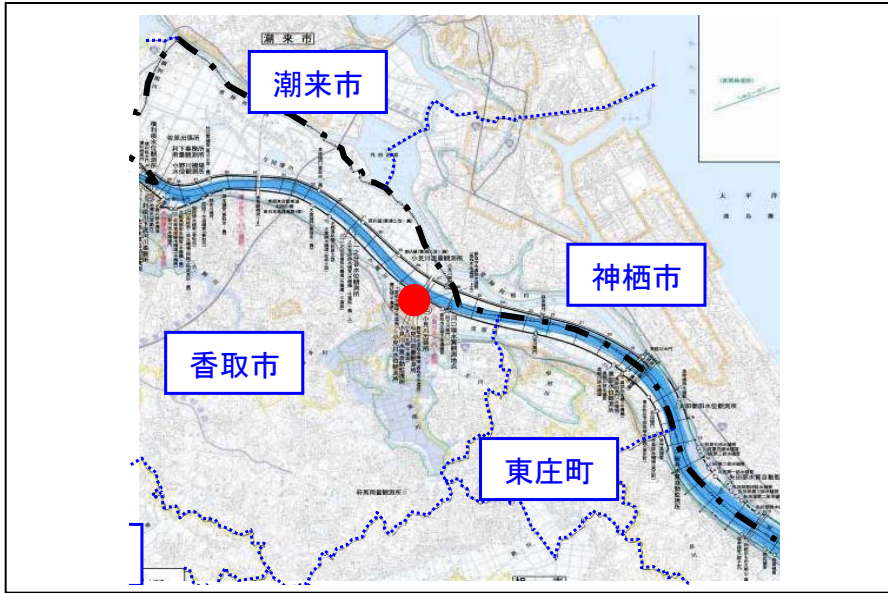

①天端沈下状況

被災状況



- ・被災内容: 堤防天端沈下 L=70m
- ・復旧工法: 盛換工法 約1,700m³
シート張り 約810m²
大型土嚢 約210袋
- ・着手日: 平成23年3月14日
- ・工事期間: 7日間程度
- ・現在の状況: 掘削工施工中
大型土嚢製作中


進捗状況



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

3 地先名:千葉県香取市佐原地先
河川名:利根川下流(右岸38.7k~38.9k)

平成23年 3月19日 10:00現在

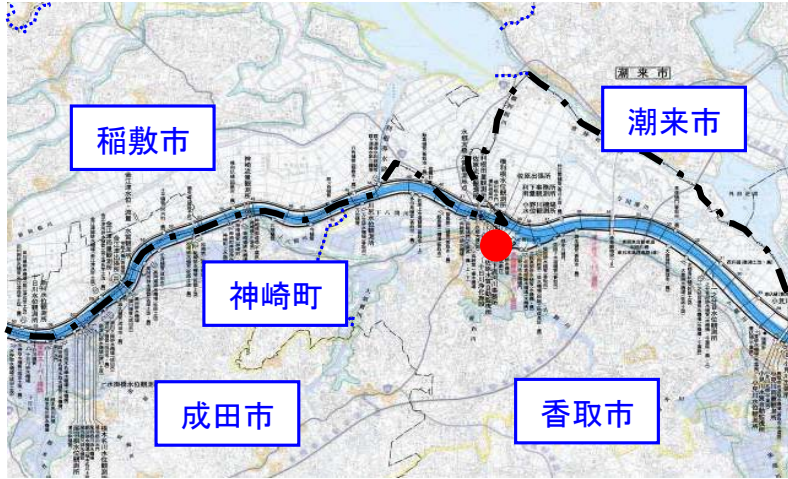

被災状況



- 被災内容: 堤防天端沈下 L=134m
- 復旧工法: 盛換工法 約2,900m³
シート張り 約2,900m²
大型土嚢 約140袋
- 着手日: 平成23年3月14日
- 工事期間: 7日間程度
- 現在の状況: 起工測量完了

被災状況




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

4

地先名：千葉県香取郡神崎町神崎本宿地先
河川名：利根川下流(右岸49.1k～49.2k)

平成23年 3月19日 10:00現在

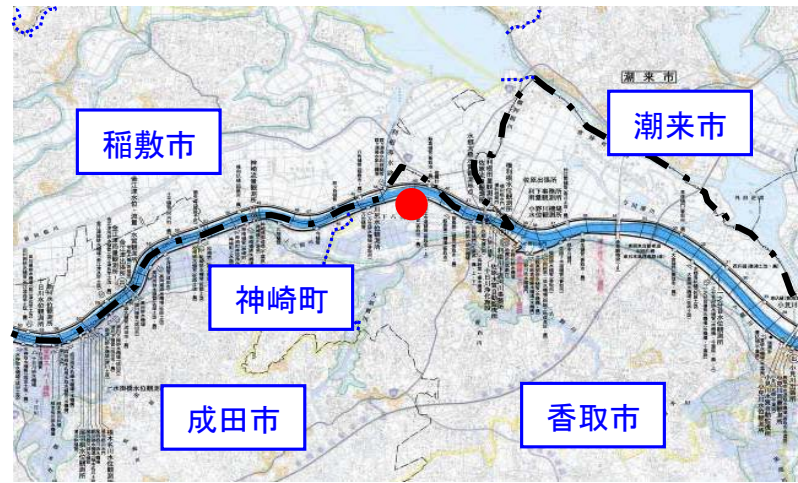

被災状況



- 被災内容：堤防天端沈下 L=140m
- 復旧工法：盛換工法 約1,600m³
シート張り 約500m²
大型土嚢 約280袋
- 着手日：平成23年3月14日
- 工事期間：10日間程度
- 現在の状況：掘削工施工中
大型土嚢製作中

進捗状況




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

5

地先名：茨城県稲敷郡河内町龍ヶ崎町歩地先
河川名：利根川下流(左岸67.2k~68.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在

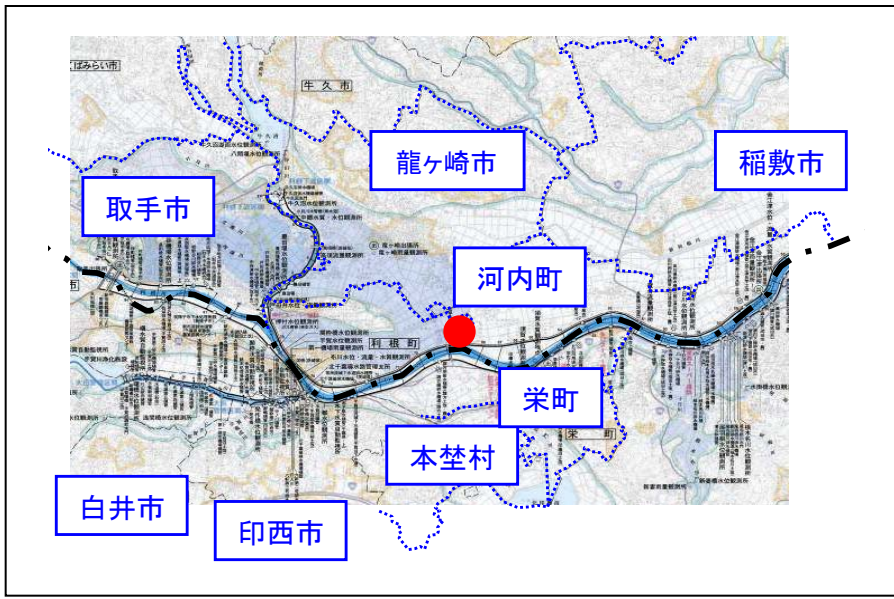

- ・被災内容：堤防天端沈下 L=550m
- ・復旧工法：


盛換工法	約28,000m ³
シート張り	約16,500m ²
大型土嚢	約1,100袋
- ・着手日：平成23年3月14日
- ・工事期間：17日間程度
- ・現在の状況：舗装撤去工完了
掘削工、盛土工施工中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

6 地先名:千葉県印旛郡栄町請方地先
河川名:利根川下流(右岸69.1k~69.2k)

平成23年 3月19日 10:00現在

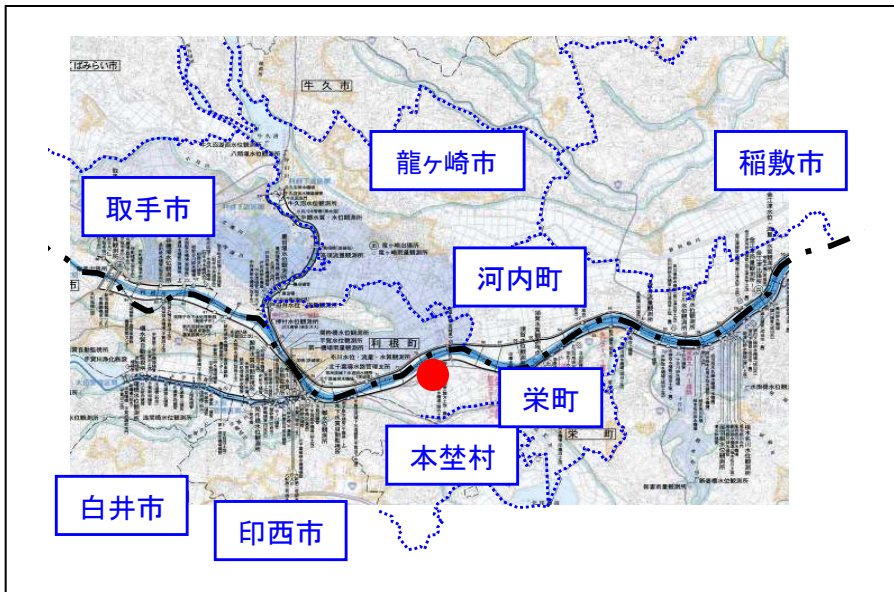


- ・ 被災内容: 堤防天端沈下 L=116m
- ・ 復旧工法: 盛換工法 約4,500m³
シート張り 約2,700m²
大型土嚢 約120袋
- ・ 着手日: 平成23年3月14日
- ・ 工事期間: 12日間程度
- ・ 現在の状況: 舗装撤去工完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

平成23年 3月19日 10:00現在

7 地先名:千葉県印旛郡栄町中谷地先
河川名:利根川下流(右岸69.7k~70.1k)

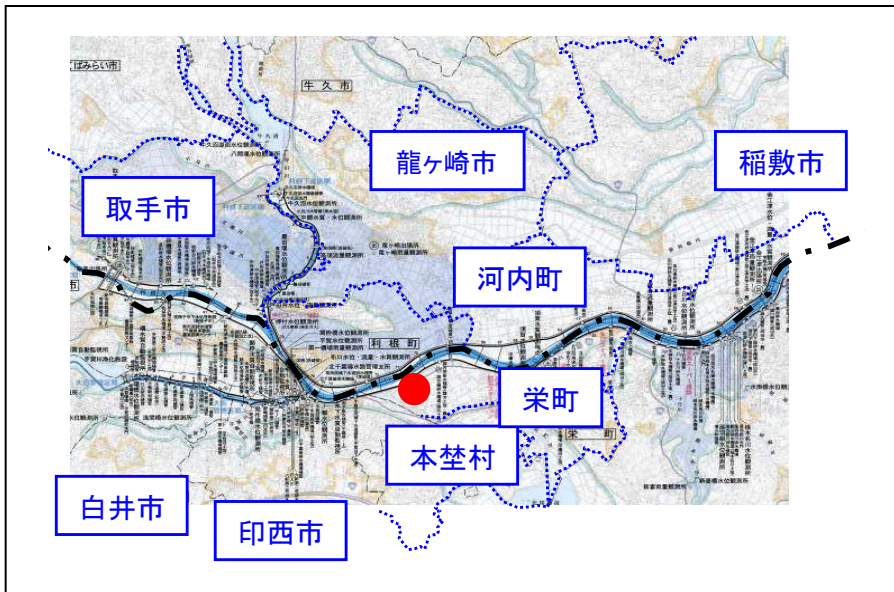

被災状況

- ・被災内容: 堤防天端沈下 L=430m
- ・復旧工法: 盛換工法 約17,000m³
シート張り 約10,000m²
大型土嚢 約430袋
- ・着手日: 平成23年3月14日
- ・工事期間: 14日間程度
- ・現在の状況: 舗装撤去工施工中




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

8

地先名：千葉県印旛郡栄町三和地先
河川名：利根川下流(右岸70.3k~71.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在

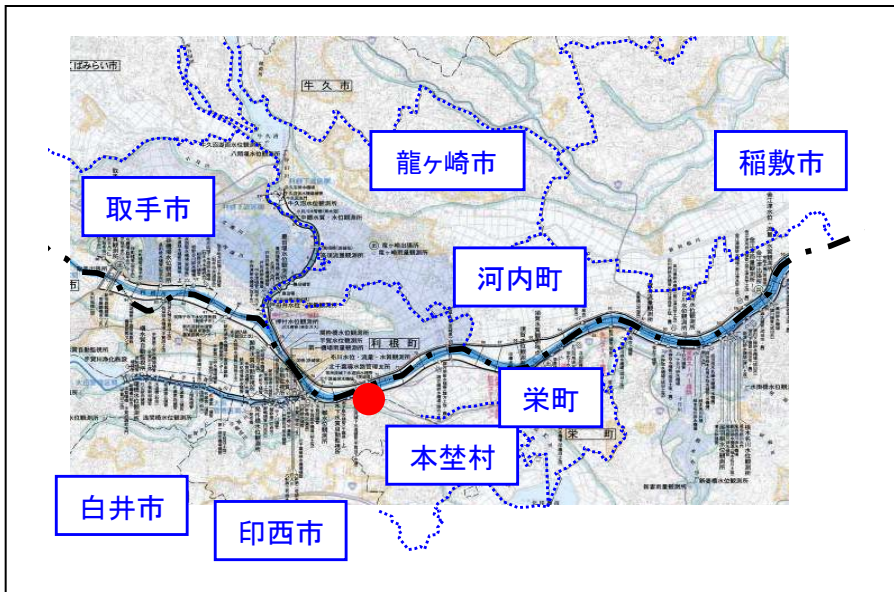

被災状況

- ・被災内容：堤防天端沈下 L=633m
- ・復旧工法：

盛換工法	約25,000m ³
シート張り	約15,000m ²
大型土嚢	約640袋
- ・着手日：平成23年3月14日
- ・工事期間：16日間程度
- ・現在の状況：舗装撤去工施工中
掘削工、盛土工施工中




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

38

地先名:千葉県香取市佐原口地先
河川名:利根川下流(右岸41.0k~41.2k)

平成23年 3月19日 10:00現在

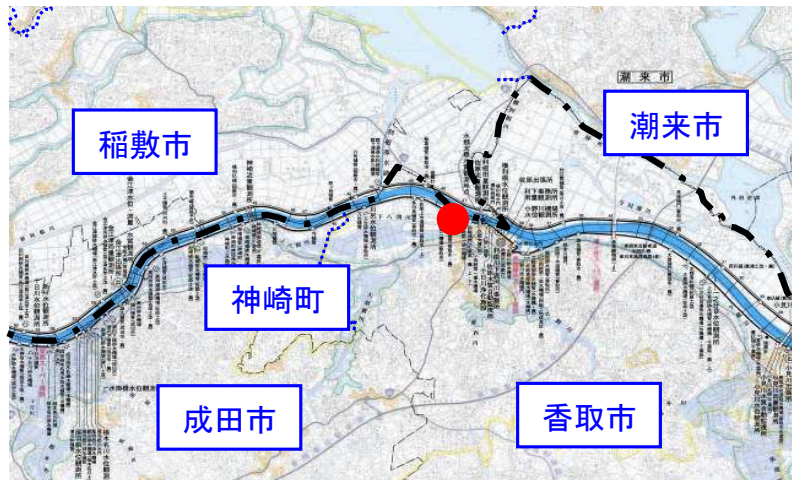

被災状況



- ・被災内容: 堤防法滑り L=210m
- ・復旧工法: 盛換工法 約3,100m³
シート張り 約5,500m²
大型土嚢 約630袋
- ・着手日: 平成23年3月18日
- ・工事期間: 12日間程度
- ・現在の状況: 起工測量実施中


被災状況



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

10 地先名: 埼玉県幸手市西関宿地先
河川名: 江戸川(右岸57.6k~57.8k)

平成23年 3月19日 10:00現在

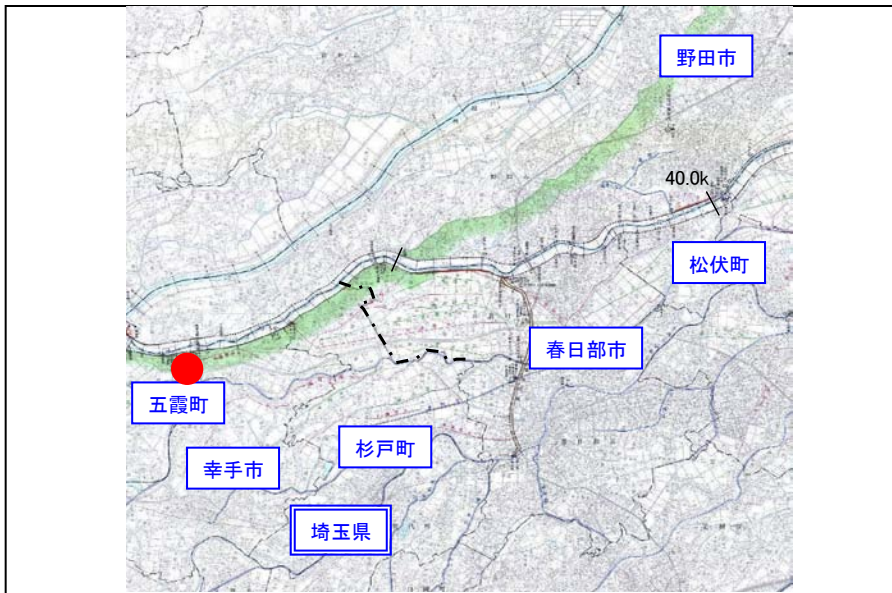

被災状況

- ・被災内容: 川裏小段法崩れ L=200m
- ・復旧工法: 盛換工法 約27,200m³
張芝 約6,600m²
- ・着手日: 平成23年3月12日
- ・工事期間: 27日間程度
- ・現在の状況: 掘削工施工中
付帯道路撤去中




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

11 地先名:千葉県野田市関宿江戸町地先
河川名:江戸川(左岸58.0k~58.2k)

平成23年 3月19日 10:00現在

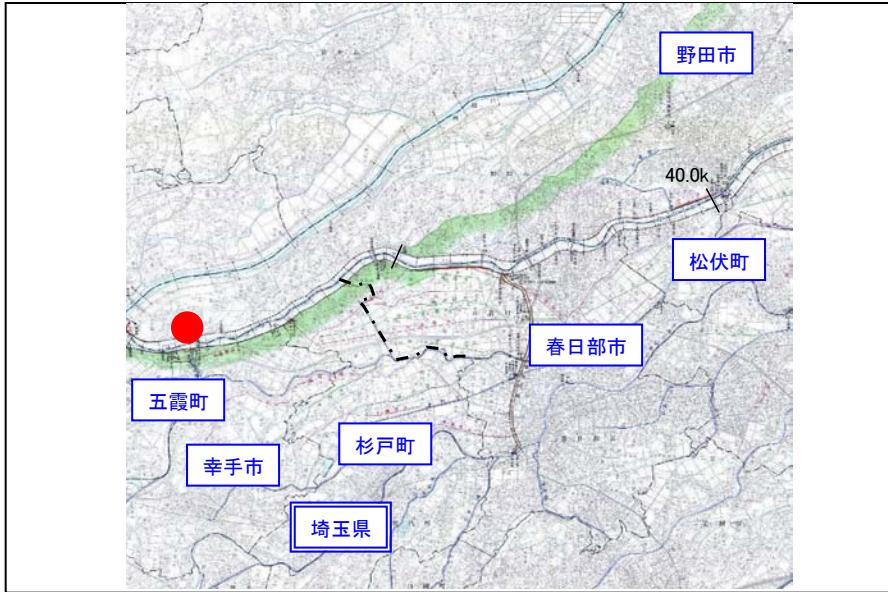

- ・被災内容: 川表法すべり L=230m
- ・復旧工法: 盛換工法 約11,500m³
表層改良 約3,000m³
張芝 約5,000m²
- ・着手日: 平成23年3月12日
- ・工事期間: 18日間程度
- ・現在の状況: 盛土工完了




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

地先名:茨城県下妻市鯨地先

平成23年 3月19日 10:00現在

河川名:小貝川(右岸39.2k~39.3k)

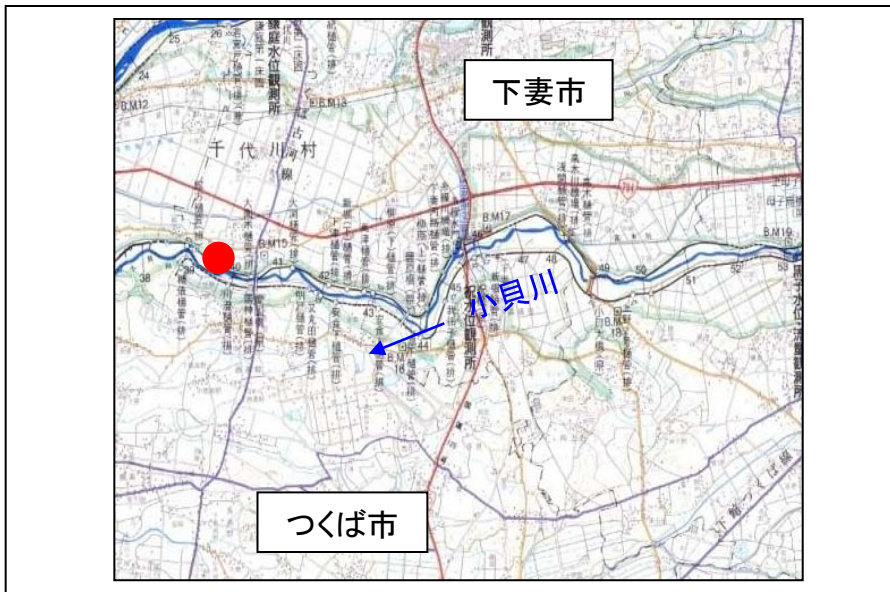

- ・被災内容: 堤防崩れ L=125m
- ・復旧工法: 盛換工法 約3,700m³
表層改良 約700m²
張芝 約900m²
- ・着手日: 平成23年3月12日
- ・工事期間: 11日間程度
- ・現在の状況: 舗装版撤去完了
掘削工施工中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

14 地先名:茨城県常総市上蛇地先
河川名:小貝川(右岸31.7k~31.8k)

平成23年 3月19日 10:00現在



被災状況

- ・被災内容: 堤防クラック L=60m
- ・復旧工法: 盛換工法 約5,400m³
シート張 約1,500m²
- ・着手日: 平成23年3月14日
- ・工事期間: 9日間程度
- ・現在の状況: 舗装版撤去完了
掘削工、盛土工施工中



進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

15 地先名:茨城県つくば市上郷地先
河川名:小貝川(左岸34.9k~35.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在




- ・被災内容: 堤防クラック L=100m
- ・復旧工法: 盛換工法 約7,500m³
シート張 約3,000m²
- ・着手日: 平成23年3月14日
- ・工事期間: 9日間程度
- ・現在の状況: 舗装版撤去完了
掘削工、盛土工施工中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

16 地先名:茨城県つくば市安食地先
河川名:小貝川(左岸41.9k~42.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在

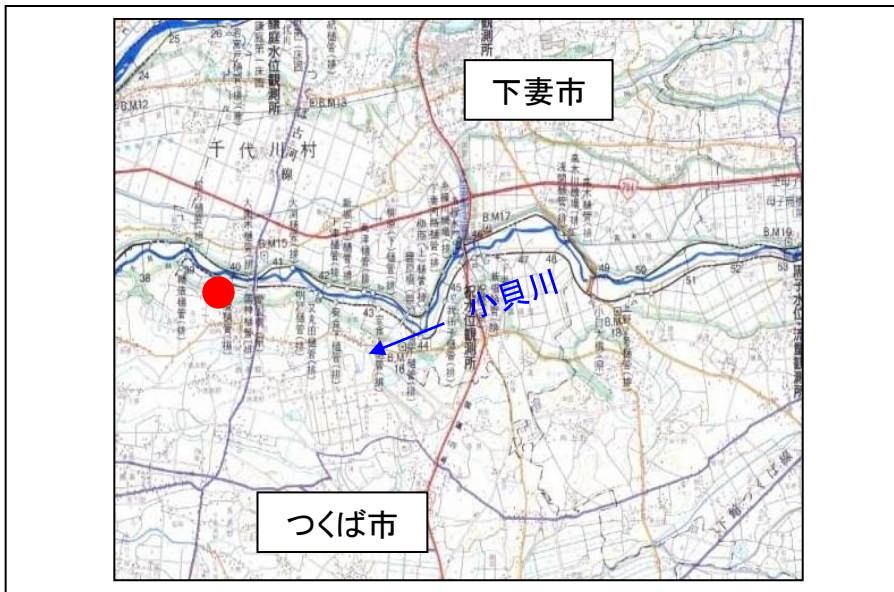

- ・被災内容: 堤防クラック・沈下 L=59m
- ・復旧工法: 盛換工法 約4,500m³
張芝 約1,400m²
- ・着手日: 平成23年3月14日
- ・工事期間: 8日間程度
- ・現在の状況: 舗装版撤去施工中
掘削工施工中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

17 地先名：茨城県水戸市下大野地先
河川名：那珂川(右岸3.8k~4.5k)

平成23年 3月19日 10:00現在



- ・ 被災内容：堤防天端亀裂 L=650m
- ・ 復旧工法：盛換工法 約17,600m³
シート張 約12,000m²
- ・ 着手日：平成23年3月15日
- ・ 工事期間：10日間程度
- ・ 現在の状況：表土剥ぎ、掘削工施工中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

平成23年 3月19日 10:00現在

18 地先名:茨城県水戸市東大野地先
河川名:那珂川(右岸7.2k~7.3k)



- ・被災内容:堤防川表亀裂 L=150m
- ・復旧工法:盛換工法 約2,000m³
シート張 約1,400m²
- ・着手日:平成23年3月15日
- ・工事期間:8日間程度
- ・現在の状況:表土剥ぎ、掘削工施工中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

平成23年 3月19日 10:00現在

19 地先名:茨城県水戸市若宮地先
河川名:那珂川(右岸9.2k~9.6k)




- ・被災内容: 堤防天端沈下 L=430m
- ・復旧工法: 盛換工法 約5,800m³
シート張 約5,500m²
- ・着手日: 平成23年3月15日
- ・工事期間: 12日間程度
- ・現在の状況: 舗装版撤去完了
掘削工施工中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

20 地先名:茨城県常陸大宮市小場地先
河川名:那珂川(左岸30.0k~31.0k)

平成23年 3月19日 5:40完了

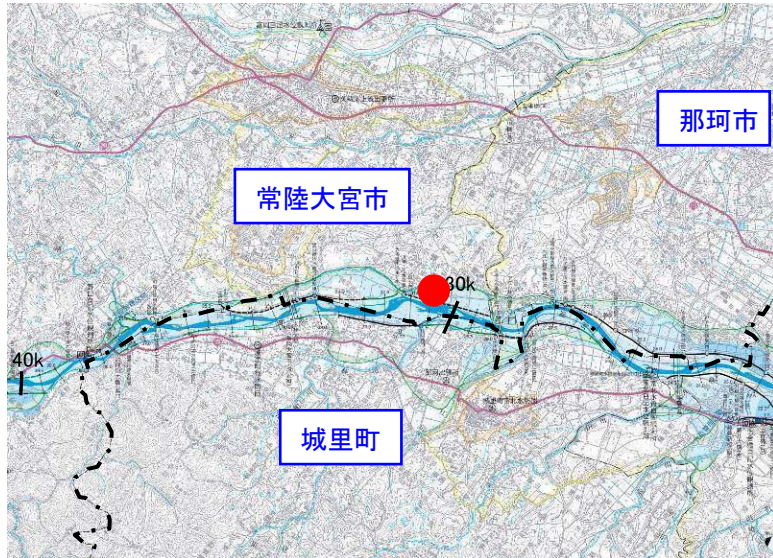

被災状況

- ・被災内容:堤防亀裂 L=1,000m
- ・復旧工法:盛換工法 約3,800m³
- ・着手日:平成23年3月15日
- ・完了日:平成23年3月19日5時40分



進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

平成23年 3月19日 10:00現在


21

地先名：茨城県水戸市根本町地先
河川名：那珂川(右岸13.0k~13.1k)



被災状況(川表)

- 被災内容：堤防亀裂 L=165m
- 復旧工法：盛換工法 約2,000m³
張芝 約1,500m²
- 着手日：平成23年3月16日
- 工事期間：7日間程度
- 現在の状況：起工測量完了
クラック調査中
表土剥ぎ施工中

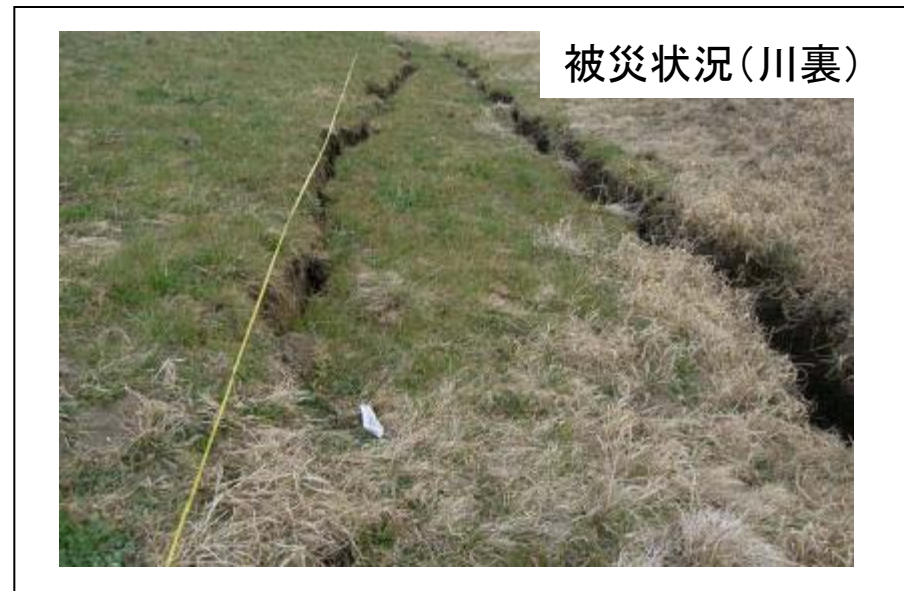


被災状況(川裏)

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

39

地先名：茨城県ひたちなか市三反田地先
河川名：那珂川(左岸5.5k～7.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在

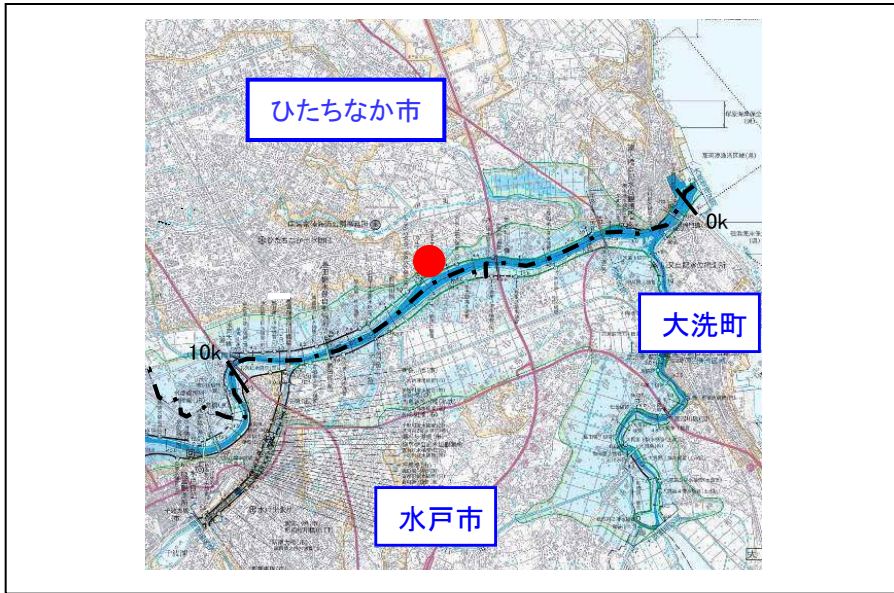

被災状況

- 被災内容：堤防亀裂 L=1,365m
- 復旧工法：盛換工法 約30,000m³
張芝 約14,200m²

被災調査完了

今後、速やかに工事着手予定。




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

22 地先名:茨城県常陸太田市栗原地先
河川名:久慈川(左岸14.0k~14.6k)

平成23年 3月19日 10:00現在

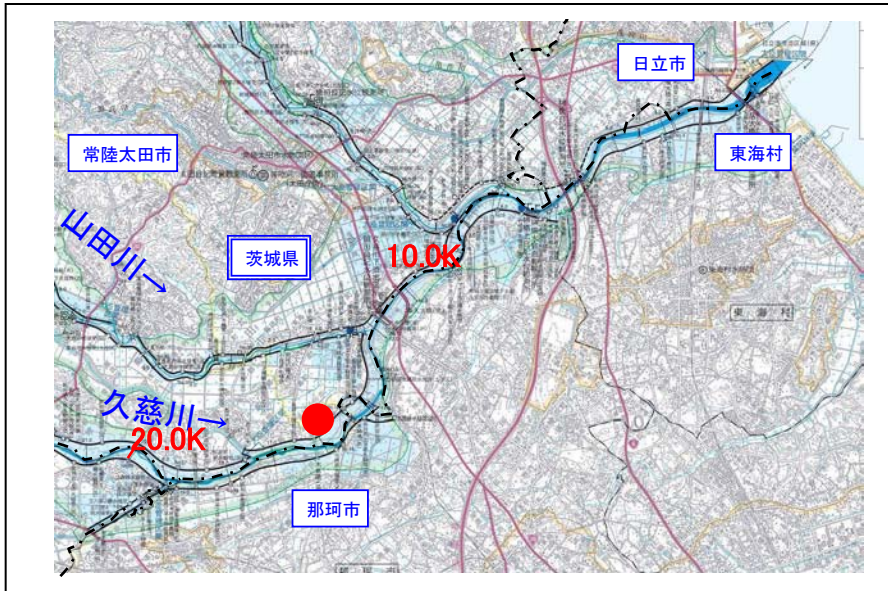

被災状況

- ・被災内容:堤防天端沈下・亀裂 L=130m
- ・復旧工法:盛換工法 約4,500m³
シート張 約3,200m²
- ・着手日:平成23年3月16日
- ・工事期間:10日間程度
- ・現在の状況:舗装版撤去完了
亀裂面試験掘削施工中




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

23 地先名:茨城県那珂市鹿島地先
河川名:久慈川(右岸17.5k~18.6k)

平成23年 3月19日 10:00現在

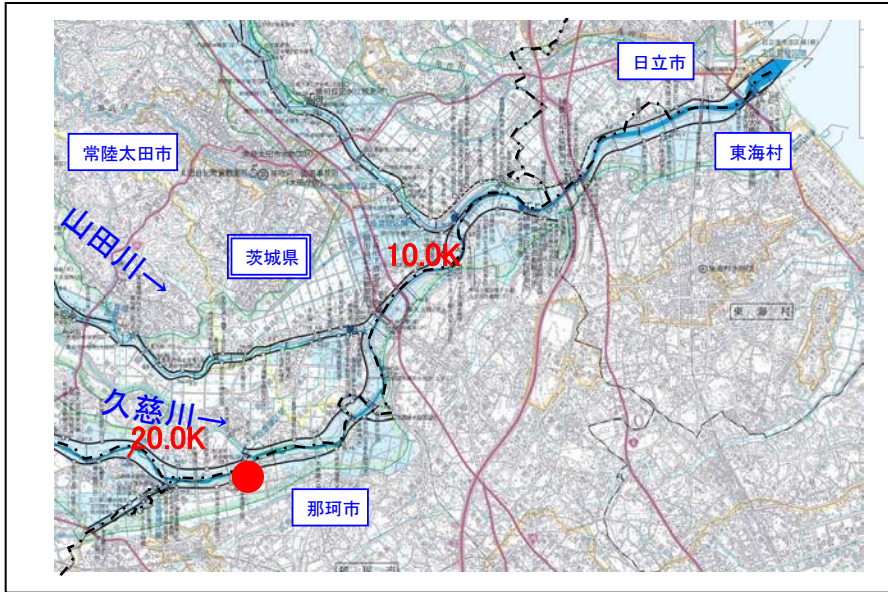

被災状況

- 被災内容: 堤防天端沈下・亀裂 L=1,241m
- 復旧工法: 盛換工法 約14,000m³
シート張 約9,600m²
- 着手日: 平成23年3月16日
- 工事期間: 9日間程度
- 現在の状況: 仮設坂路完了
舗装版撤去施工中




被災状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

24 地先名:茨城県常陸大宮市富岡地先
河川名:久慈川(左岸24.5k~25.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在

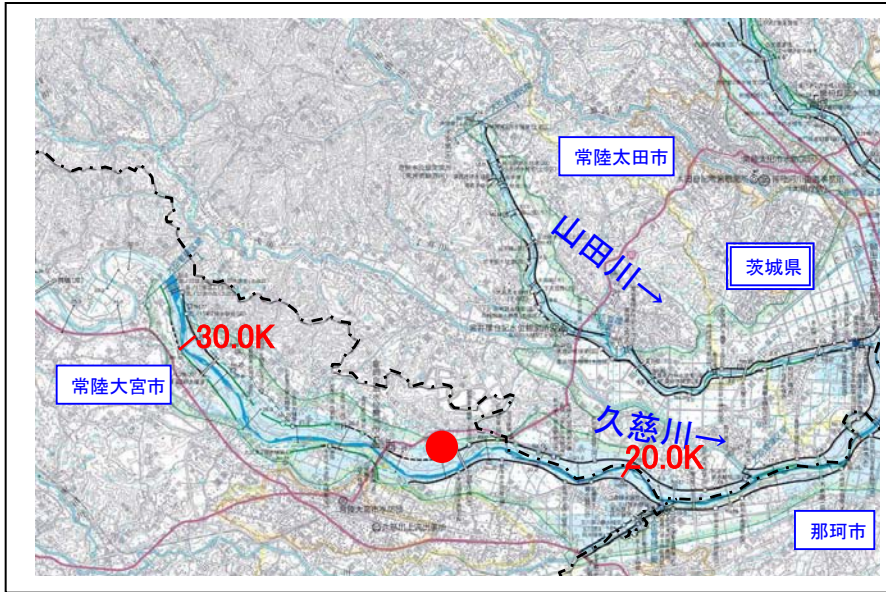

被災状況

- 被災内容: 堤防天端亀裂 L=955m
- 復旧工法: 盛換工法 約11,000m³
張芝 約3,600m²
- 着手日: 平成23年3月15日
- 工事期間: 9日間程度
- 現在の状況: クラック調査完了
表土剥ぎ施工中



被災状況


東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

25

地先名:茨城県那珂市本米崎地先

河川名:久慈川(右岸6.8k~7.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在

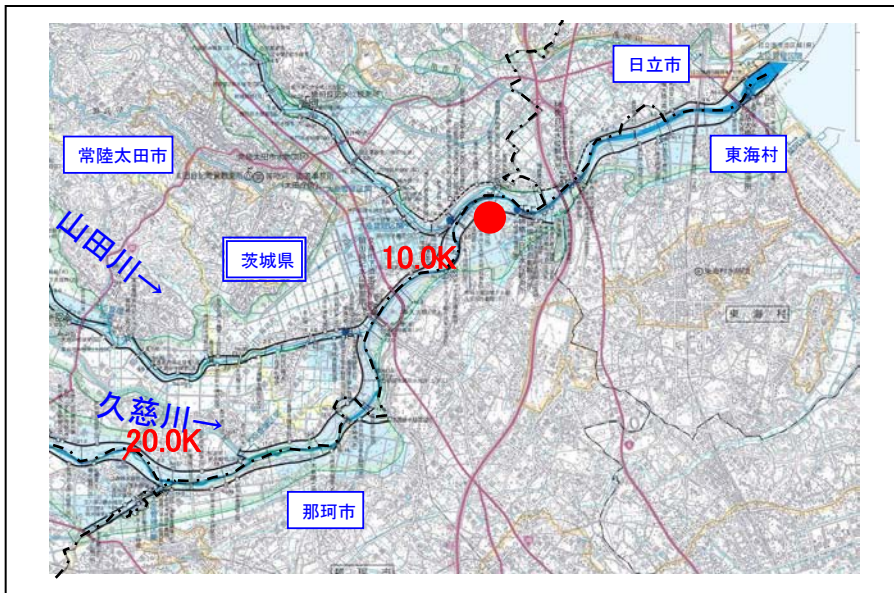

- ・被災内容: 堤防沈下 L=171m
- ・復旧工法: 盛換工法 約3,200m³
シート張 約4,900m²
- ・着手日: 平成23年3月16日
- ・工事期間: 7日間程度
- ・現在の状況: クラック調査完了
舗装版撤去施工中




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

40

地先名:茨城県常陸太田市栗原地先
河川名:久慈川(左岸15.0k~15.2k)

平成23年 3月19日 10:00現在

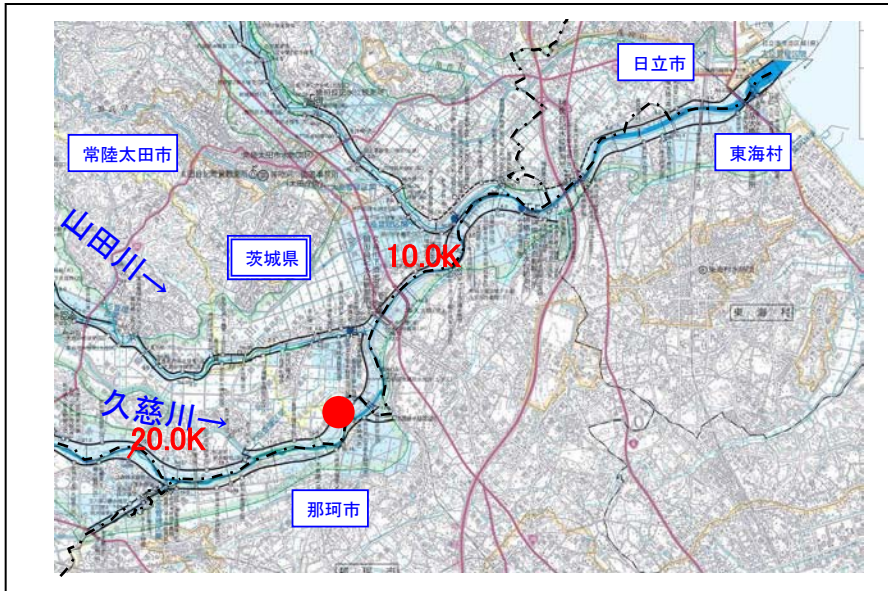

- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=115m
- ・復旧工法: 盛換工法 約1,500m³
シート張 約1,300m²
ブロックマット 約700m

被災調査完了


今後、速やかに工事着手予定。



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

平成23年 3月19日 10:00現在

41 地先名:茨城県常陸太田市小島地先
河川名:久慈川(左岸16.0k~16.9k)

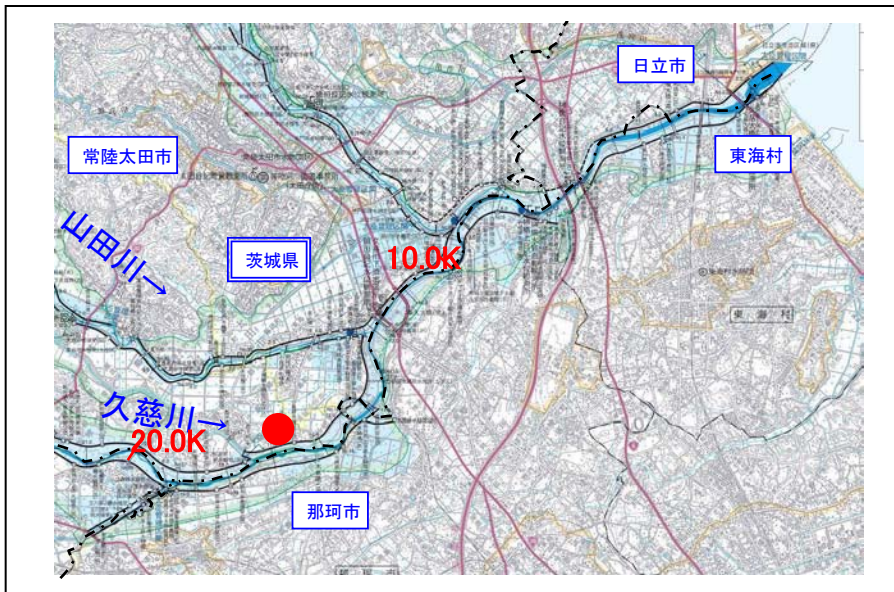

- 被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=400m
- 復旧工法: 盛換工法 約4,800m³
シート張 約2,400m²

被災調査完了

今後、速やかに工事着手予定。




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

42

地先名:茨城県常陸大宮市下岩瀬地先
河川名:久慈川(右岸19.8k~19.9k)

平成23年 3月19日 10:00現在

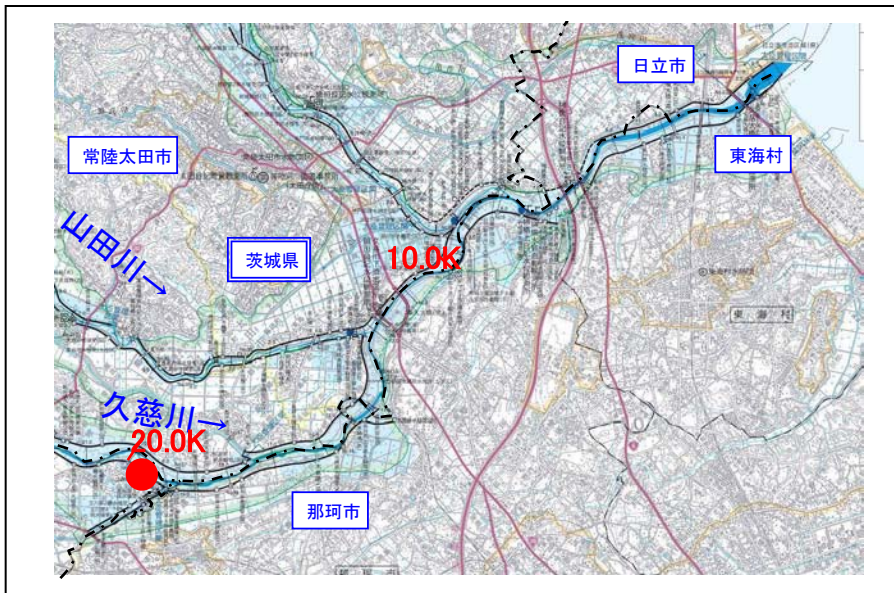

- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=150m
- ・復旧工法: 盛換工法 約1,400m³
シート張 約1,300m²

被災調査完了


今後、速やかに工事着手予定。



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

平成23年 3月19日 10:00現在

43 地先名:茨城県常陸太田市久米町地先
河川名:久慈川 山田川(左岸6.6k~6.9k)

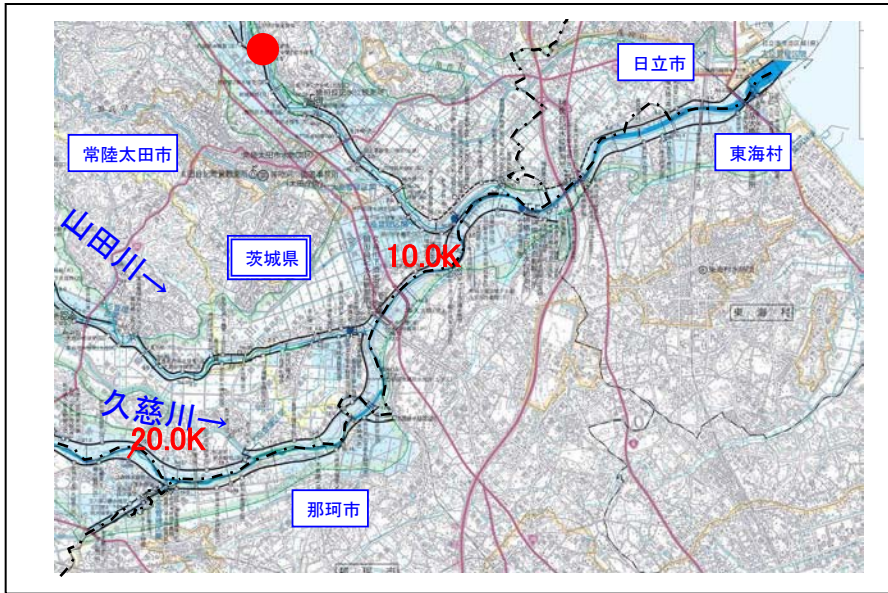

被災状況

- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=320m
- ・復旧工法: 盛換工法 約4,500m³
シート張 約4,500m²

被災調査完了

今後、速やかに工事着手予定。



被災状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

26

地先名：茨城県稲敷市本新地先

河川名：常陸利根川 西浦(右岸1.8k~6.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在



被災状況

・被災内容：堤防沈下・クラック L=4, 250m

・復旧工法：盛換工法 約19,000m³
シート張 約53,000m²

・着手日：平成23年3月16日

・工事期間：50日間程度

・現在の状況：起工測量完了



被災状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

27

地先名：茨城県稲敷市尾島地先

河川名：常陸利根川 西浦(右岸7.6k~8.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在



- 被災内容：堤防沈下（液状化）L=400m
- 復旧工法：盛換工法 約1,700m³
シート張 約3,400m²
- 着手日：平成23年3月16日
- 工事期間：20日間程度
- 現在の状況：起工測量完了




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)


28

地先名：茨城県稲敷郡美浦村余郷入地先
河川名：常陸利根川 西浦(右岸26.3k~26.5k)

平成23年 3月19日 10:00現在

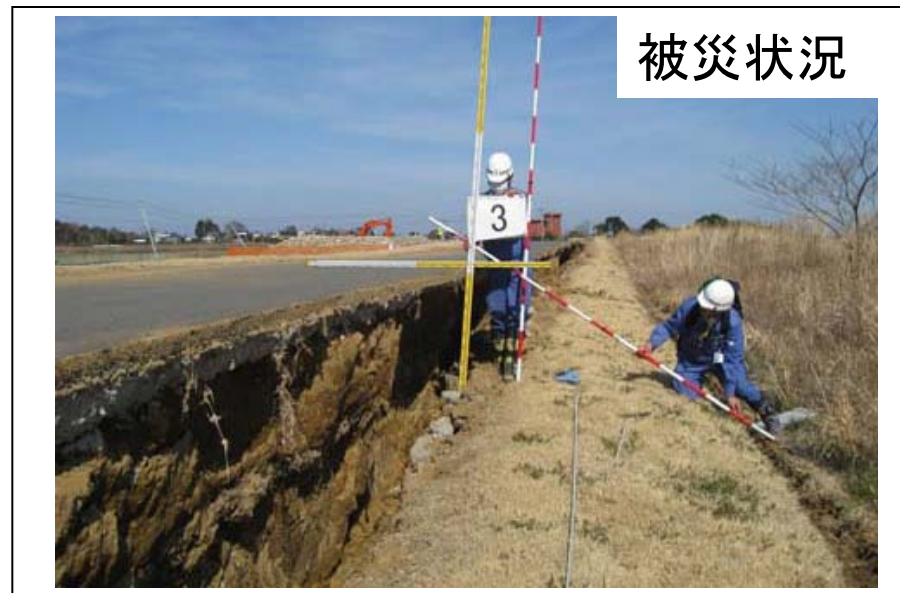

- ・被災内容：堤防沈下・亀裂 L=250m
- ・復旧工法：盛換工法 約2,400m³
シート張 約5,200m²
大型土嚢 約1,000袋
- ・着手日：平成23年3月16日
- ・工事期間：15日間程度
- ・現在の状況：起工測量完了

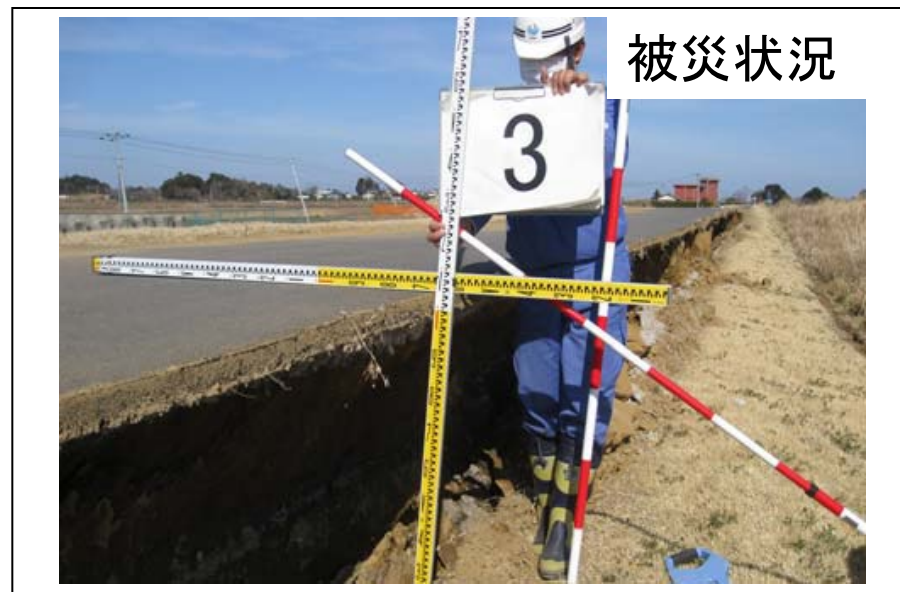


東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

29

地先名:茨城県石岡市井関地先

河川名:常陸利根川 西浦(中岸33.1k~34.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在

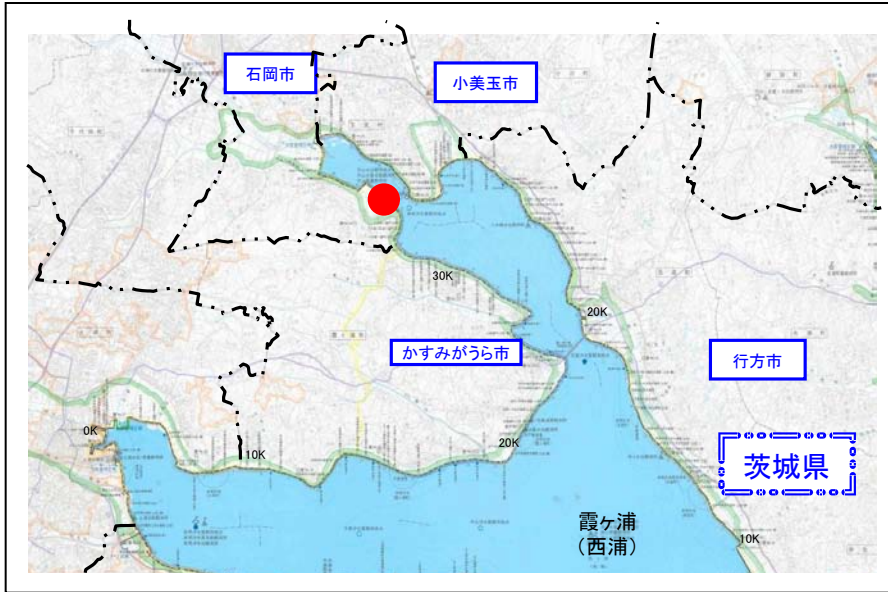

被災状況

・被災内容:堤防沈下・亀裂 L=900m

・復旧工法:盛換工法 約2,100m³
シート張 約6,300m²
大型土嚢 約2,500袋

・着手日:平成23年3月17日

・工事期間:30日間程度

・現在の状況:起工測量完了



被災状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

地先名：茨城県行方市小高地先

河川名：常陸利根川 西浦(左岸8.0k~10.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在

30



・被災内容：堤防沈下・クラック L=2,000m

・復旧工法：盛換工法 約6,500m³
シート張 約15,000m²
大型土嚢 約3,000袋

・着手日：平成23年3月16日

・工事期間：30日間程度

・現在の状況：起工測量完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

31

地先名:茨城県神栖市息栖地先

河川名:常陸利根川 常陸川(左岸10.8k~11.0k)

平成23年 3月19日 10:00現在



・被災内容:堤防沈下(樋管上下流)

・復旧工法:盛換工法 約50m³
シート張 約300m²

・着手日:平成23年3月15日

・工事期間:10日間程度

・現在の状況:起工測量完了




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

32

地先名:千葉県香取市一ノ分目地先

河川名:常陸利根川 外浪逆浦(右岸0.8k~1.2k)

平成23年 3月19日 10:00現在

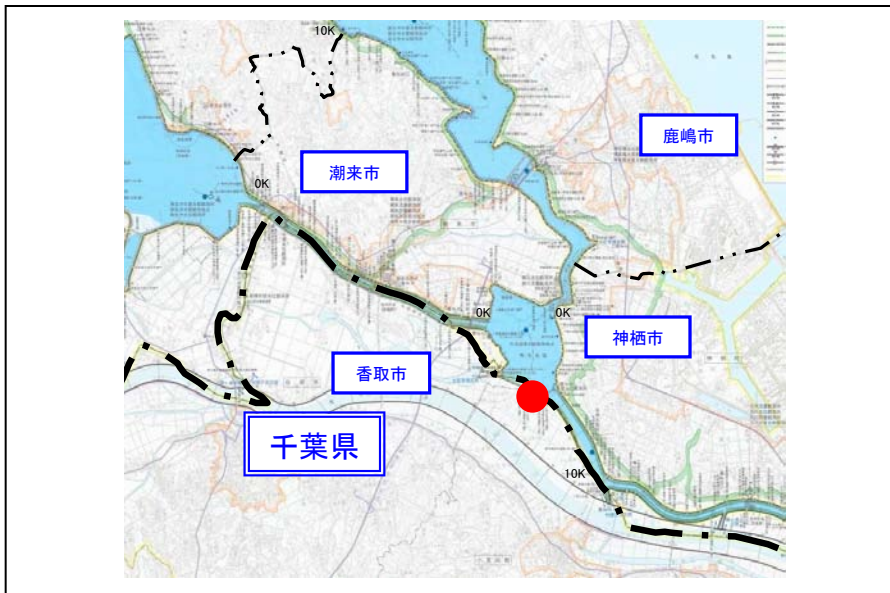

- ・被災内容: 護岸破損 L=400m
- ・復旧工法: 盛換工法 約5,000m³
シート張 約7,000m²
大型土嚢 約500袋
- ・着手日: 平成23年3月15日
- ・工事期間: 15日間程度
- ・現在の状況: 起工測量完了




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

地先名:茨城県神栖市日川地先

平成23年 3月19日 10:00現在

河川名:常陸利根川 常陸川(右岸2.5k~5.0k)

33

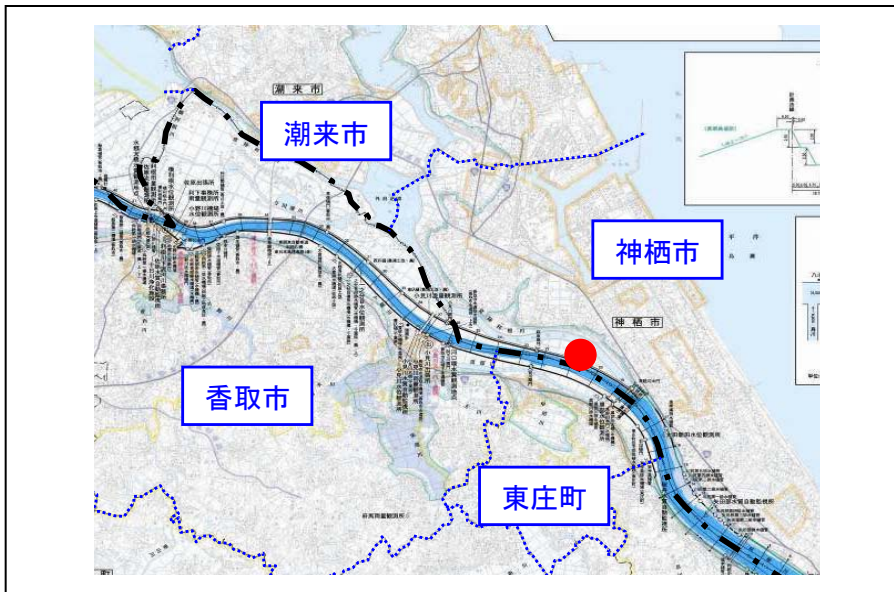

- 被災内容: 堤防陥没 L=2, 500m
- 復旧工法: 盛換工法 約3, 300m³
シート張 約10, 200m²
大型土嚢 約120袋
- 着手日: 平成23年3月16日
- 工事期間: 30日間程度
- 現在の状況: 起工測量完了




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

34

地先名:千葉県香取市八筋川地先

河川名:常陸利根川 横利根川(左岸4.5k~4.6k)

平成23年 3月19日 10:00現在

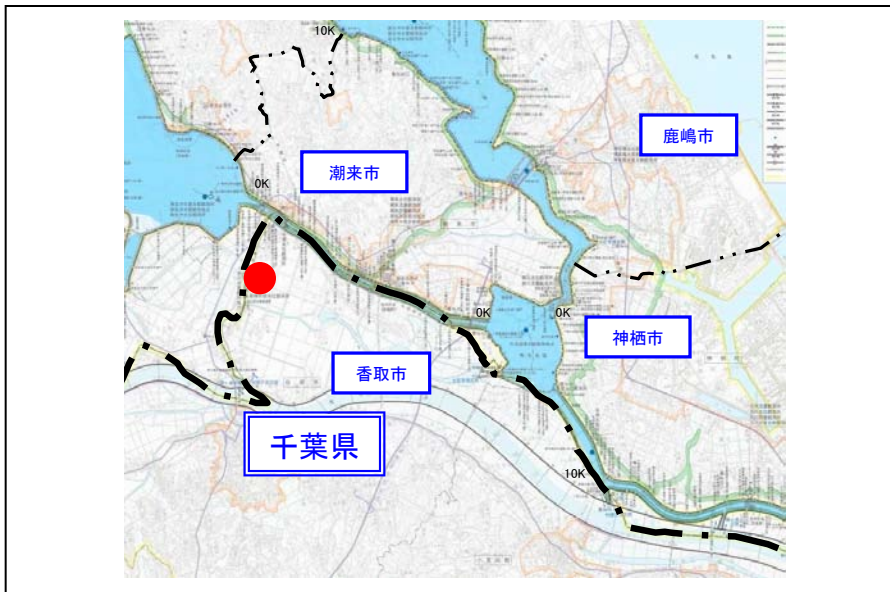

・被災内容:堤防沈下・陥没 L=100m

・復旧工法:盛換工法 約1,200m³
シート張 約700m²
大型土嚢 約1,300袋

・着手日:平成23年3月16日

・工事期間:20日間程度

・現在の状況:起工測量完了




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

35

地先名：茨城県神栖市横瀬地先

河川名：常陸利根川 常陸川(左岸1.0k~1.5k)

平成23年 3月19日 10:00現在

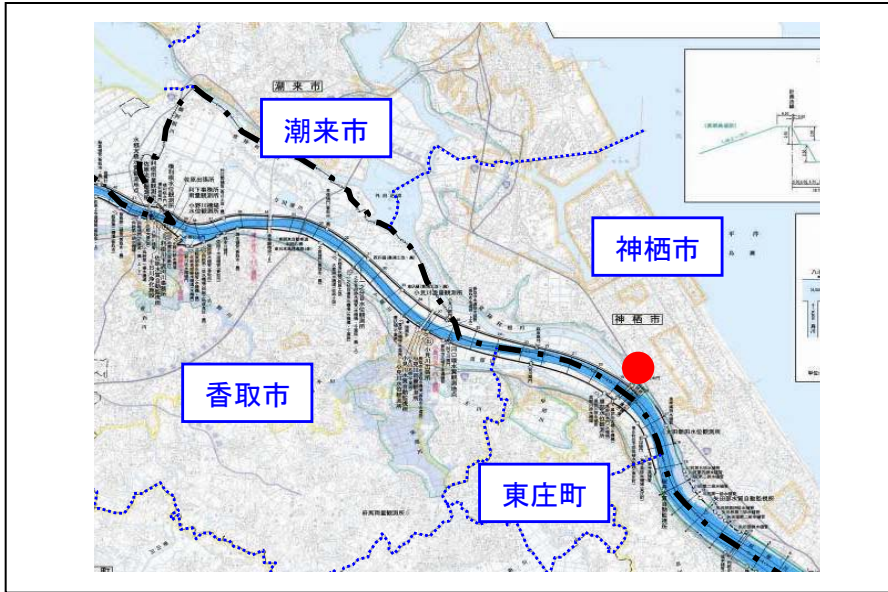

被災状況

・被災内容：堤防陥没・クラック L=500m

・復旧工法：盛換工法 約3,300m³
シート張 約4,300m²
大型土嚢 約230袋

・着手日：平成23年3月16日

・工事期間：25日間程度

・現在の状況：起工測量完了



被災状況


東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

36

地先名：茨城県神栖市高浜地先

河川名：常陸利根川 常陸川(左岸8.0k~8.1k)

平成23年 3月19日 10:00現在

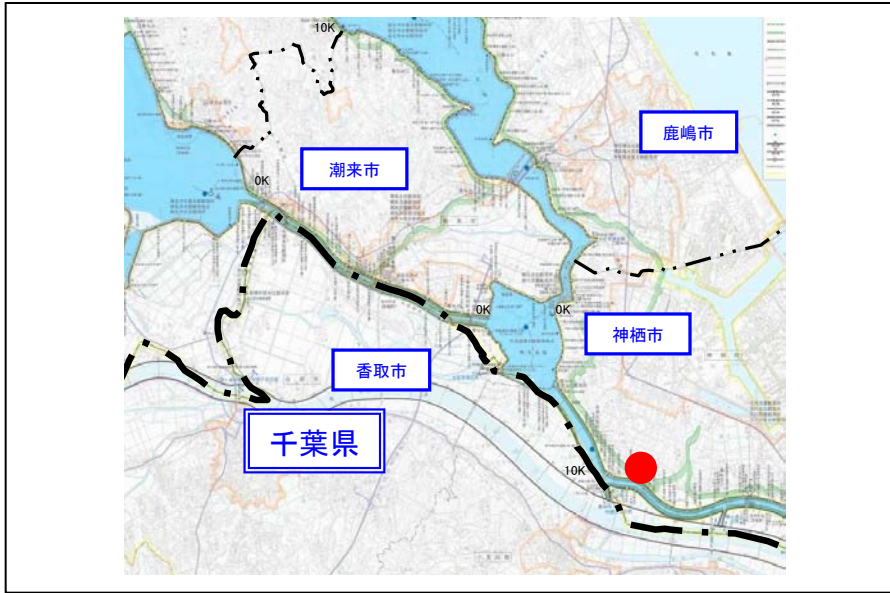


・被災内容：堤防川表法面亀裂 L=100m

・復旧工法：盛換工法 約200m³
張芝 約400m²

・着手日：平成23年3月15日

・工事期間：15日間程度

・現在の状況：起工測量完了

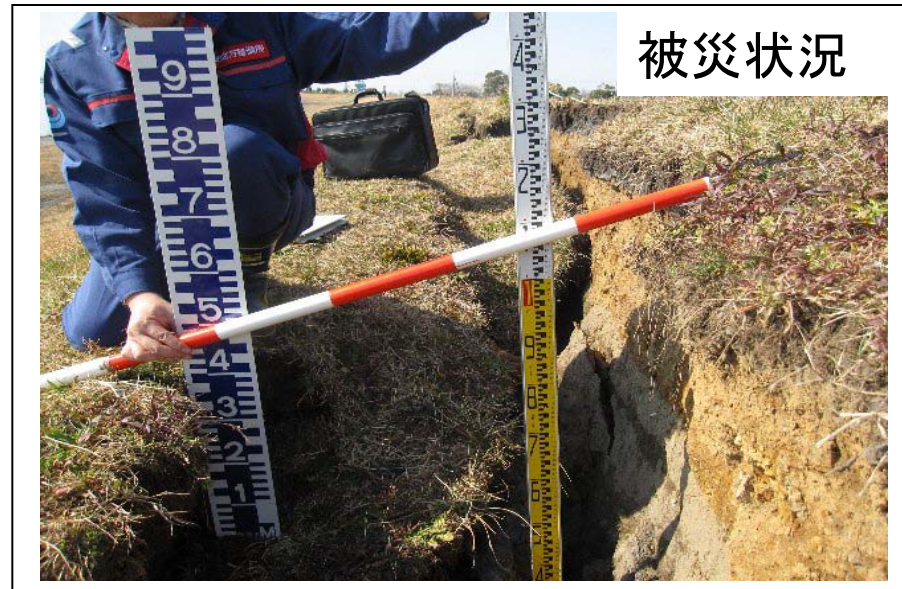


東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

地先名:千葉県香取市筭島地先

平成23年 3月19日 10:00現在

河川名:常陸利根川 横利根川(左岸2.7k~2.8k)

被災状況

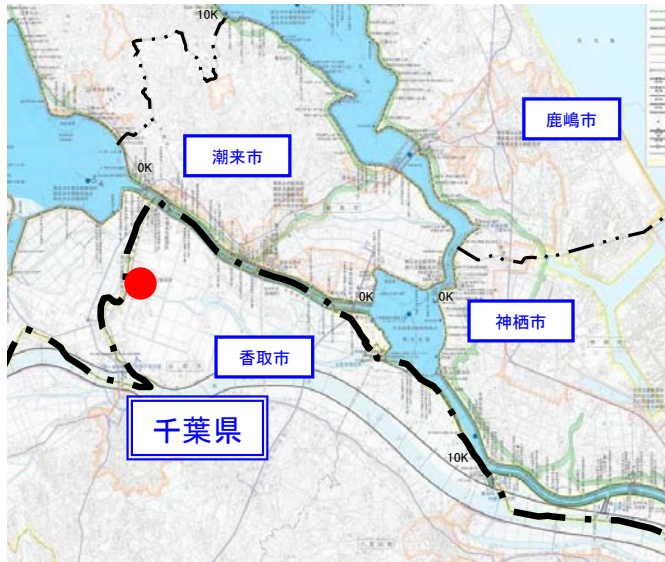

被災状況

- ・被災内容: 護岸沈下 L=100m
- ・復旧工法: 盛換工法 約300m³
シート張 約800m²
大型土嚢 約80袋
- ・着手日: 平成23年3月16日
- ・工事期間: 15日間程度
- ・現在の状況: 起工測量完了

