



## ②歩道整備の進捗状況と今後のスケジュール

用地取得協議状況（約9割取得済）及び工事状況は下記のとおりです。


- 第1工区は、歩道整備工事を行います。一部、用地取得協議中です。
- 第2工区は、引き続き用地取得協議をいたします。
- 第3工区は、歩道整備工事を行います。
- 第4工区は、引き続き用地取得協議をいたします。

### 今後のスケジュール

	H24.2月	3月	4月	5月	6月	H24.7月～
第1工区	用地取得協議		歩道整備工事			
第2工区	用地取得協議					
第3工区			歩道整備工事			
第4工区	電線共同溝工事					
	用地取得協議					


### お知らせ

一般国道4号小山市羽川歩道整備は、全体工区を1～4工区に分け、順次進めております。

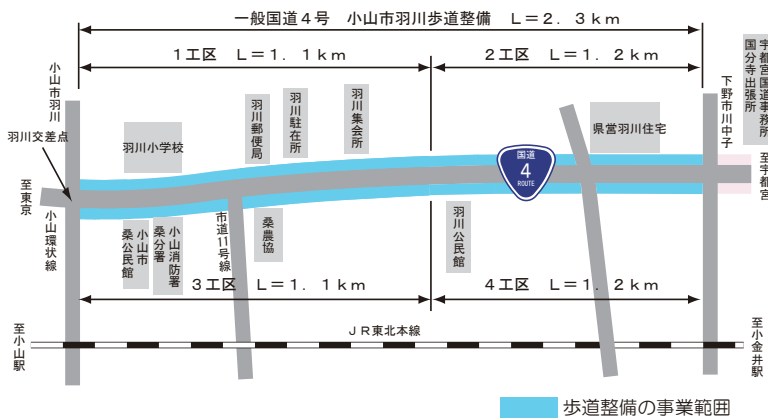

羽川歩道整備とは


1. 歩道を3.75mに広げ、自転車通行帯を設置します。
2. 電線類を地中化し、電柱を無くします。
3. ボイ捨て禁止マークを路面表示します。
4. 公共下水道を整備します。

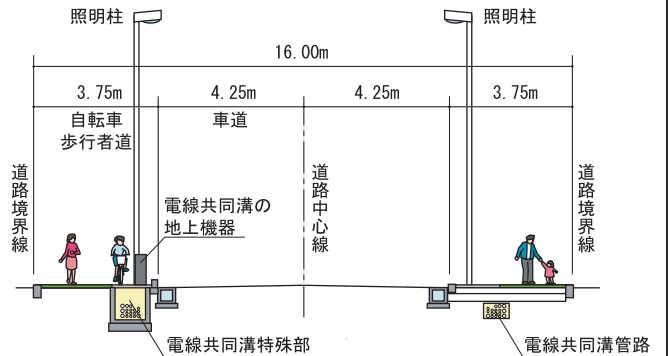

### 整備前と整備後を比較すると・・・

整備前

歩道部が狭く歩きにくい状況で、交通事故の危険性もあります




1工区付近



整備後

歩行者や自転車がゆとりを持って分離・通行でき、車いす利用者や高齢者にも優しいバリアフリーの歩道を整備します



1工区付近

