

芹沢地区砂防事業説明資料

令和2年9月

関東地方整備局 日光砂防事務所

芹沢地区砂防堰堤群・芹沢床固群整備事業の進捗状況


令和2年9月 現在

用地取得	約99% ※国有林を除く	
砂防堰堤	約86% (完成)	約100% (完成＋整備中)
護 岸	約73% (完成)	約96% (完成＋整備中)



※今後の出水等で数値が変更になることがあります。

- ◆ 事業全体(調査・設計・用地取得・工事)での進捗は約8割完成、整備中を含めると約9割。
- ◆ 国有林は使用承認によりすべての計画範囲で工事施工が可能。
- ◆ 完成目標年度 令和2年度

芹沢地区工事位置図

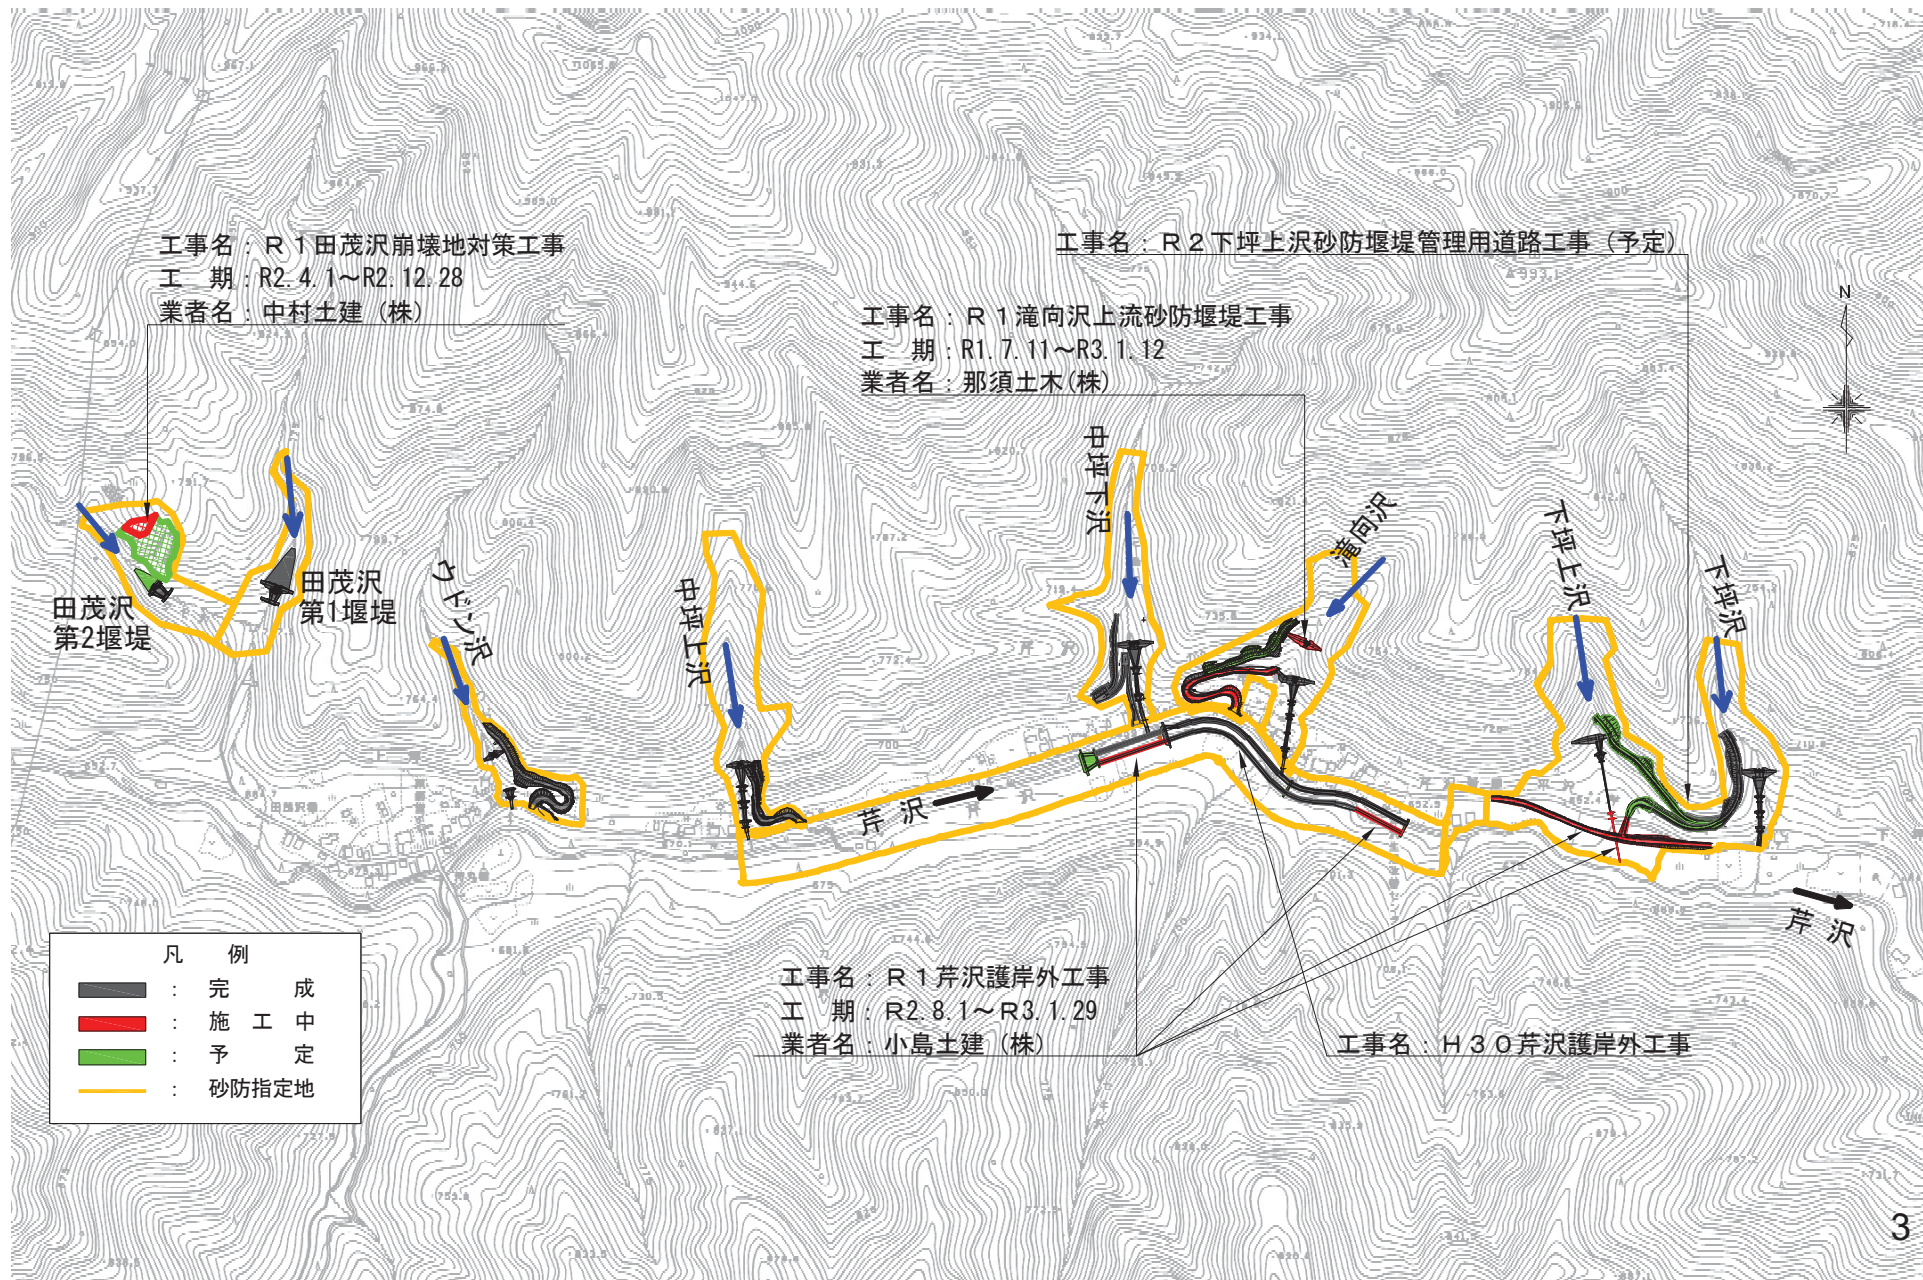

砂防施設の効果(床固工)

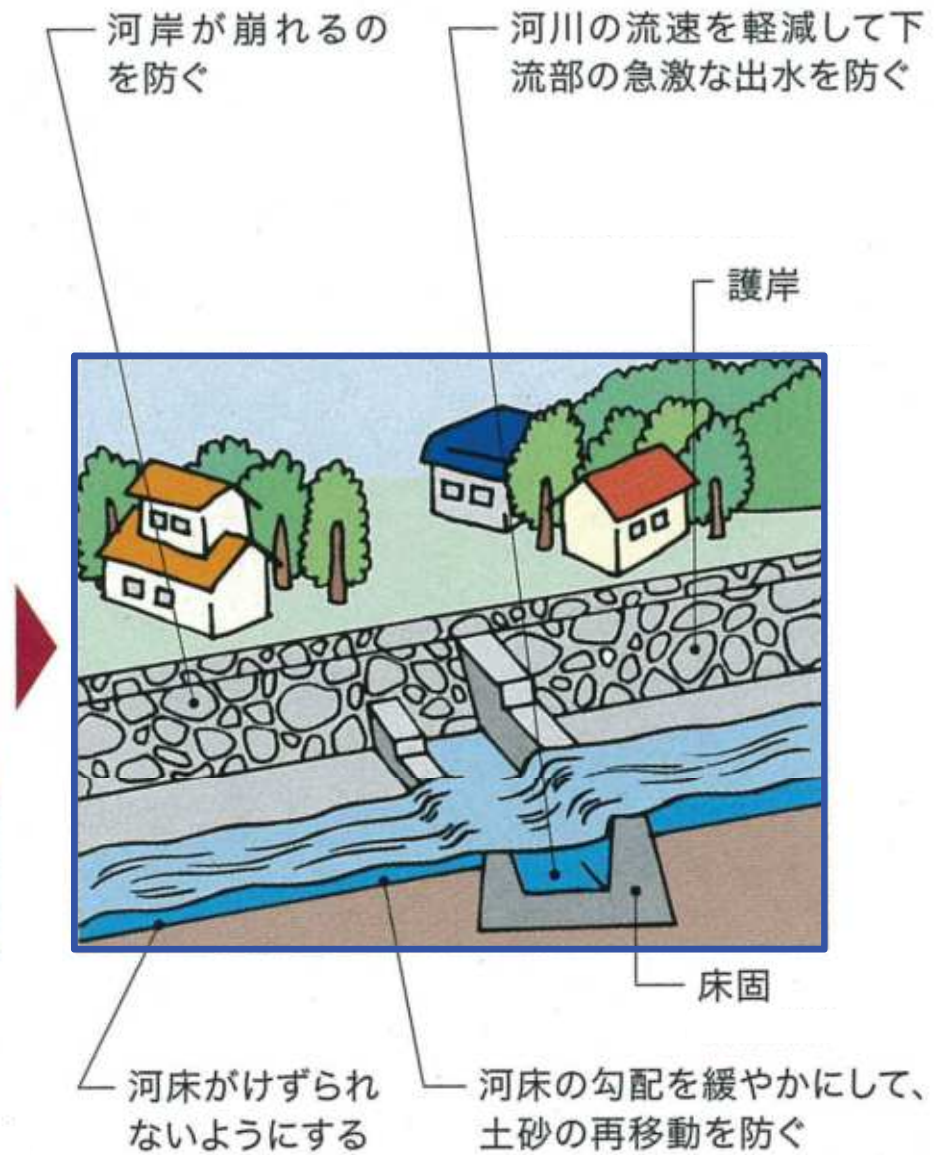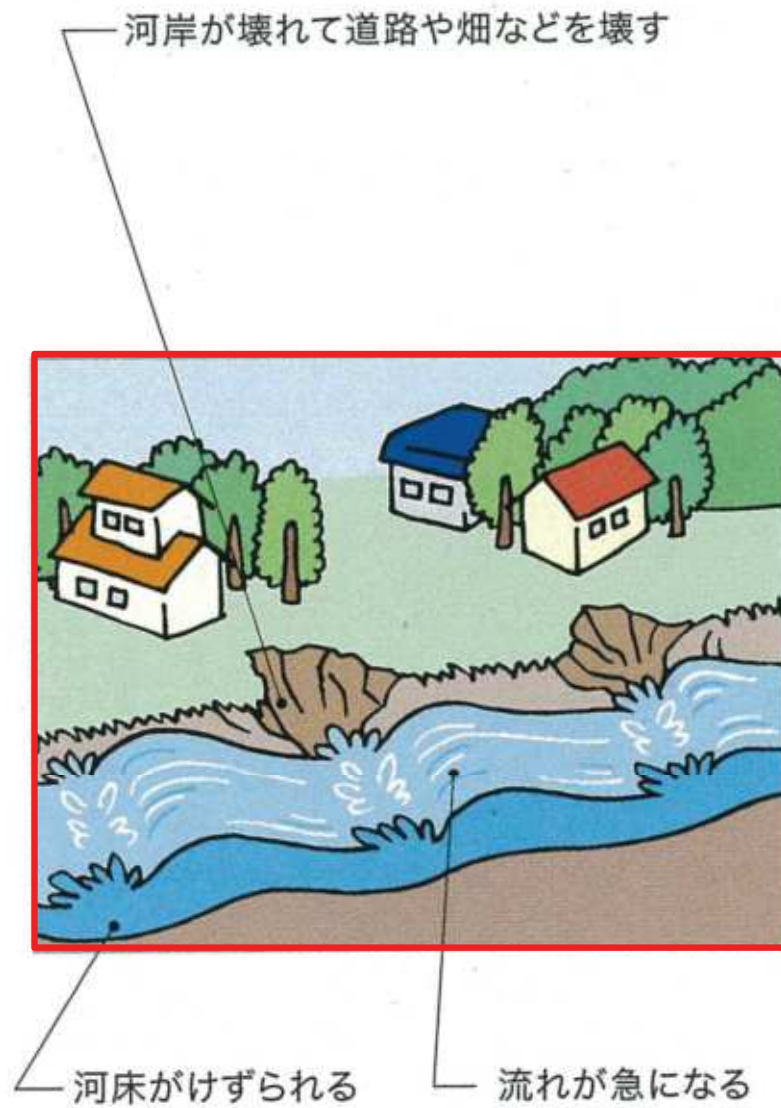

芹沢地区工事一覧

No.	工 事 名	受 注 者	工 期	備 考
1	H30芹沢護岸外工事	小島土建(株)	令和元年7月19日 } 令和2年7月31日	建設監督官担当
2	R1滝向沢上流砂防堰堤工事	那須土木(株)	令和元年7月11日 } 令和3年1月12日	建設監督官担当
3	R1田茂沢崩壊地対策工事	中村土建(株)	令和2年4月1日 } 令和2年12月28日	建設監督官担当
4	R1芹沢護岸外工事	小島土建(株)	令和2年8月1日 } 令和3年1月29日	建設監督官担当
5	R2下坪上沢砂防堰堤管理用道路工事	—	—	藤原出張所担当



: 完成




: 施工中



: 予定

(1) H30芹沢護岸外工事

(芹沢護岸)

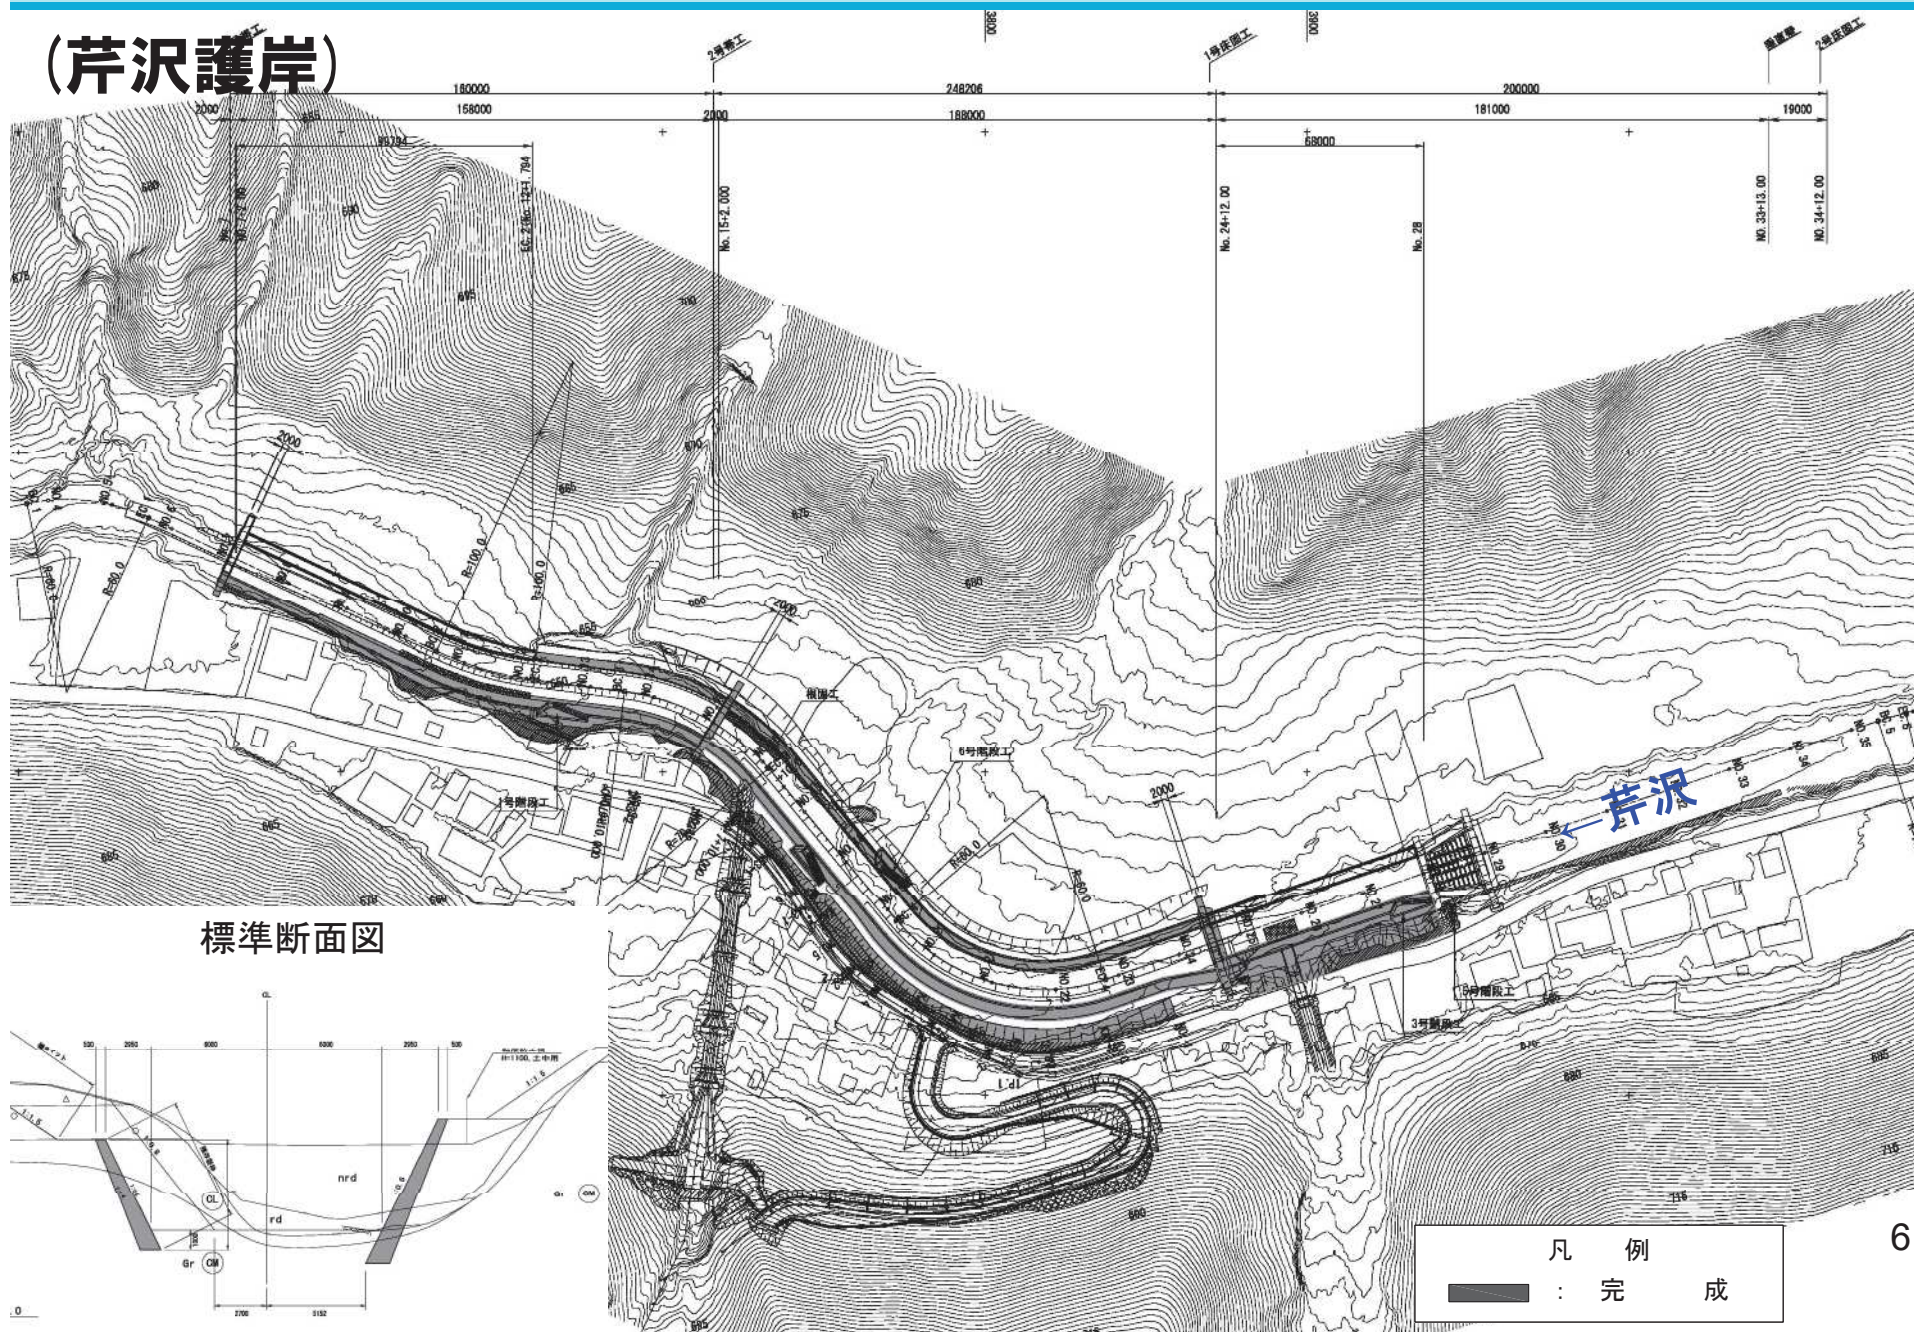

(1) H30芹沢護岸外工事

(芹沢護岸)



支川処理流末予定箇所

右岸階段


滝向沢出口付近より上流方向



滝向沢管理用道路出入口付近より上流方向

(1) H30芹沢護岸外工事

(男鹿川土砂置場)

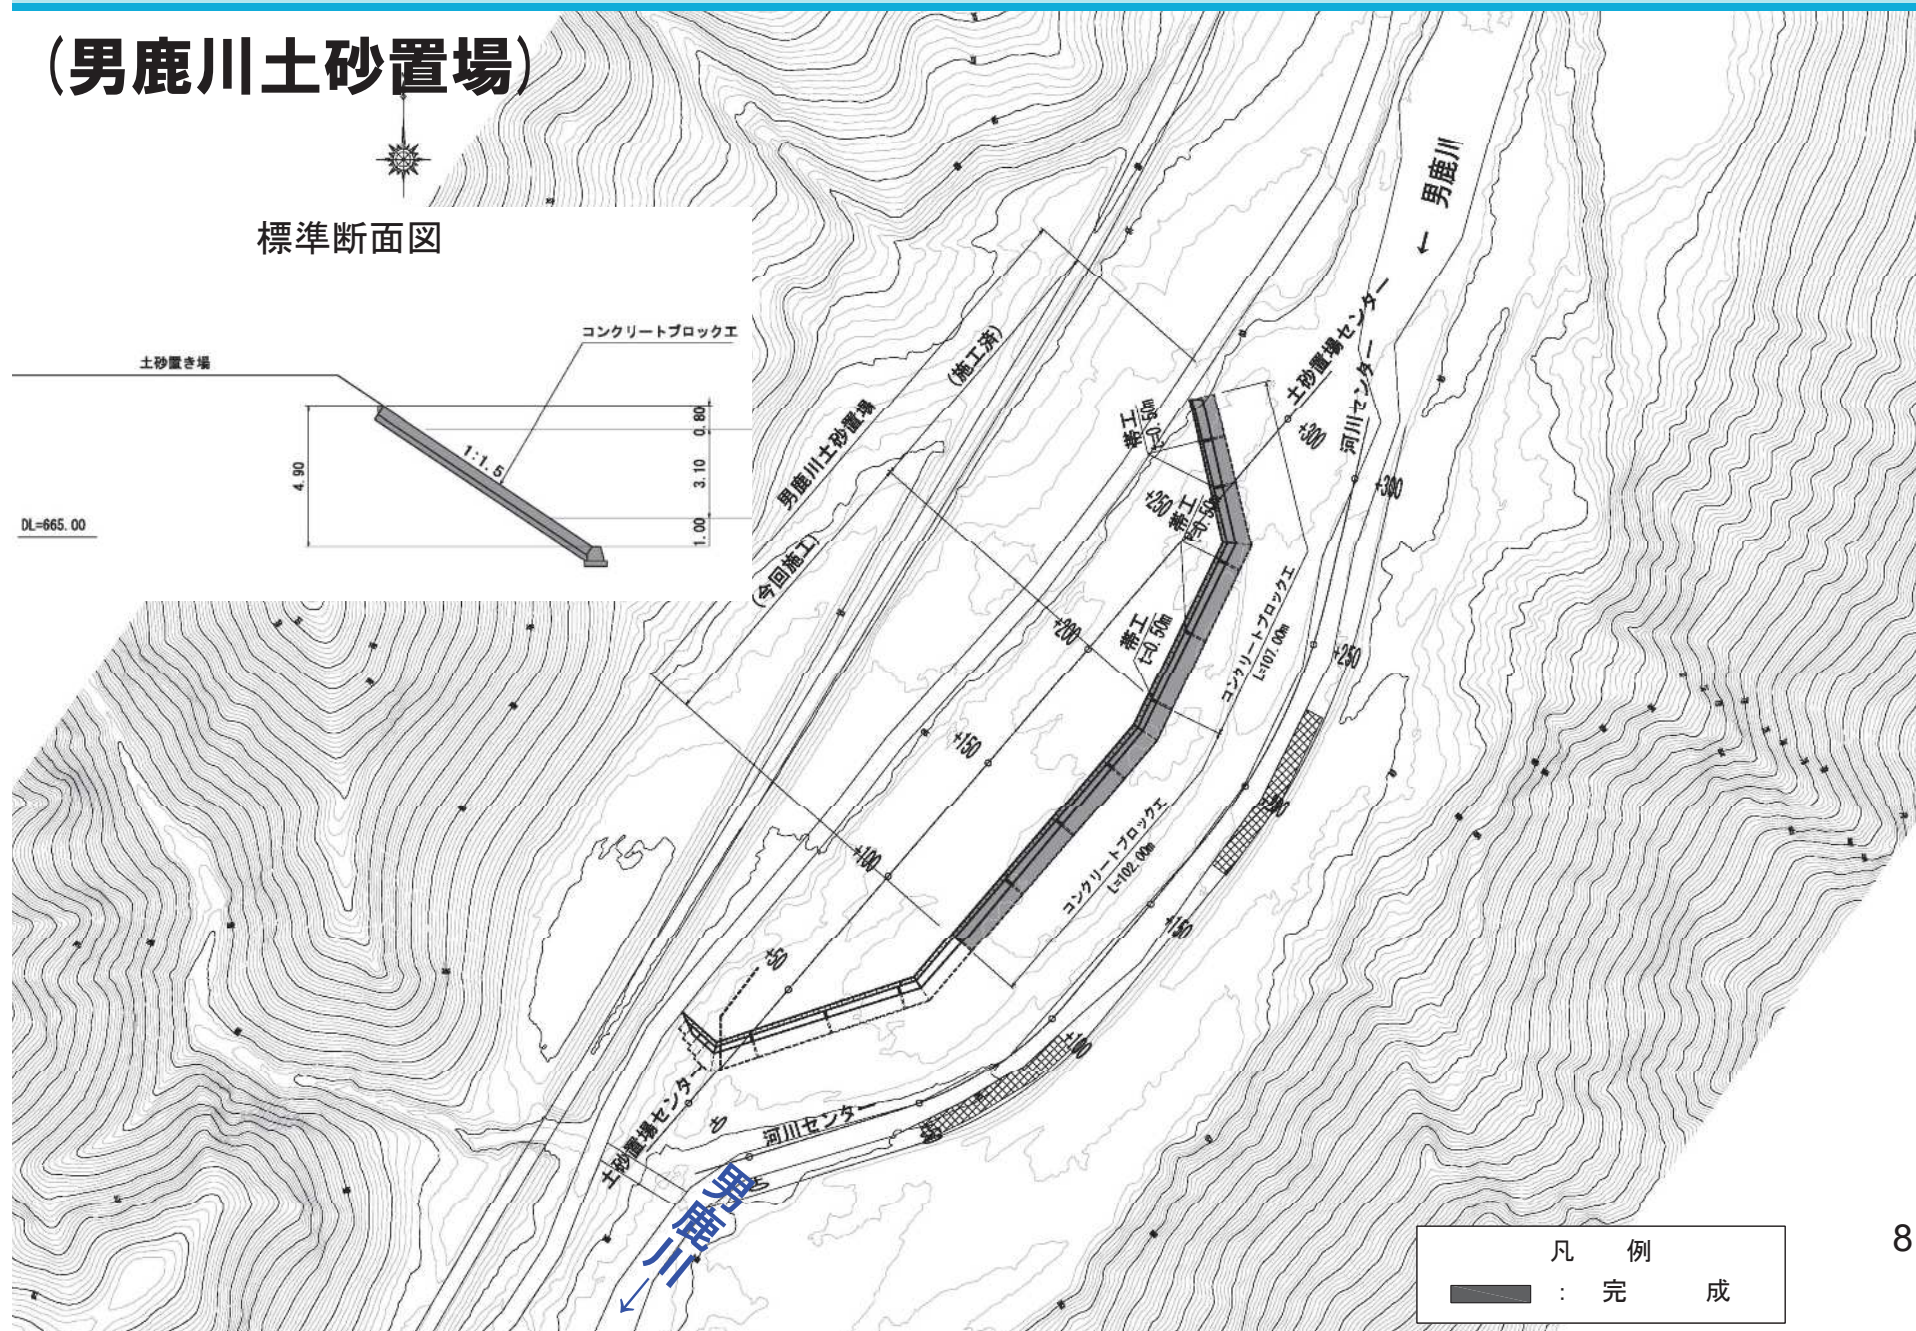

(1) H30芹沢護岸外工事

(男鹿川土砂置場)




芹沢地区からの搬出土



コンクリートブロック工

(2) R1滝向沢上流砂防堰堤工事

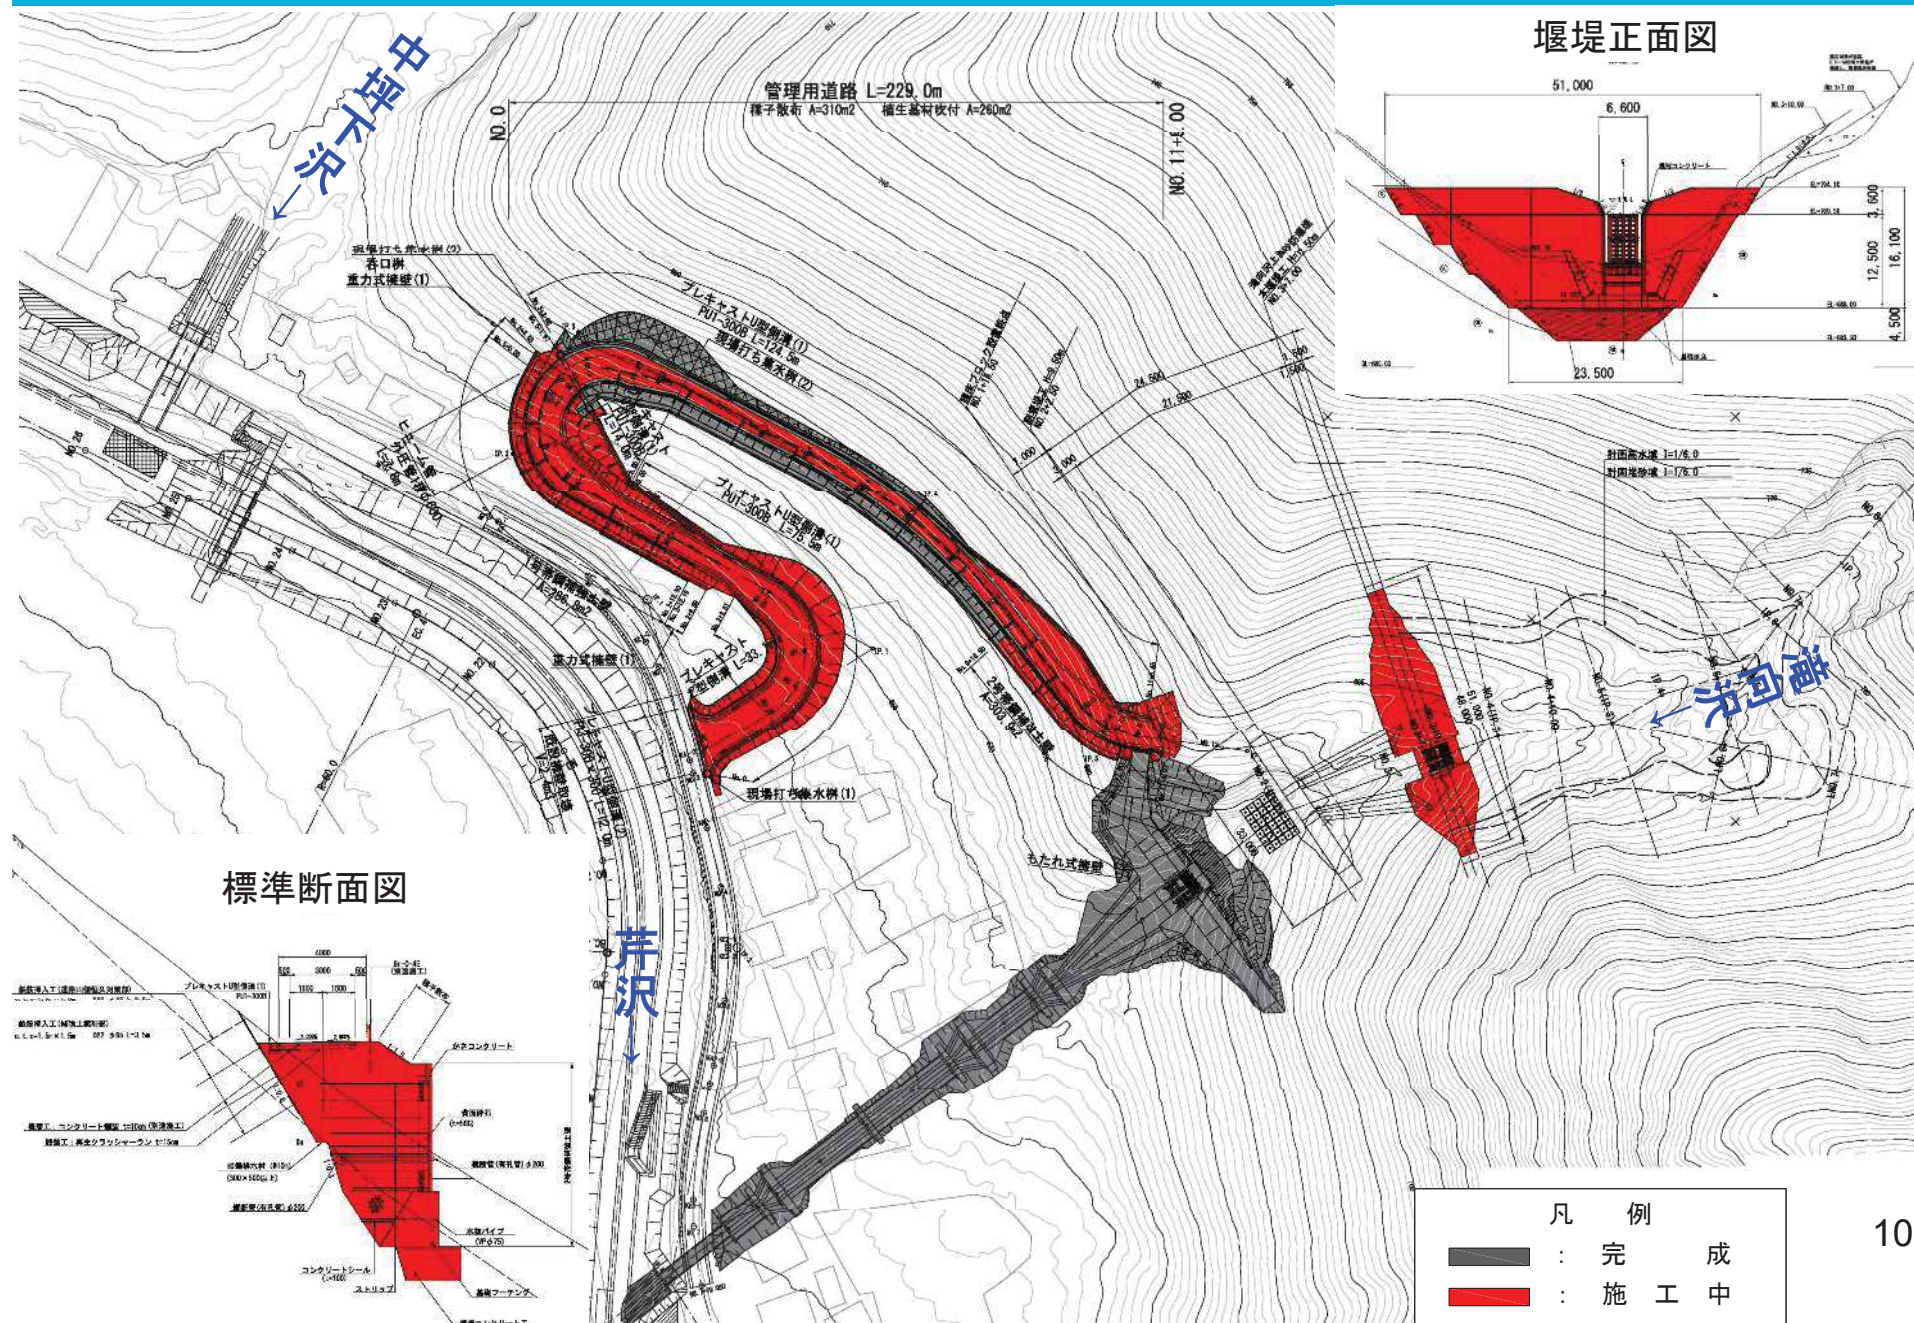

(2) R1滝向沢上流砂防堰堤工事




施工状況(管理用道路)



施工状況(管理用道路)

(3) R1 田茂沢崩壊地対策工事

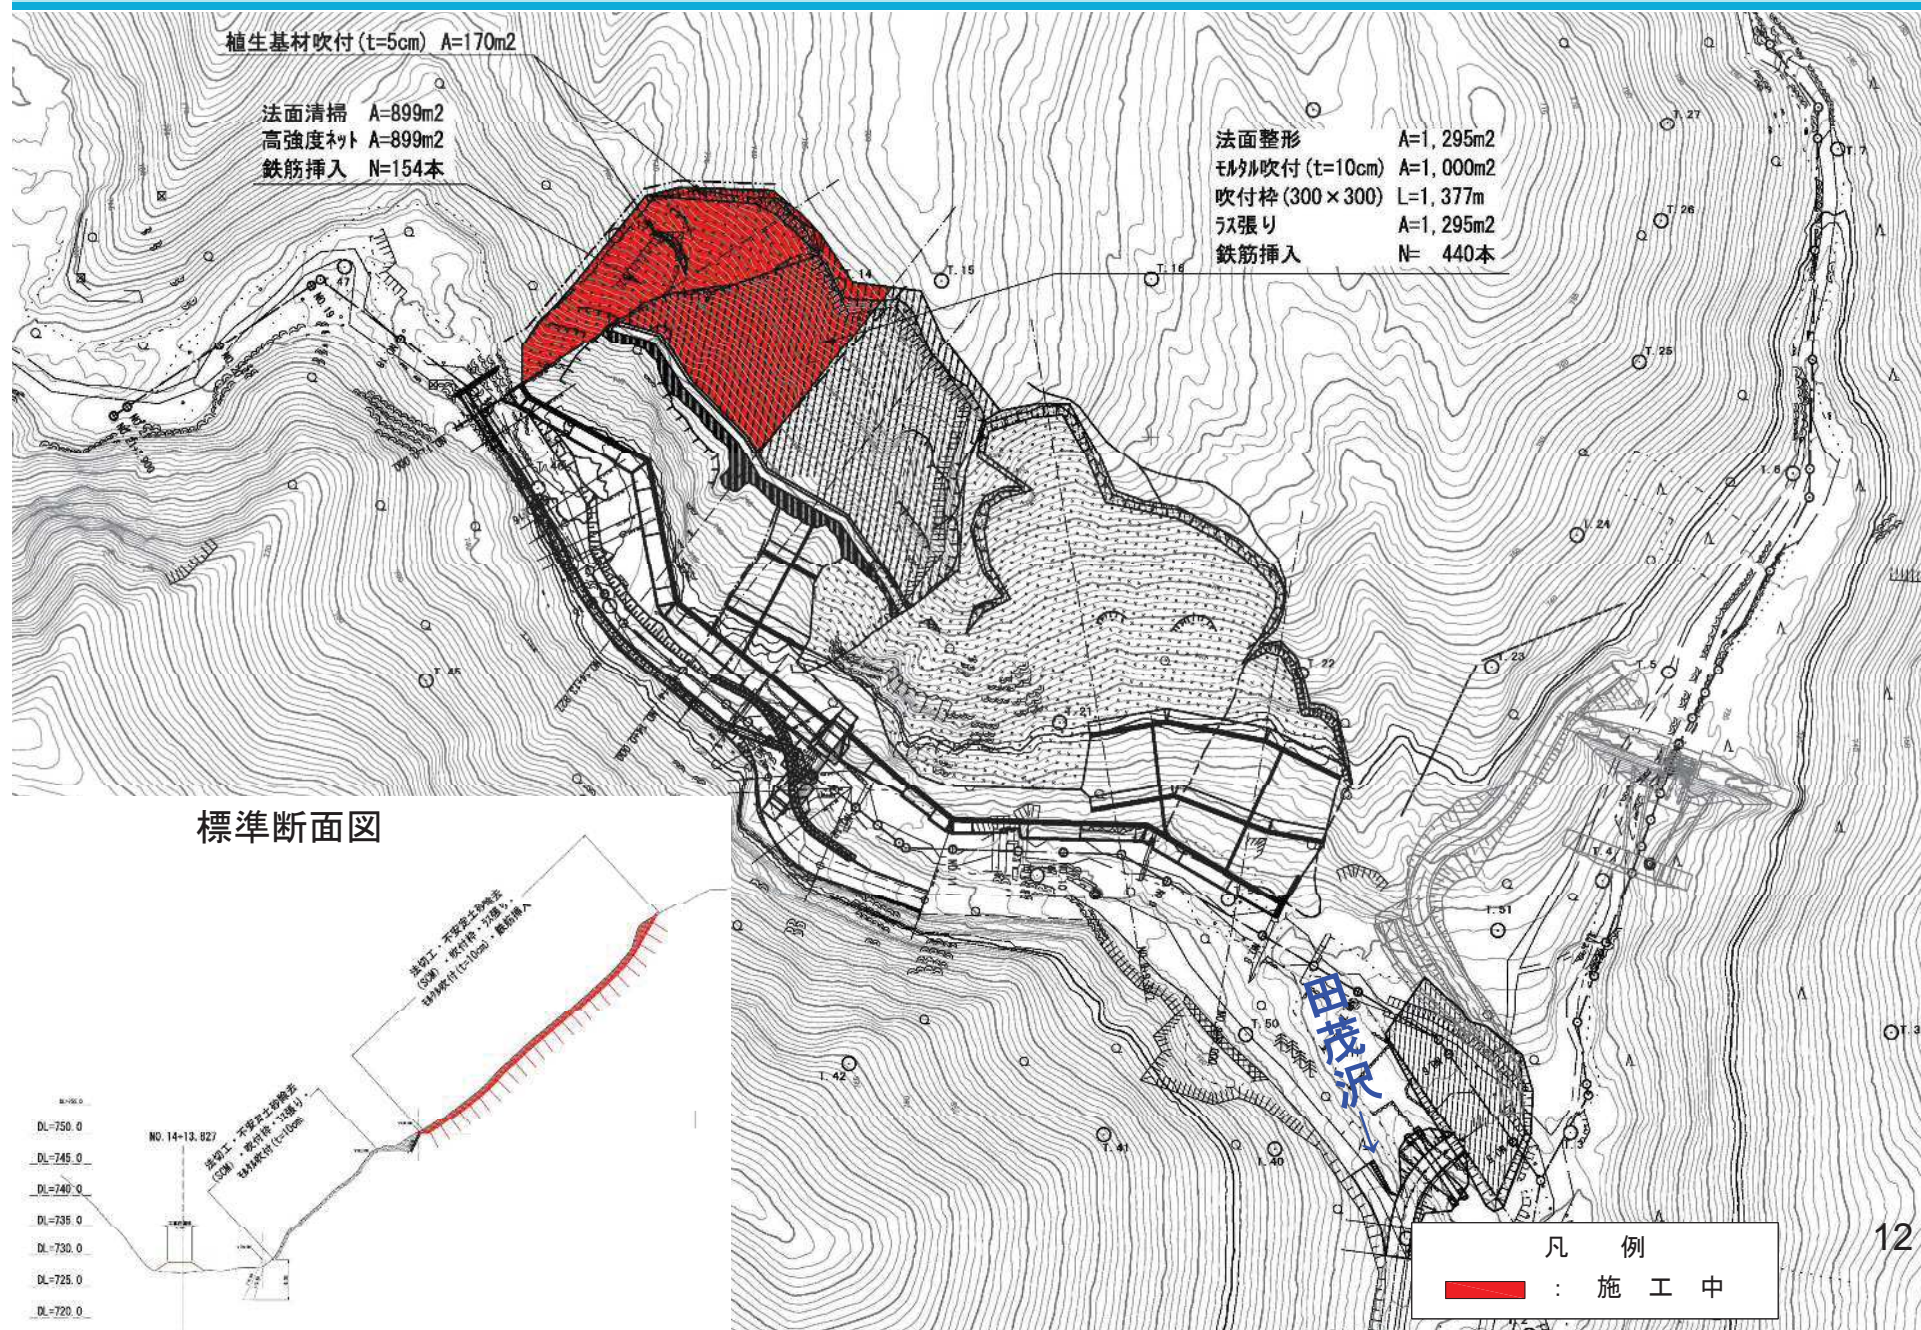

(3) R1 田茂沢崩壊地対策工事



田茂沢崩壊地

崩壊地(全景)




法枠工 ラス張設置状況

施工状況

(4) R1 芹沢護岸外工事



(芹沢護岸)

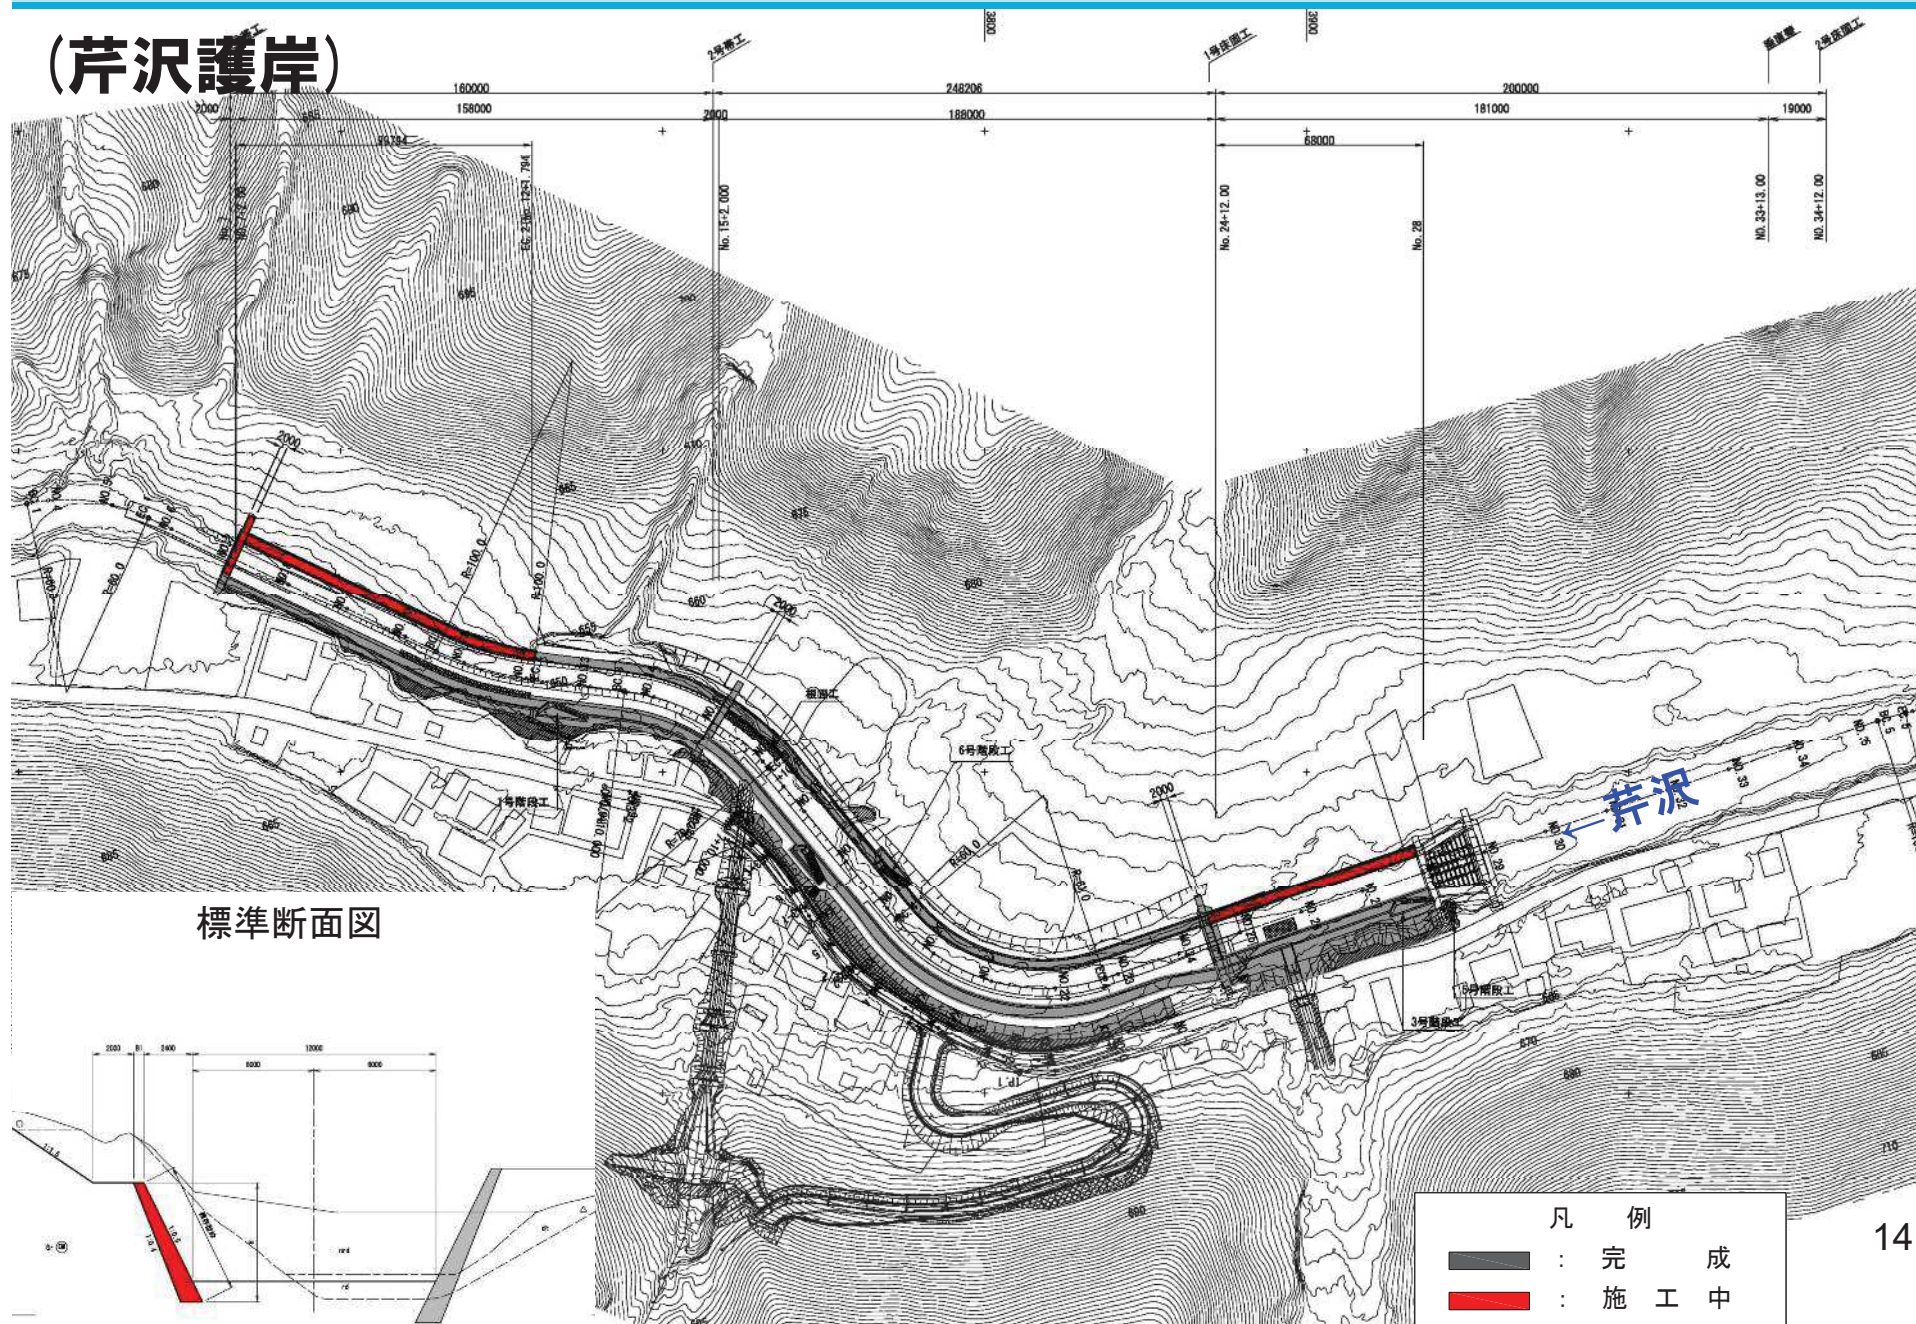

(4) R1 芹沢護岸外工事

(男鹿川土砂置場)


標準断面図

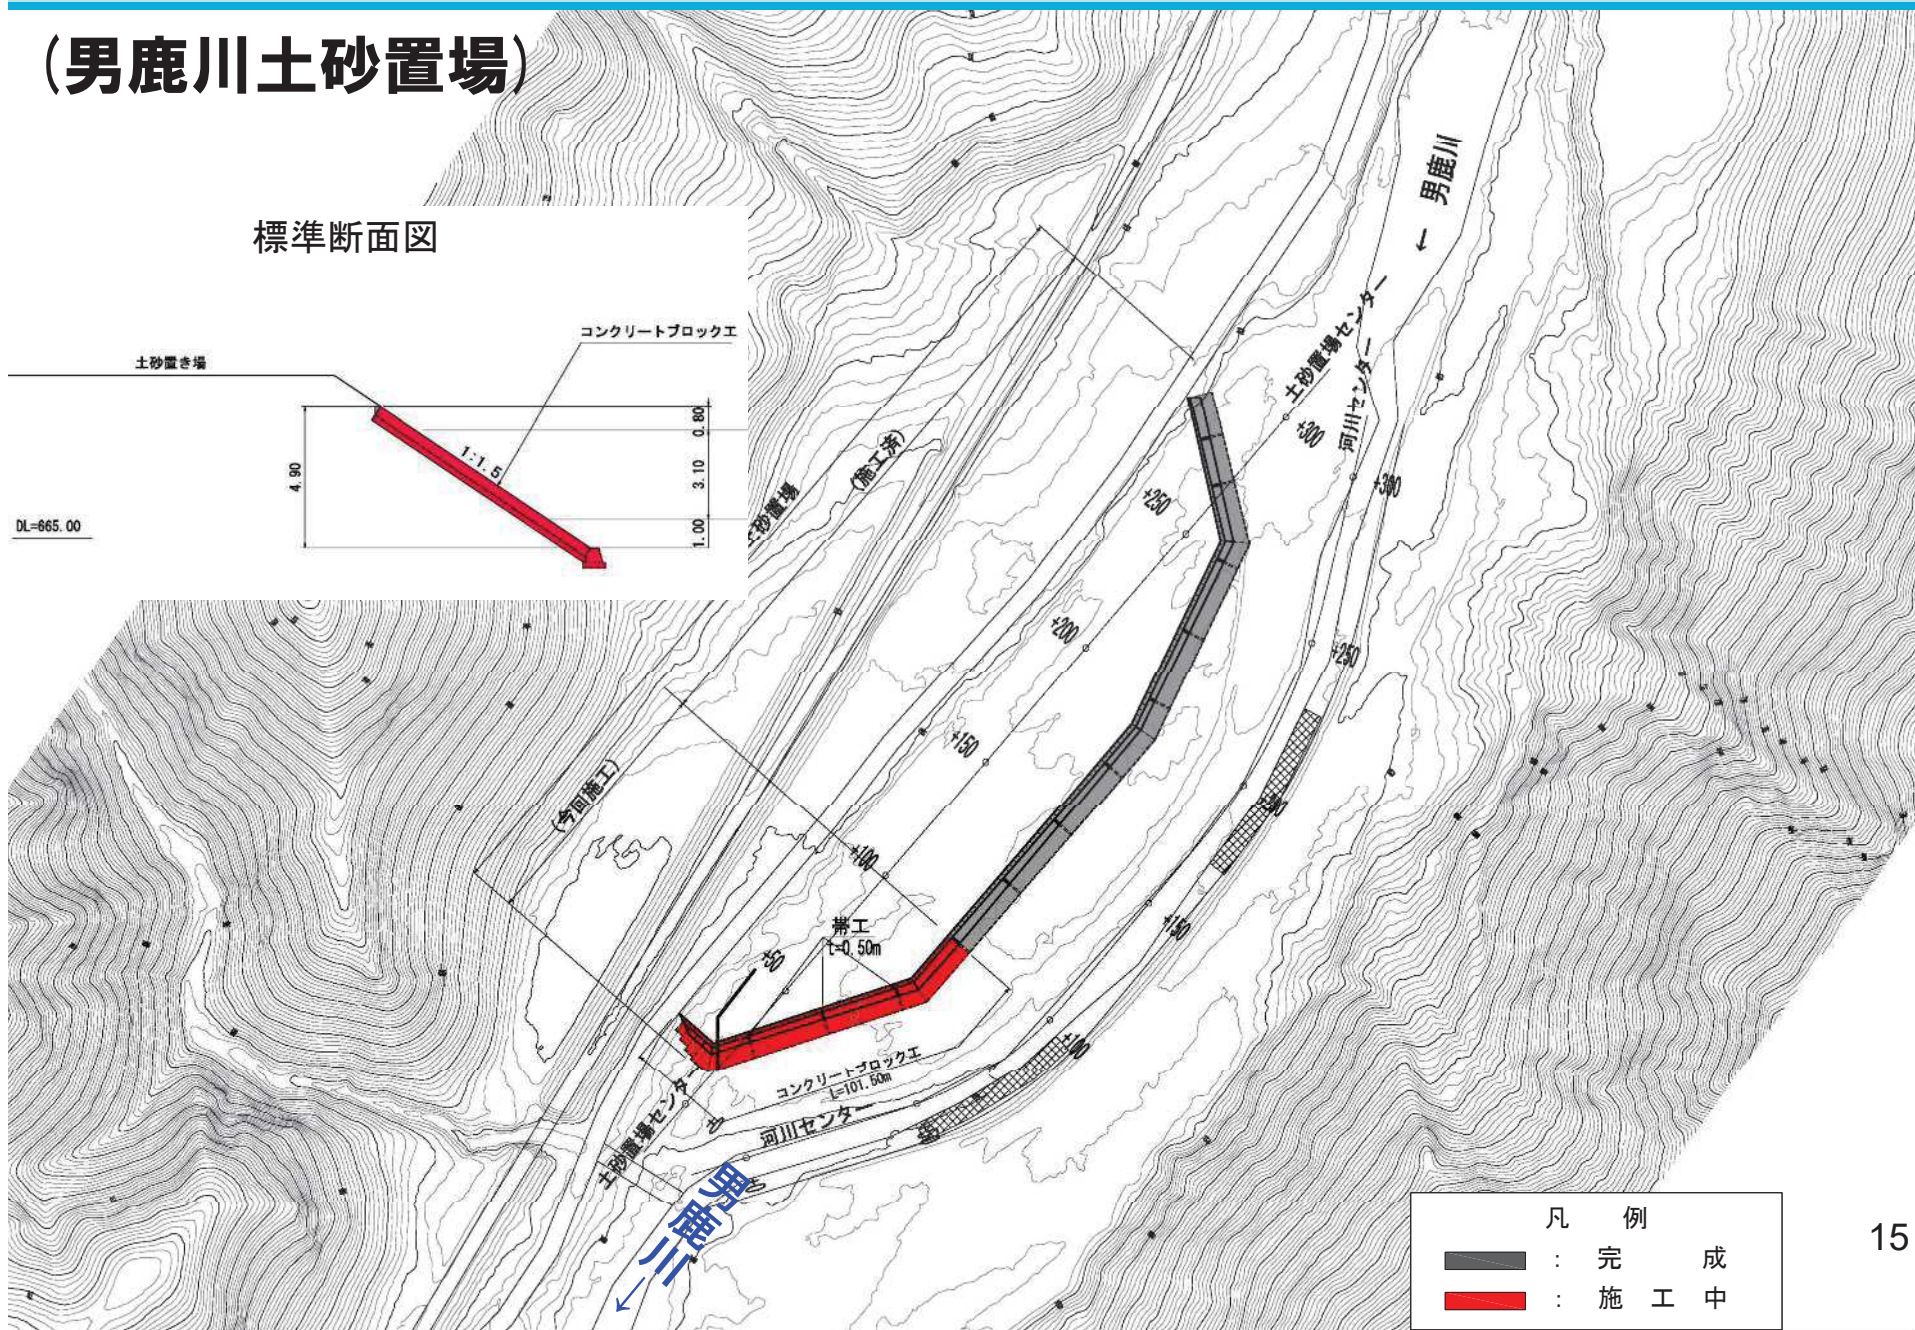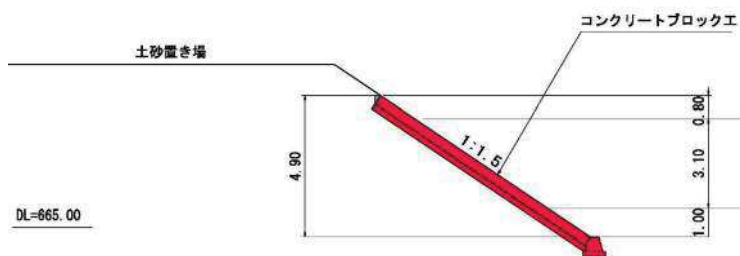


凡 例	
—	： 完 成
—	： 施 工 中

(4) R1 芹沢護岸外工事

(市道付替)

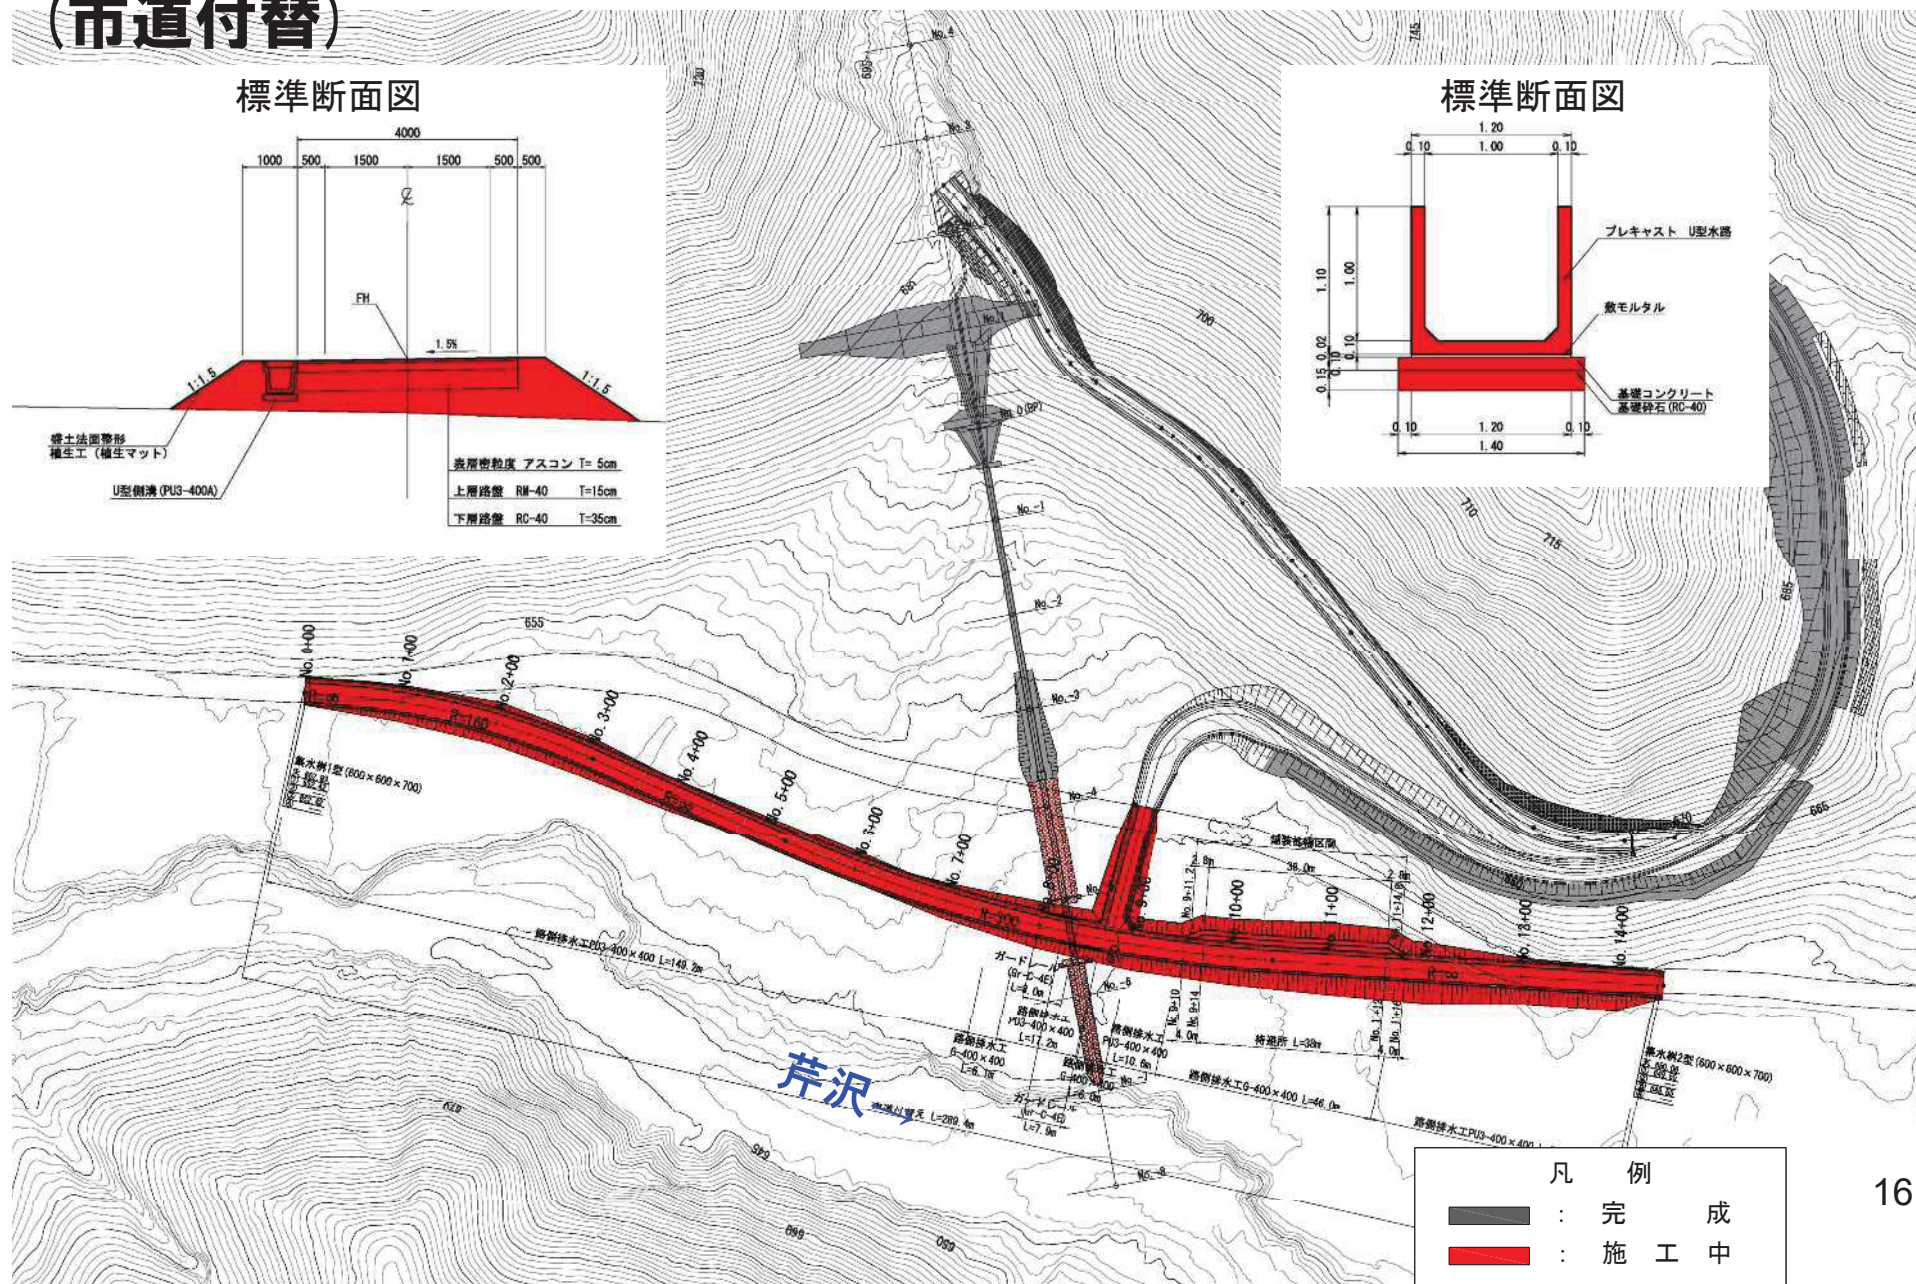

(5) R2下坪上沢砂防堰堤管理用道路工事(予定)

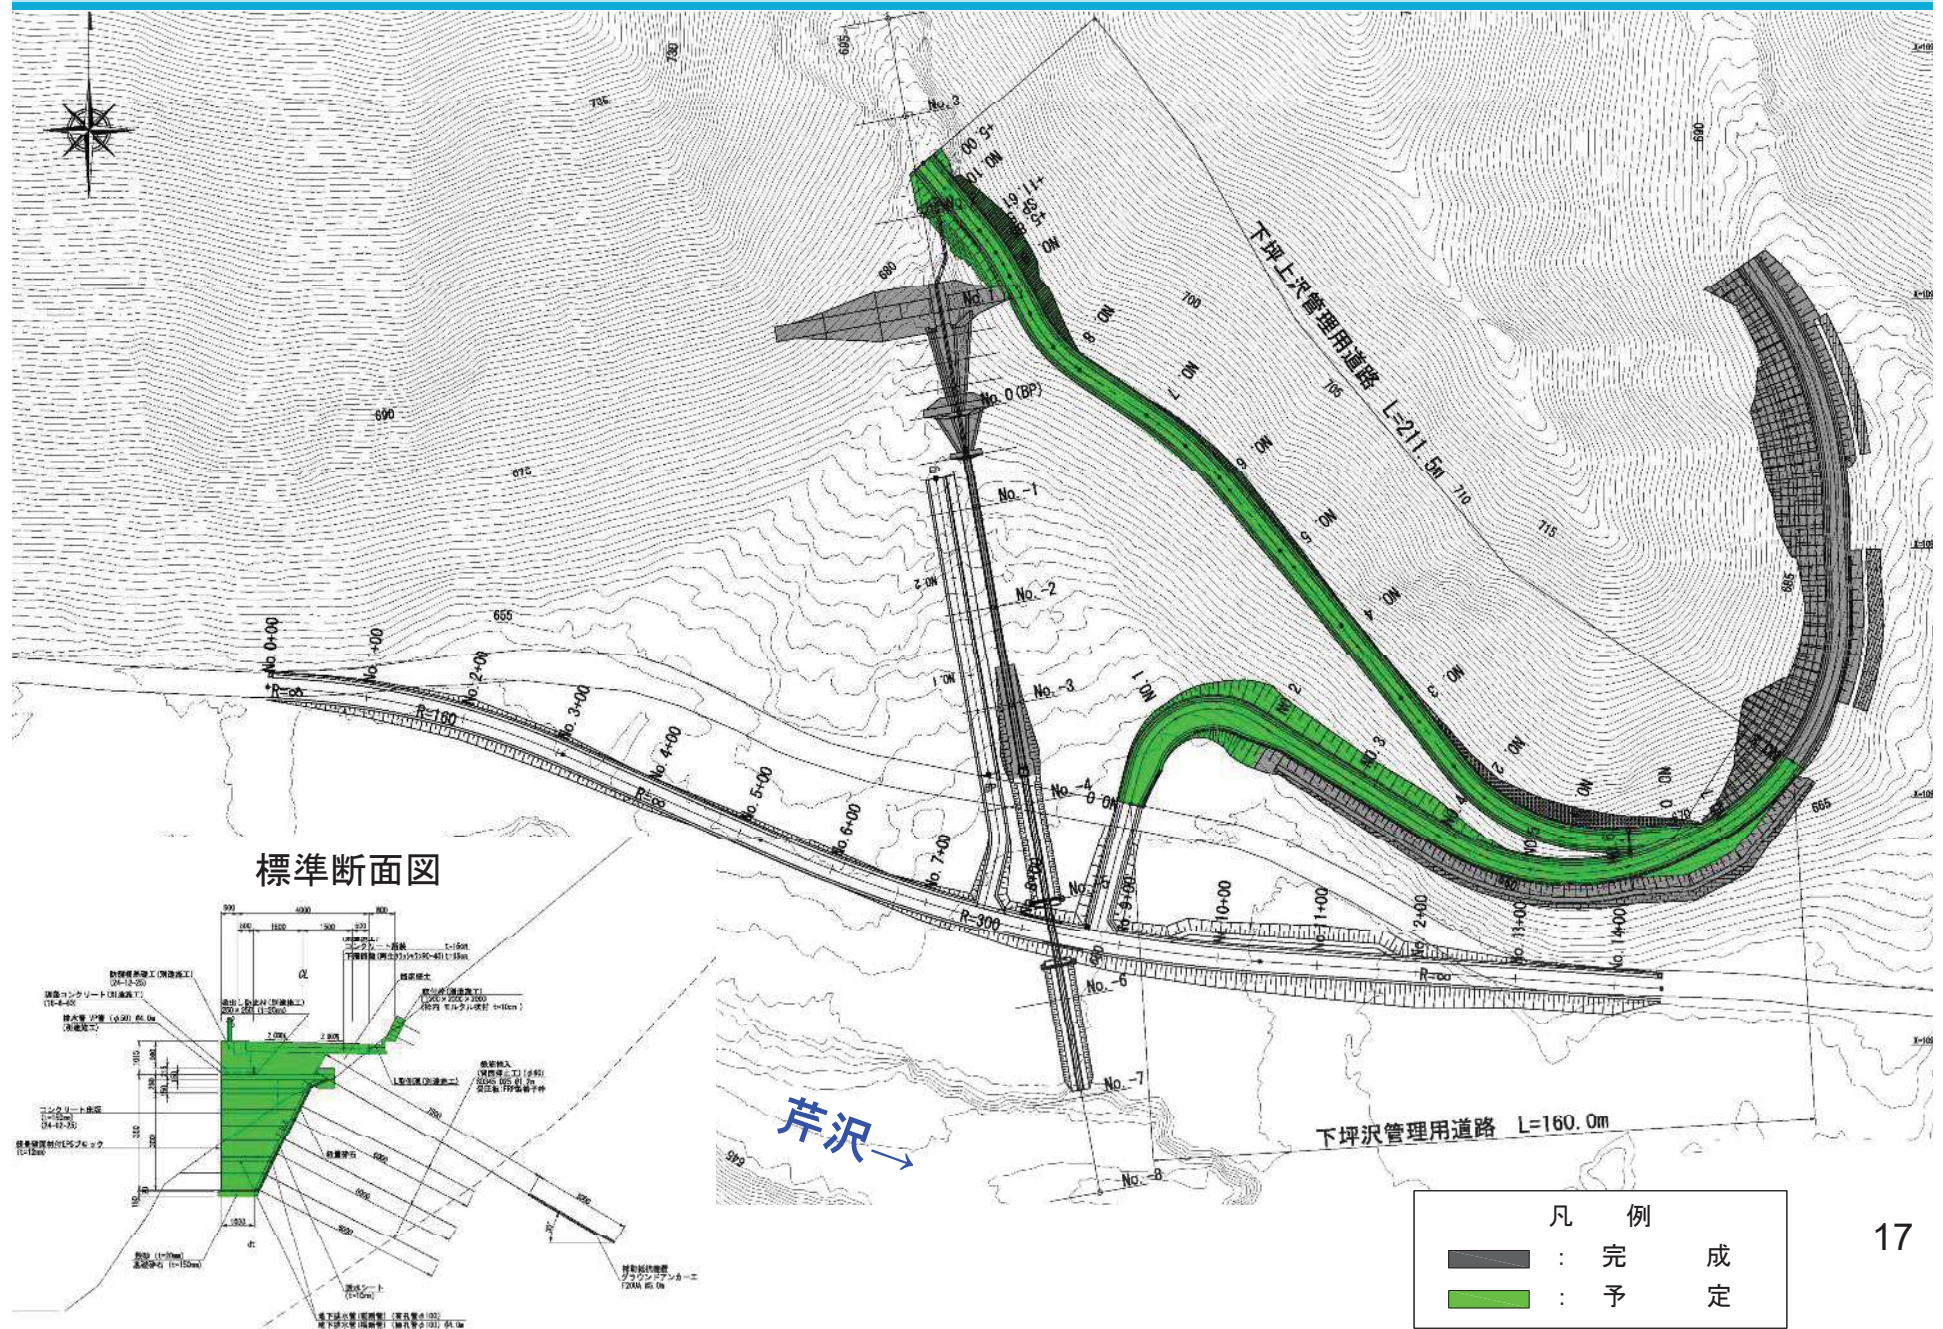

平成27年9月関東・東北豪雨により災害が発生して以降、緊急的な対策を実施しているところですが、日光は過去から土砂災害の多い地域であり、豪雨等の影響により流域にはまだ多くの不安定な土砂が存在しています。

住民のみなさまにおかれましては、豪雨の際には速やかに避難していただくよう、お願いいたします。

工事にあたって

①作業日及び作業時間

- ・月曜日～土曜日（年末年始を除く）
- ・8:00～17:00

※工事の進捗状況により変更する場合は、
事前にご近所の方に連絡致します。

②工事車両運行ルール

- ・宅地前や歩行者の横を通行する際は20km/h徐行。
- ・現場出入口には誘導員を配置し、一般車両優先。
- ・現場出入口及び工事車両通行道路の清掃。


1. 土地の境界にコンクリート杭を打設します。
2. 意向確認に基づき、要望のあった土地について覆土します。

覆土要望のあった地権者の皆様に対しては、個別に連絡させていただきます。


なお、作業は令和2年11月以降を予定しています。

1. ウドン沢・中坪上沢・中坪下沢の管理用道路の入口にゲートを設置します。
2. ゲート鍵は、藤原出張所と自治会にて一錠ずつ保管。
3. 個人で使用的場合は、自治会に借用して使用をお願いします。


ウドン沢

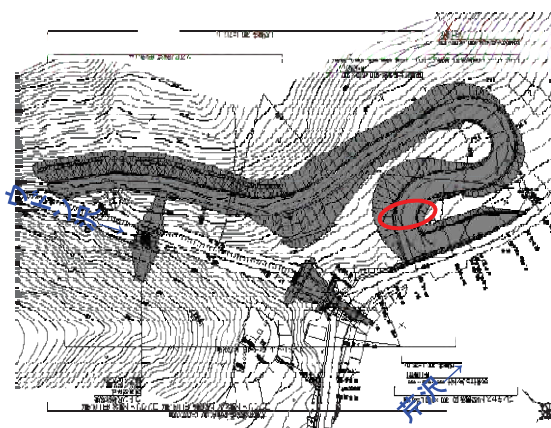

中坪上沢

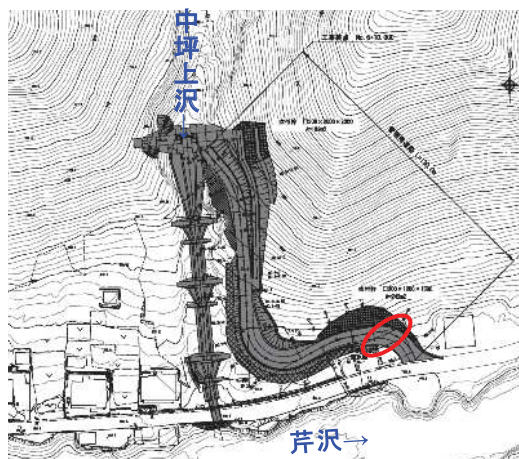

中坪下沢

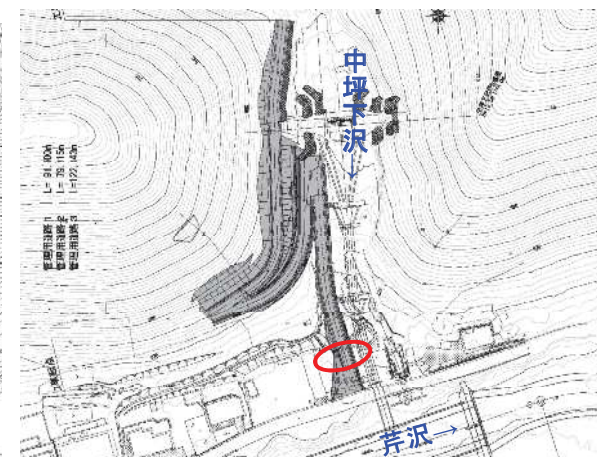

**引き続き、
ご指導、ご協力お願い致します。**
