東京外環地下水検討委員会

資料


中央JCT 地下水流動保全工について

令和3年12月3日

国土交通省関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 東日本高速道路株式会社関東支社 東京外環工事事務所 中日本高速道路株式会社東京支社 東京工事事務所

(1) 地下水流動保全工の通水状況 ①概要

- 〇令和2年1月において、地下水流動保全エユニットA,B(タイプ2)の通水を開始した。
- 〇通水開始後においても地下水位観測を継続し、通水機能の持続性と周辺の地下水位変動状況をモニタリングしている。

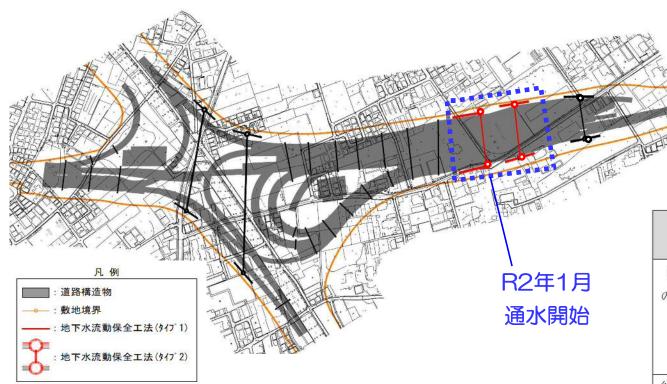

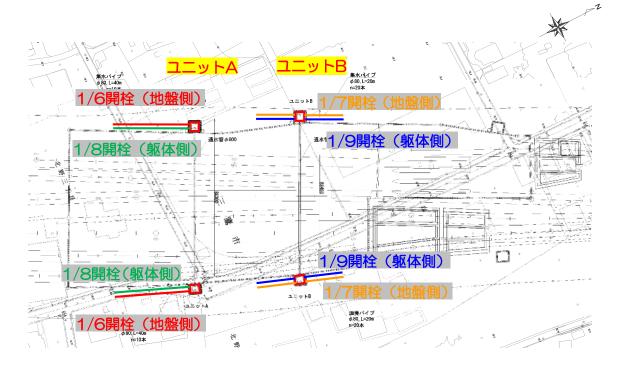


図1 地下水流動保全工の通水開始ユニット

表1 通水開始にあたっての委員会意見と対応

	通水開始にあたり頂いた意見	対応	結果		
	(事前説明時、委員会)				
湛水	・バルブを開ける際には地下水が逆	・バルブ開放前の井戸内の水位	・バルブ開放後の上下流地盤の水位		
の水位	流しないように、周辺地盤の地下	は、上流~下流地盤の中間水位	観測により、逆流等の異常はなく、		
	水位と井戸内水位が大きく異なら	相当とした。	正常に通水したことを確認。		
	ないように注意が必要である。				
細粒分	・湛水時、井戸坑内の汚れが出てく	・湛水前に井戸坑内の汚れを除去	・湛水後、濁度を測定して、細粒分		
の除去	る可能性がある。	(水道水での洗い流し)	がないことを確認。		
	・バルブを開けた直後は、一時的に	・湛水前にパイプ周りの細粒分を	・バルブ開放後、濁度を測定して、		
	外側地盤から細粒分が井戸内に出	除去(バルブ開閉操作による)	外側地盤から細粒分を引き込ん		
	てくる可能性がある。	・バルブ開放後に細粒分が出るこ	でいないことを確認。		
	・これらを放置すると目詰まりの要	とも想定し、凝集剤を現場に準	(事前の地下水揚水試験等で得ら		
	因となるため、出てきた細粒分は	備。	れた帯水層の濁度と同等以下を		
	除去する必要がある。		目標)		
モニタ	・今回の通水開始だけでなく、それ	・観測開始時点からの水位変動	・今回通水開始ユニットの近傍地点		
リング	以前からの掘削や仮通水等による	を、各工事イベントと合わせて	においては、上下流の水位差の縮		
	地下水位の変化を整理しておく	時系列的に整理する。	小を確認。		
	と、より安心材料となる。	・今回通水開始したユニットだけ	・JCT全体大局的には、水位及び		
	・今後 JCT 全体で通水管理をしてい	でなく、JCT全体の観測井の	平面水位分布ともに大きな変動		
	くことになるが、今回の通水確認	水位変動もモニタリングを継続	はないことを確認。		
	の結果を踏まえて当初計画の妥当	し、計画の妥当性を確認してい	・引き続きモニタリングを行い、委		
		< ∘	員会の意見を踏まえながら地下		
	性を確認し、必要に応じて見直す		水保全の妥当性を整理していく。		
	ことが重要。				

※図中の日付は、バルブ開栓した日付け(段階的にバルブを開栓)

(1) 地下水流動保全工の通水状況 ②通水開始手順

- 〇地下水流動保全エタイプ2 ユニットA、Bは、図2に示す手順で通水を開始した。
- 〇各井戸のバルブは、委員会にて審議した順序・方法にしたがい、周辺の地下水位に異常が生じないことを監視しながら開栓した。

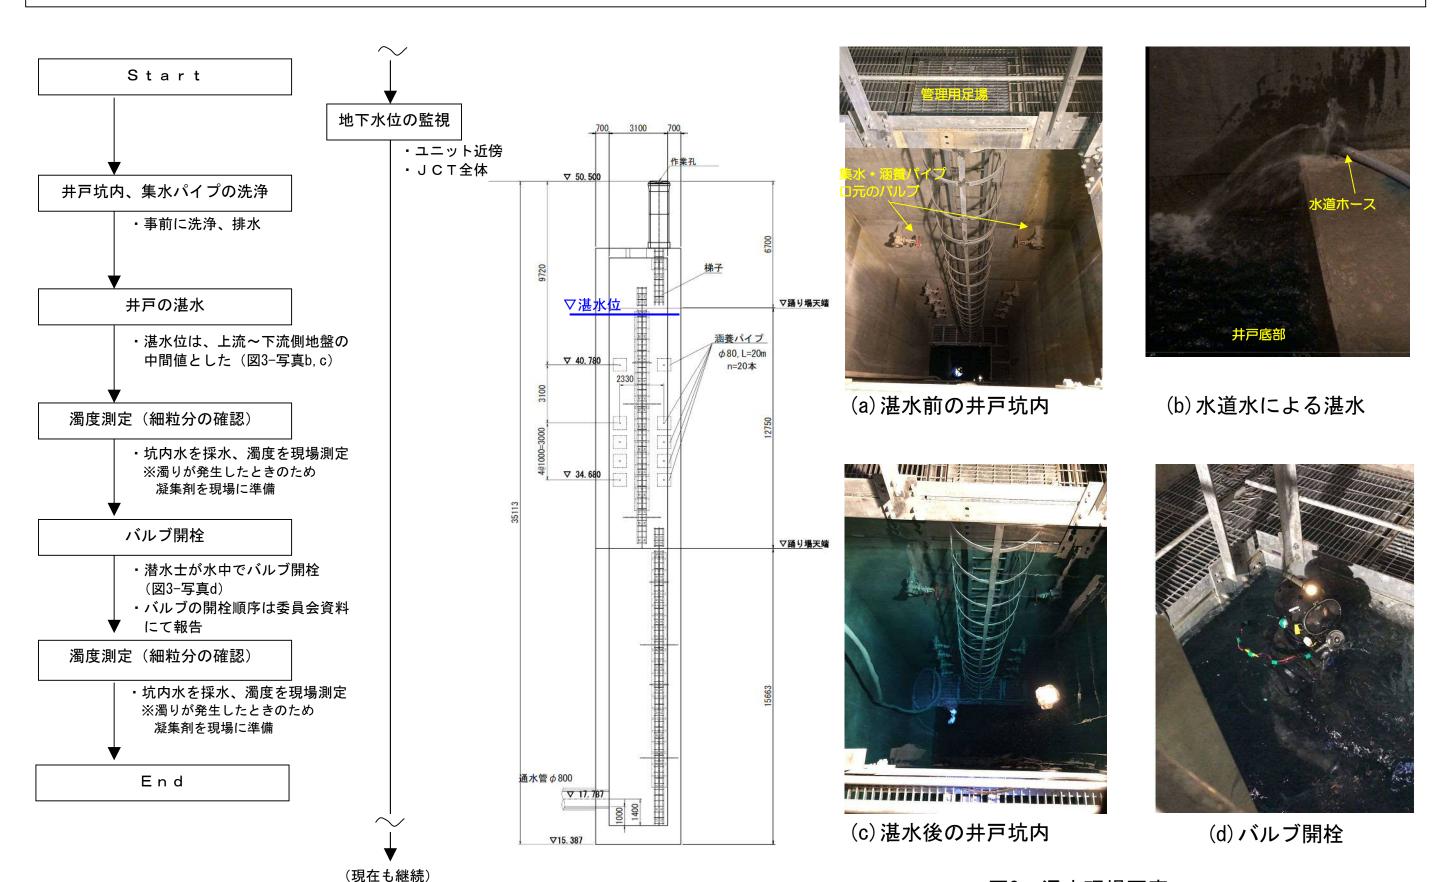


図2 通水開始手順

図3 通水現場写真 ※写真はユニットB涵養井戸

(1) 地下水流動保全工の通水状況 ③湛水時、バルブ開栓前後の細粒分確認

〇湛水時、バルブ開栓後において井戸内水を採水して濁度等を測定し、目詰まりが懸念される汚れや濁りがないことを確認した。

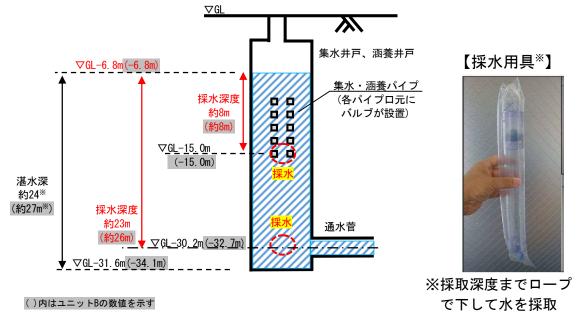


表2 バルブ開栓後の井戸内水の濁度測定結果

項目	ユニットA			ユニットB				
	集水井戸		涵養井戸		集水井戸		涵養井戸	
	GL-15m	GL-30m	GL-15m	GL-30m	GL-15m	GL-33m	GL-15m	GL-33m
湛水時	0. 3	0. 4	0. 7	2. 6	0. 5	0. 1	2. 5	3. 0
バルブ 開栓後	0.3	0. 3	0. 2	0. 3	0. 2	0. 4	0. 2	0.3

単位(度)

図4 採水深度と水質測定状況

