


直轄河川における緊急対策実施状況

【平成23年東北地方太平洋沖地震による河川被災箇所】

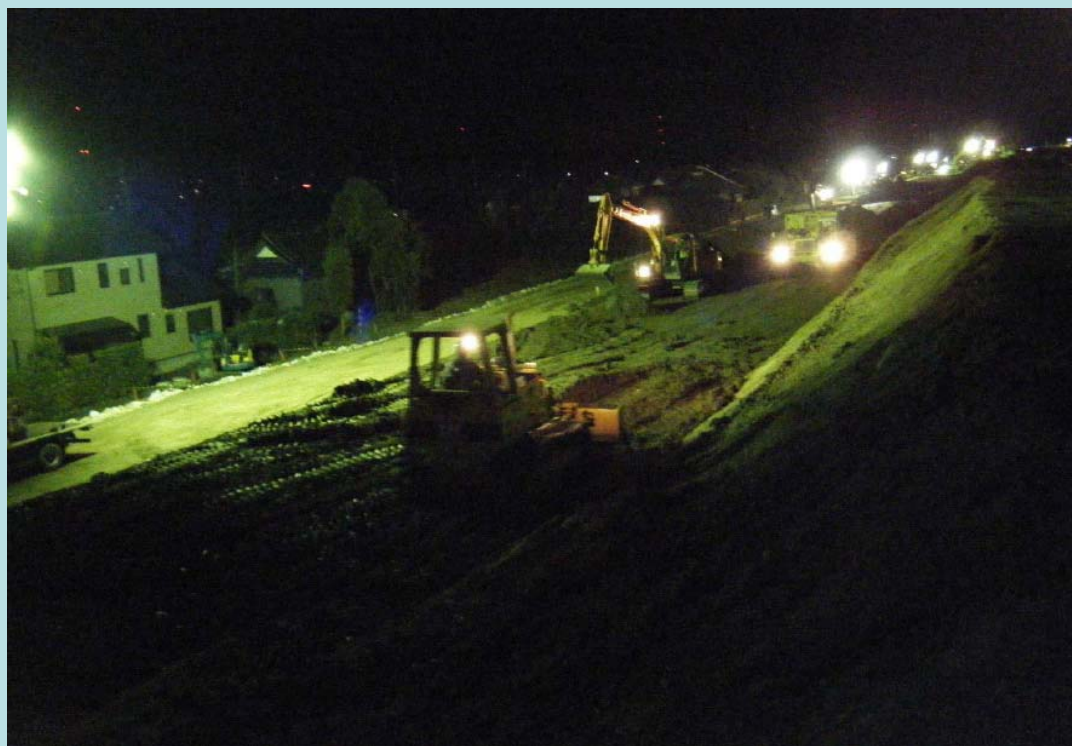

千葉県印旛郡栄町中谷地先
利根川(右岸70.3k～71.0k)

平成23年4月4日 13:30


国土交通省 関東地方整備局河川部

※今後の工事進捗に伴い、掲載している情報が変更されることがあります。

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

水系名	河川名	箇所数
利根川	利根川下流	11
	利根川上流	1
	江戸川	2
	小貝川	5
	霞ヶ浦(常陸利根川)	12
那珂川	那珂川	7
久慈川	久慈川	11
合計	3水系7河川	49

平成23年 4月 4日 13時30分現在

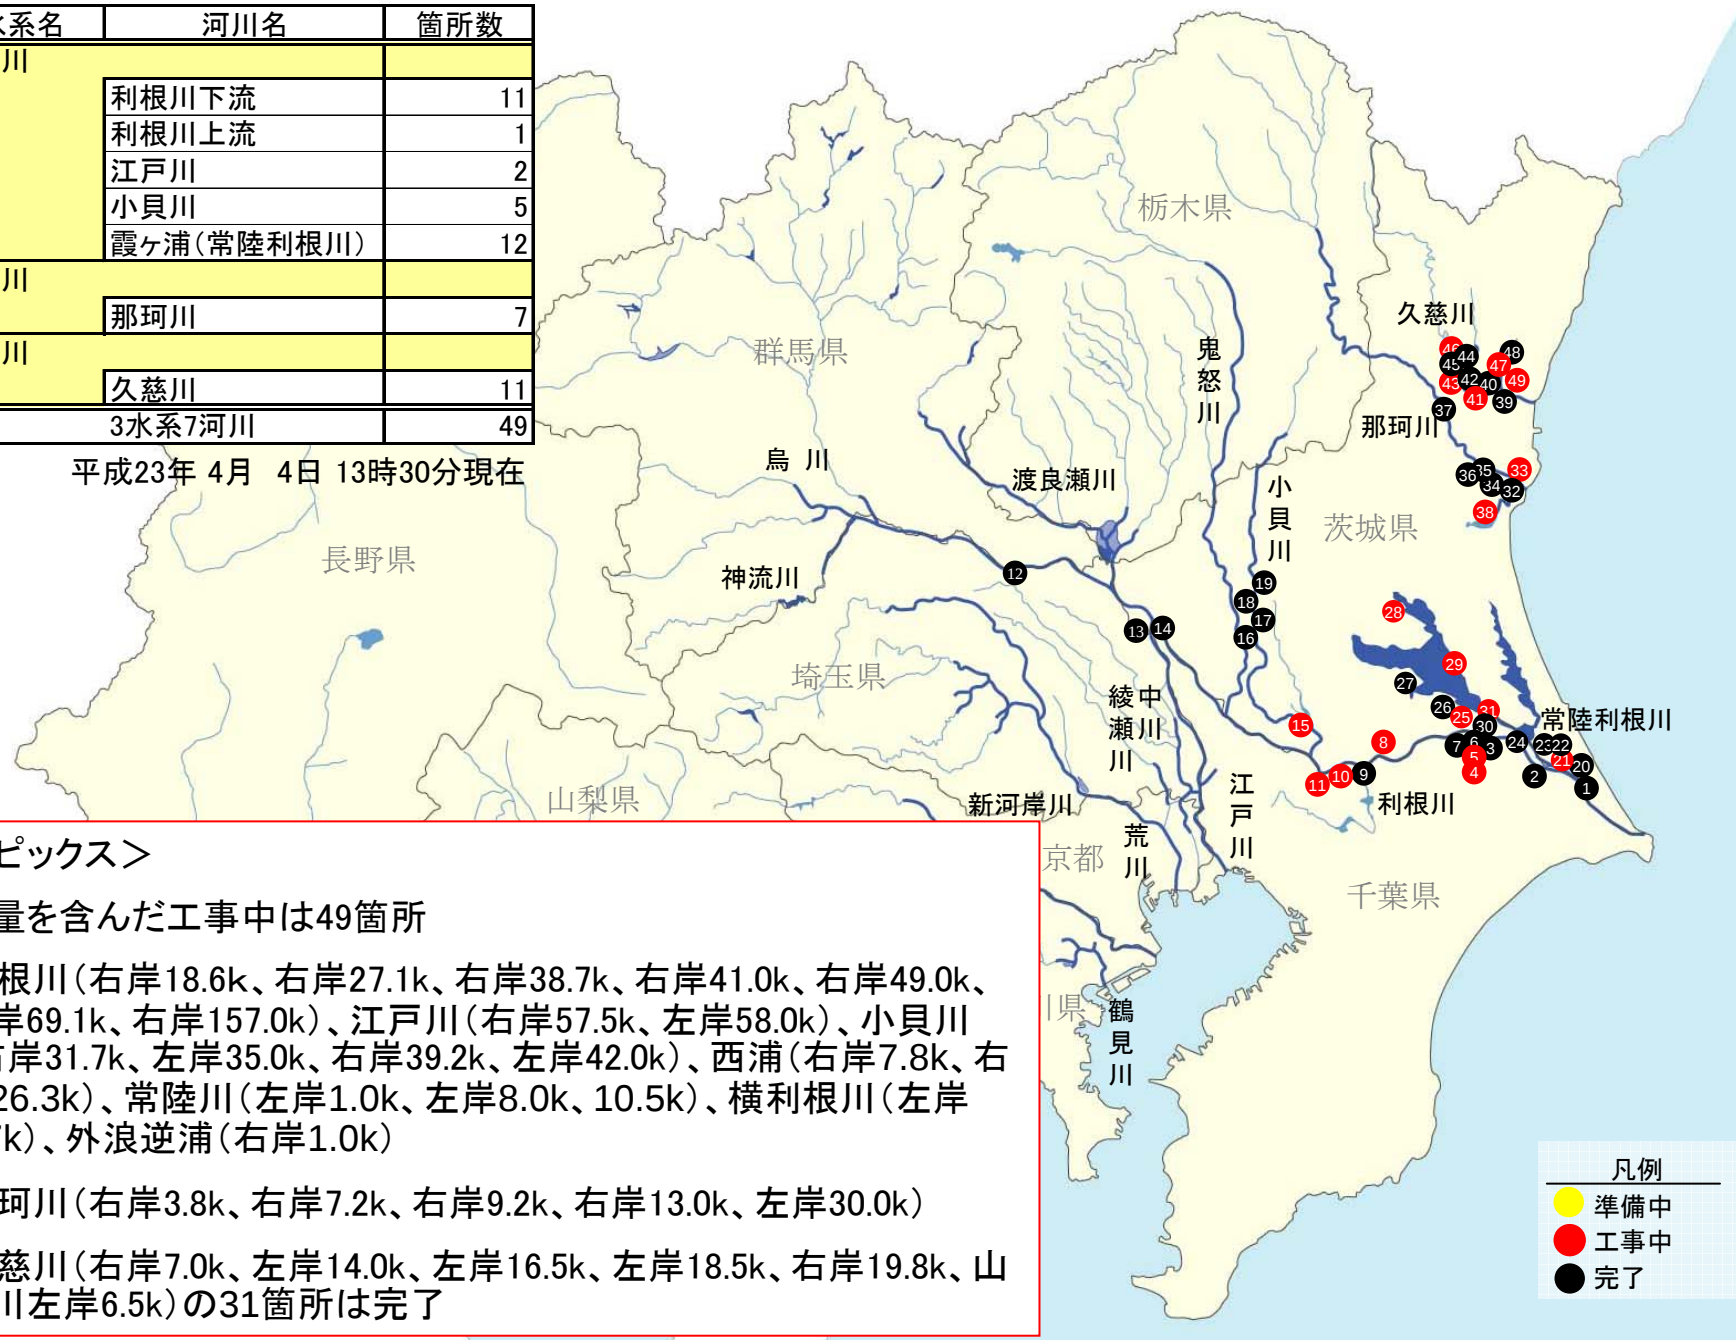

<トピックス>

・測量を含んだ工事中は49箇所

利根川(右岸18.6k、右岸27.1k、右岸38.7k、右岸41.0k、右岸49.0k、右岸69.1k、右岸157.0k)、江戸川(右岸57.5k、左岸58.0k)、小貝川(右岸31.7k、左岸35.0k、右岸39.2k、左岸42.0k)、西浦(右岸7.8k、右岸26.3k)、常陸川(左岸1.0k、左岸8.0k、10.5k)、横利根川(左岸2.7k)、外浪逆浦(右岸1.0k)

那珂川(右岸3.8k、右岸7.2k、右岸9.2k、右岸13.0k、左岸30.0k)


久慈川(右岸7.0k、左岸14.0k、左岸16.5k、左岸18.5k、右岸19.8k、山田川左岸6.5k)の31箇所は完了

凡例	
●	準備中
●	工事中
●	完了

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

① 地先名: 茨城県神栖市横瀬地先
河川名: 利根川下流(左岸18.6k~19.0k)

平成23年 3月31日 15:00完了

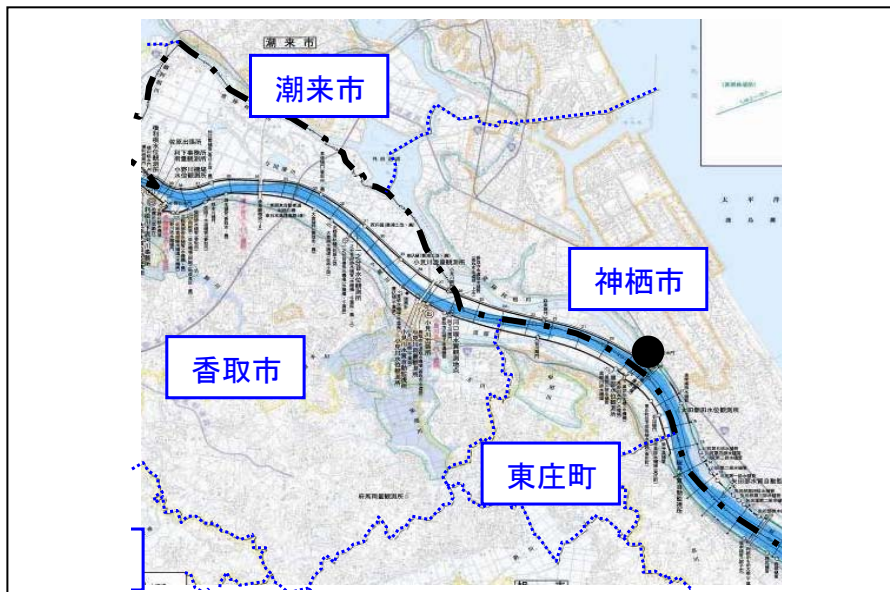


- ・ 被災内容: 堤防陥没 L=389m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約14,000m³
シート張 約 5,600m²
ブロックマット 約610m²
大型土嚢 約780袋
- ・ 着手日: 平成23年3月13日
- ・ 完了日: 平成23年3月31日15時工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

2 地先名:千葉県香取市小見川地先
河川名:利根川下流(右岸27.1k~27.2k)

平成23年 3月29日 17:00完了

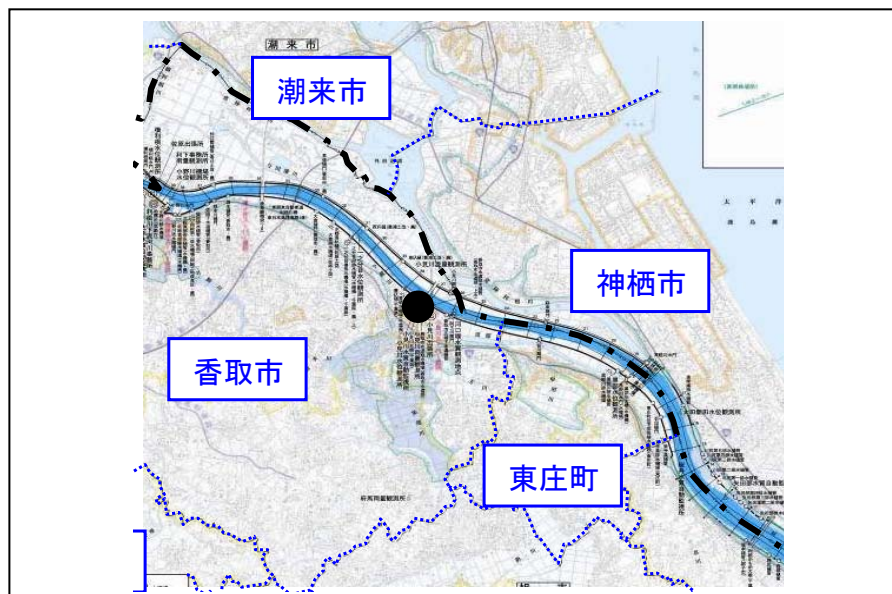


- ・被災内容: 堤防天端沈下 L=70m
- ・対策工法: 盛換工法 約1,700m³
シート張り 約810m²
大型土嚢 約210袋
- ・着手日: 平成23年3月14日
- ・完了日: 平成23年3月29日17時工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

3 地先名:千葉県香取市佐原地先
河川名:利根川下流(右岸38.7k~38.9k)

平成23年 3月31日 13:00完了

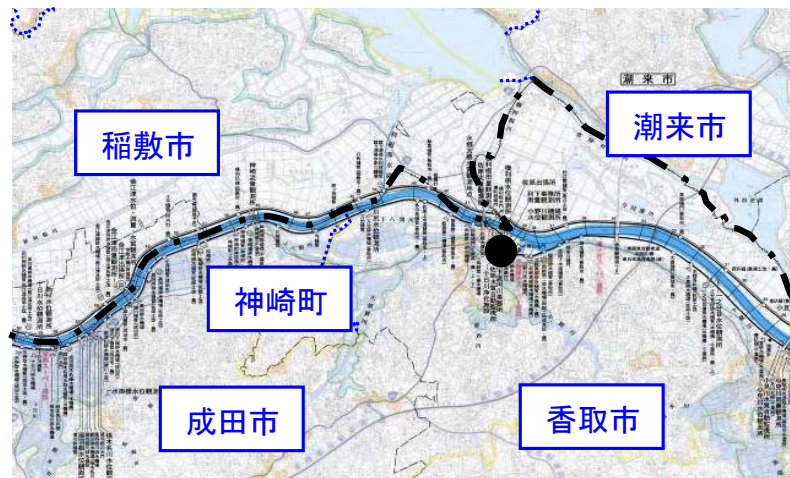

被災状況



- ・ 被災内容: 堤防天端沈下 L=134m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約2,900m³
シート張り 約2,900m²
大型土嚢 約140袋
- ・ 着手日: 平成23年3月14日
- ・ 完了日: 平成23年3月31日13時工事完了




完了


東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

4 地先名:千葉県香取市佐原イ地先
河川名:利根川下流(右岸38.8k~39.0k)

平成23年 3月31日 14:00現在

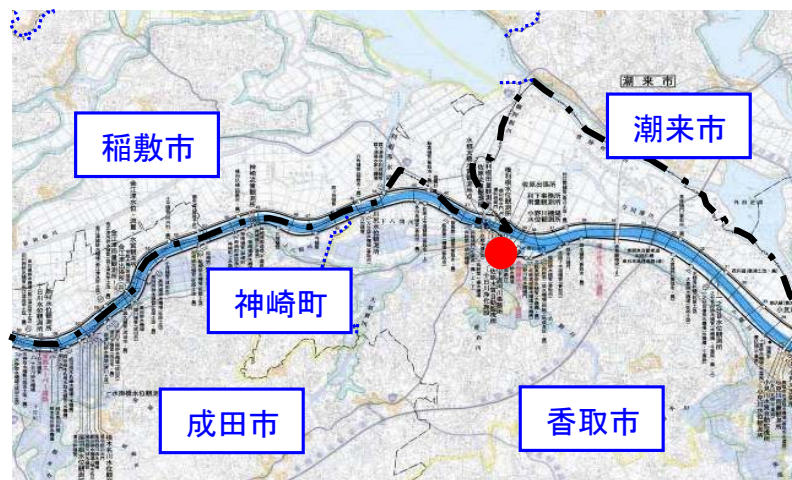

被災状況

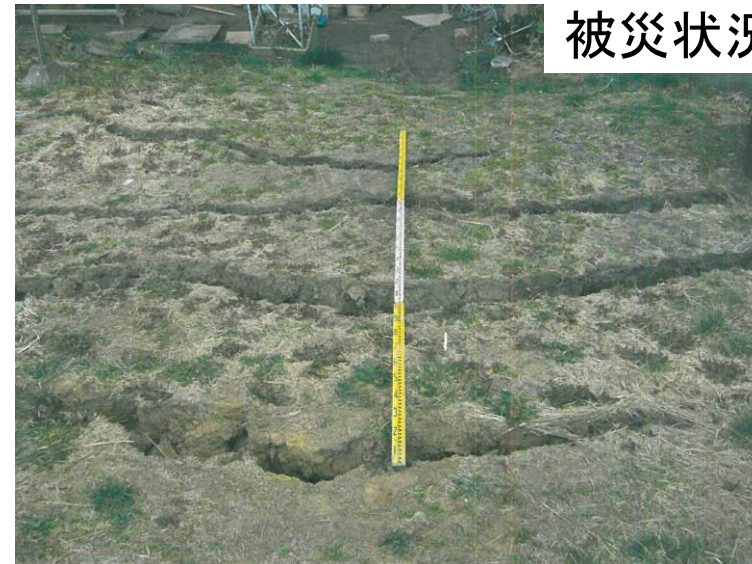

- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=214m
- ・対策工法: 盛換工法 約3,000m³
シート張り 約4,000m²
大型土嚢 約220袋
- ・着手日: 平成23年3月21日
- ・工事期間: 23日間程度
- ・現在の状況: 大型土嚢製作完了
舗装版撤去工完了
掘削工、盛土工、シート張施工中




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

5 地先名:千葉県香取市佐原イ地先
河川名:利根川下流(右岸39.1k~39.6k)

平成23年 3月31日 14:00現在

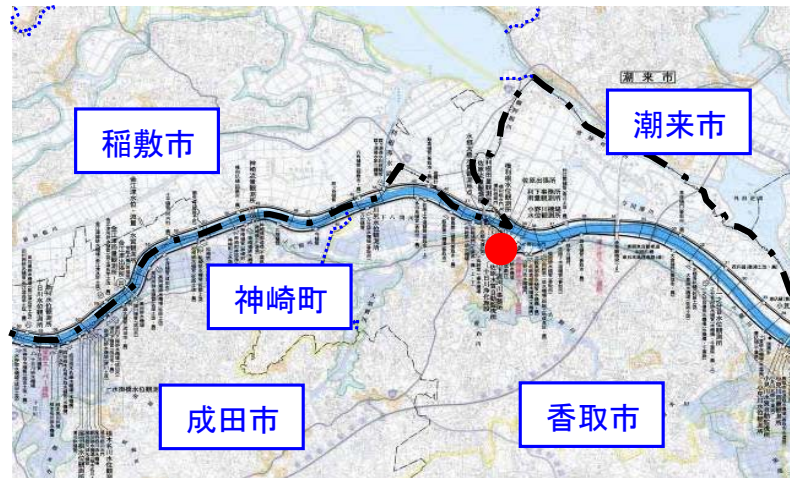

被災状況



- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=516m
- ・対策工法: 盛換工法 約9,300m³
シート張り 約7,600m²
ブロックマット 約7,100m²
大型土嚢 約520袋
- ・着手日: 平成23年3月21日
- ・工事期間: 35日間程度
- ・現在の状況: 舗装版撤去工完了
掘削工、盛土工施工中
シート張工施工中
ブロックマット設置施工中


進捗状況



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

6 地先名:千葉県香取市佐原口地先
河川名:利根川下流(右岸41.0k~41.2k)

平成23年 3月31日 12:00完了

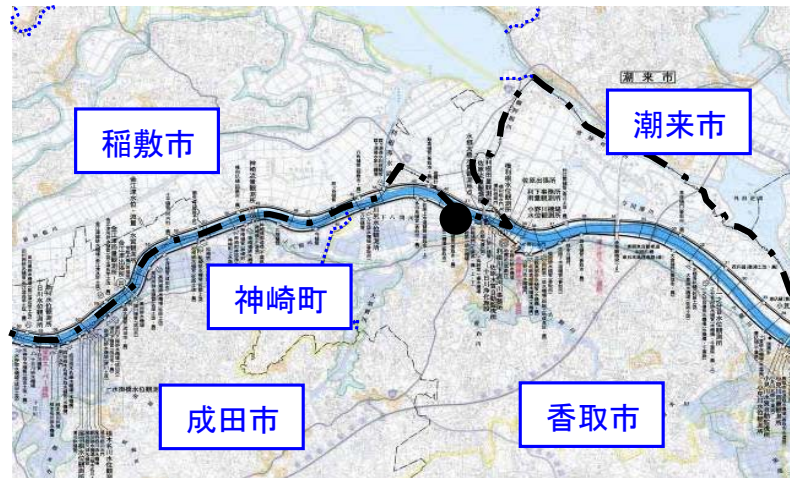

被災状況



- ・被災内容: 堤防川表法滑り L=210m
- ・対策工法:
 - 盛換工法 約3,100m³
 - シート張り 約2,300m²
 - ブロックマット 約3,400m²
 - 大型土嚢 約420袋
- ・着手日:平成23年3月18日
- ・完了日:平成23年3月31日12時工事完了




完了

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

7 地先名:千葉県香取郡神崎町神崎本宿地先
河川名:利根川下流(右岸49.1k~49.2k)

平成23年 3月27日 15:00完了

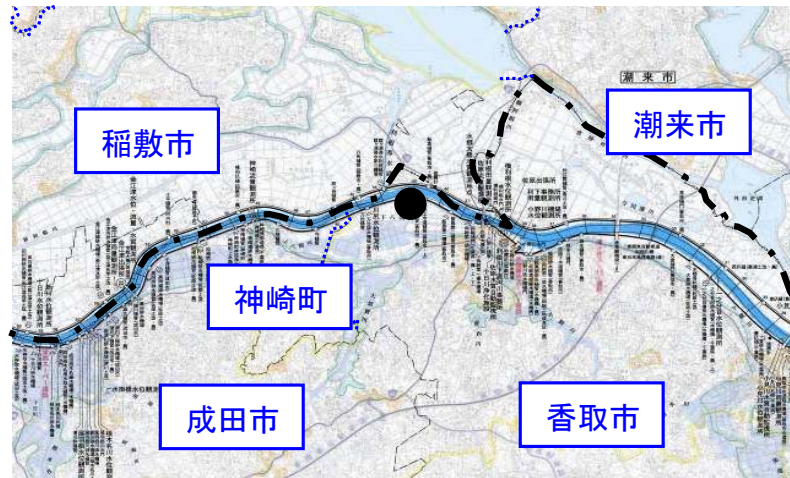

被災状況



- ・ 被災内容: 堤防天端沈下 L=140m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約1,600m³
シート張り 約480m²
大型土嚢 約280袋
- ・ 着手日: 平成23年3月14日
- ・ 完了日: 平成23年3月27日15時工事完了

完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

8

地先名: 茨城県稲敷郡河内町龍ヶ崎町歩地先
河川名: 利根川下流(左岸67.2k~68.0k)

平成23年 3月31日 14:00現在



被災状況



- 被災内容: 堤防天端沈下 L=550m
- 対策工法: 盛換工法 約28,000m³
シート張り 約4,700m²
ブロックマット 約7,200m²
大型土嚢 約1,100袋
- 着手日: 平成23年3月14日
- 工事期間: 35日間程度
- 現在の状況: 盛土工、シート張工施工中
大型土嚢工、舗装工施工中




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

9 地先名: 千葉県印旛郡栄町請方地先
河川名: 利根川下流(右岸69.1k~69.2k)

平成23年 3月31日 15:00完了

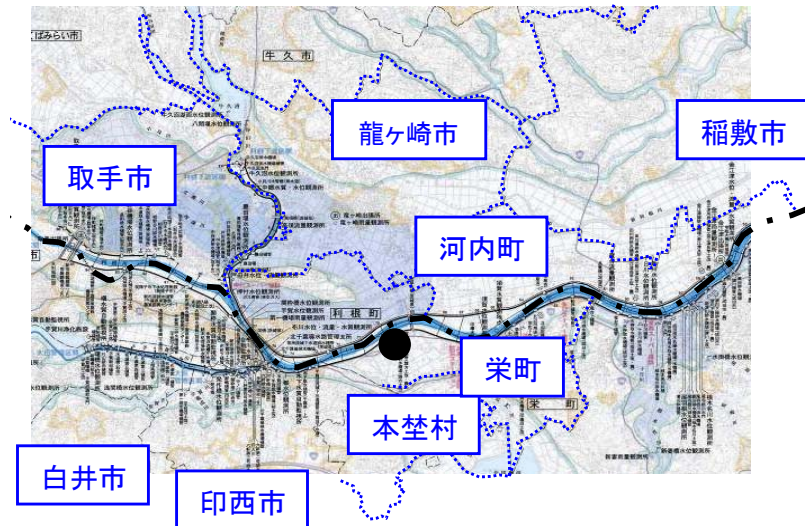

堤防天端沈下 深さ1.5m

- ・ 被災内容: 堤防天端沈下 L=116m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約4,500m³
シート張り 約2,700m²
大型土嚢 約120袋
- ・ 着手日: 平成23年3月14日
- ・ 完了日: 平成23年3月31日15時工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

10 地先名: 千葉県印旛郡栄町中谷地先
河川名: 利根川下流(右岸69.7k~70.1k)

平成23年 3月31日 14:00現在



被災状況



- ・ 被災内容: 堤防天端沈下 L=430m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約17,000m³
シート張り 約10,000m²
大型土嚢 約430袋
- ・ 着手日: 平成23年3月14日
- ・ 工事期間: 24日間程度
- ・ 現在の状況: 表土剥ぎ完了
大型土嚢工、舗装工施工中
掘削工、盛土工施工中

進捗状況



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

11 地先名: 千葉県印旛郡栄町三和地先
河川名: 利根川下流(右岸70.3k~71.0k)

平成23年 3月31日 14:00現在



- ・ 被災内容: 堤防天端沈下 L=633m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約25,000m³
シート張り 約15,000m²
大型土嚢 約640袋
- ・ 着手日: 平成23年3月14日
- ・ 工事期間: 43日間程度
- ・ 現在の状況: 大型土嚢工施工中
掘削工、盛土工施工中
舗装工、シート張り施工中



直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

河川名:利根川上流(右岸157.2k)

平成23年 3月13日 20:45完了




- ・ 被災内容：福川水門取付護岸 法崩れ
 - ①左岸上流 L=15m
 - ②右岸下流 L= 6.6m
- ・ 対策工法：①袋型根固(2t) 138袋
 - ②袋型根固(2t) 20袋
- ・ 着手日：平成23年3月12日
- ・ 完了日：平成23年3月13日20時45分工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

13 地先名: 埼玉県幸手市西関宿地先
河川名: 江戸川(右岸57.6k~57.8k)

平成23年 4月 3日 15:30完了

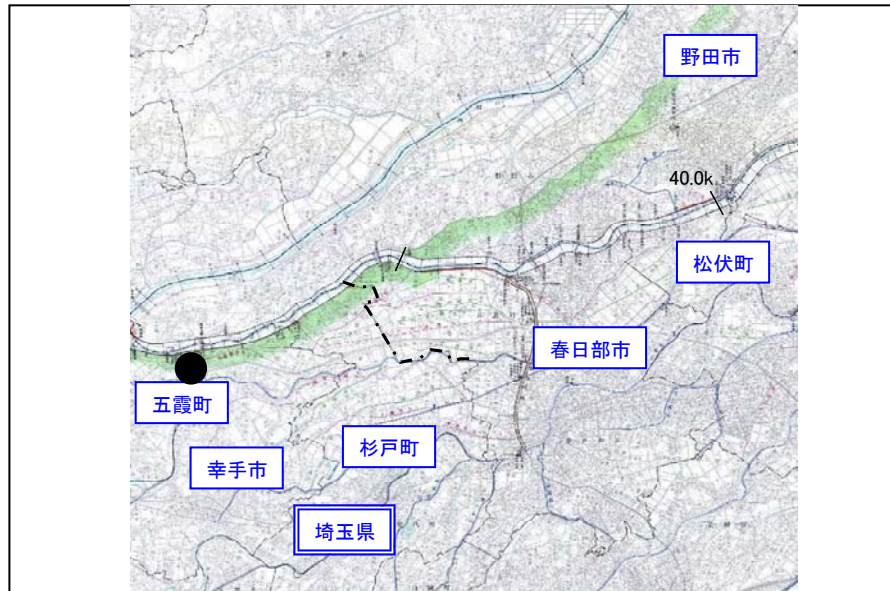


- ・ 被災内容: 堤防川裏小段法崩れ L=200m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約27,200m³
ワラ芝 約6,600m²
- ・ 着手日: 平成23年3月12日
- ・ 完了日: 平成23年4月3日15時30分工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

14 地先名:千葉県野田市関宿江戸町地先
河川名:江戸川(左岸58.2k~58.4k)

平成23年 3月28日 15:00完了

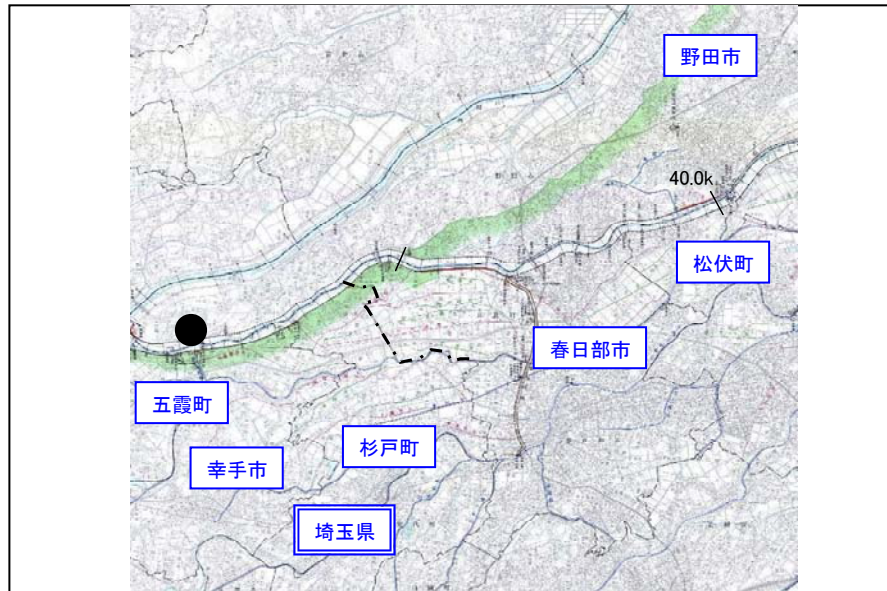

- ・ 被災内容: 堤防川表法すべり L=230m
- ・ 対策工法:

掘削工	約5,000m ³
盛土工	約5,000m ³
押え盛土	約2,400m ³
張芝	約6,800m ²
- ・ 着手日: 平成23年3月12日
- ・ 完了日: 平成23年3月28日15時工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

15 地先名: 茨城県取手市宮和田地先
河川名: 小貝川(右岸1.9k~2.1k)

平成23年 3月31日 14:00現在



被災状況

- ・ 被災内容: 堤防法崩れ L=220m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約6,000m³
ワラ芝 約3,100m²
- ・ 着手日: 平成23年3月12日
- ・ 工事期間: 20日間程度
- ・ 現在の状況: 表土剥ぎ完了
掘削工、盛土工完了
張芝工施工中



進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

16 地先名: 茨城県常総市上蛇地先
河川名: 小貝川(右岸31.7k~31.8k)

平成23年 4月 3日 15:00完了



被災状況

- ・ 被災内容: 堤防亀裂 L=60m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約5,400m³
張芝 約930m²
ワラ芝 約840m²
- ・ 着手日: 平成23年3月15日
- ・ 完了日: 平成23年4月3日15時工事完了



完了

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

17 地先名: 茨城県つくば市上郷地先
河川名: 小貝川(左岸34.9k~35.0k)

平成23年 3月31日 17:00完了




- ・ 被災内容: 堤防亀裂 L=100m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約7,500m³
張芝 約1,540m²
ワラ芝 約1,400m²
- ・ 着手日: 平成23年3月15日
- ・ 完了日: 平成23年3月31日17時工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

18 地先名: 茨城県下妻市鯨地先
河川名: 小貝川(右岸39.2k~39.3k)

平成23年 3月31日 20:00完了

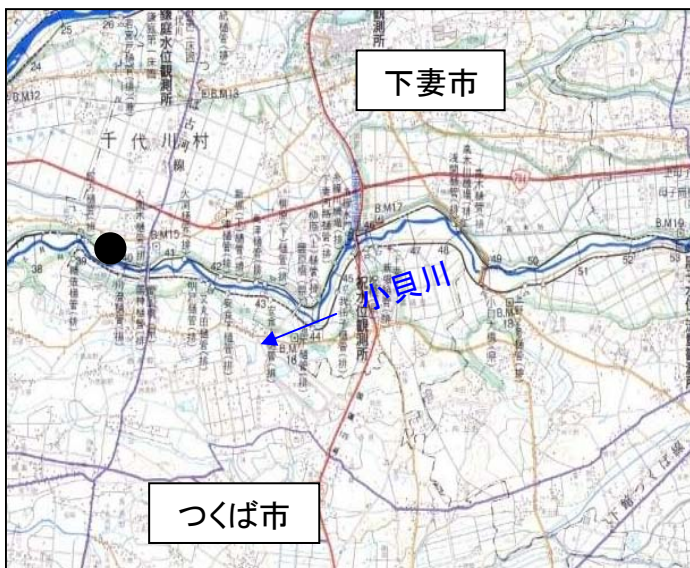

被災状況



- ・ 被災内容: 堤防法崩れ L=125m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約3,700m³
表層改良 約700m²
ワラ芝 約900m²
- ・ 着手日: 平成23年3月12日
- ・ 完了日: 平成23年3月31日20時工事完了




完了

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

19 地先名:茨城県つくば市安食地先
河川名:小貝川(左岸41.9k~42.0k)

平成23年 3月31日 20:00完了

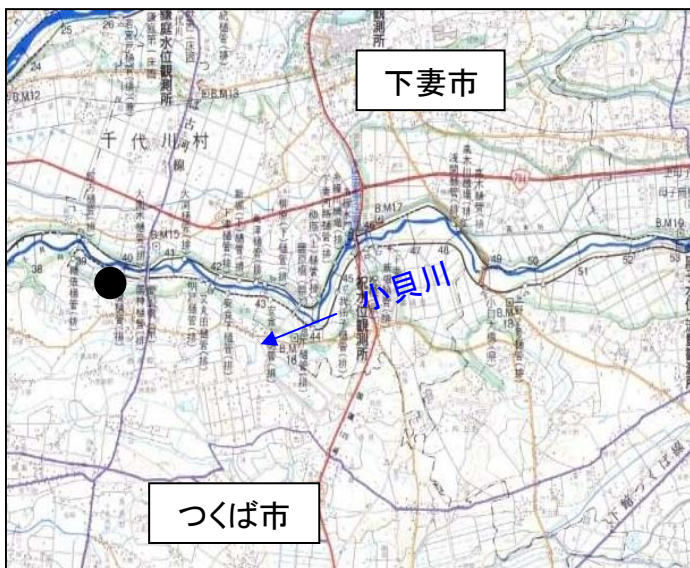

被災状況

- ・ 被災内容 : 堤防亀裂・沈下 L=59m
- ・ 対策工法 : 盛換工法 約4,500m³
張芝 約450m²
ワラ芝 約890m²
- ・ 着手日 : 平成23年3月15日
- ・ 完了日 : 平成23年3月31日20時工事完了




完了

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

20 地先名: 茨城県神栖市横瀬地先
河川名: 常陸利根川 常陸川(左岸1.0k~1.5k)

平成23年 4月1日 15:00完了

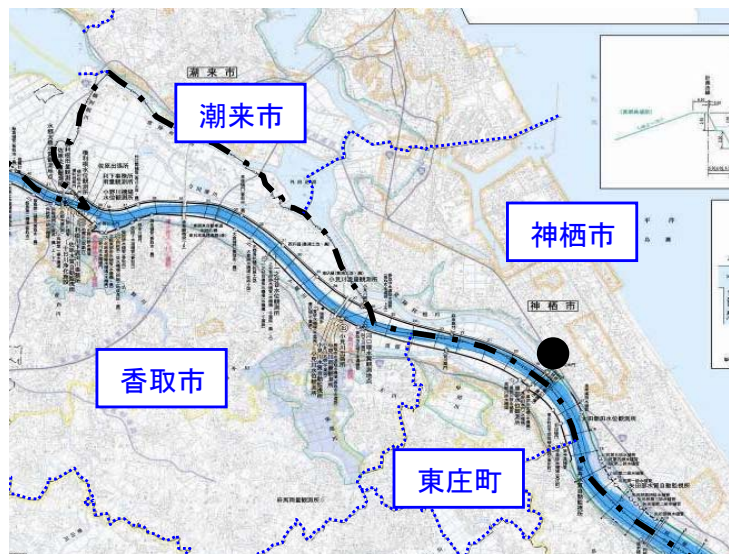


- ・ 被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=500m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約3,300m³
シート張 約4,300m²
大型土嚢 約230袋
- ・ 着手日: 平成23年3月16日
- ・ 完了日: 平成23年4月1日15時工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

21 地先名: 茨城県神栖市日川地先
河川名: 常陸利根川 常陸川(右岸2.5k~5.0k)

平成23年 3月31日 14:00現在

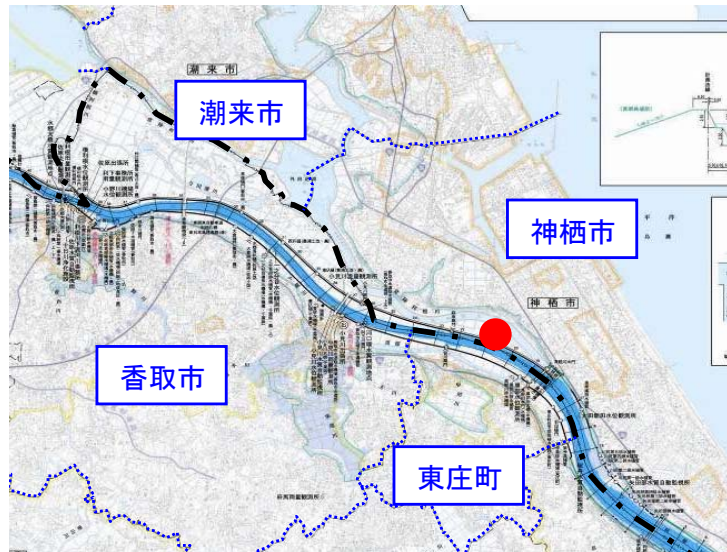

被災状況



- ・ 被災内容 : 堤防沈下・亀裂 L=2, 500m
- ・ 対策工法 : 盛換工法 約3, 300m³
シート張 約10, 200m²
大型土嚢 約120袋
- ・ 着手日 : 平成23年3月16日
- ・ 工事期間 : 30日間程度
- ・ 現在の状況 : 盛土工施工中




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

22 地先名:茨城県神栖市高浜地先
河川名:常陸利根川 常陸川(左岸8.0k~8.1k)

平成23年 3月27日 15:00完了

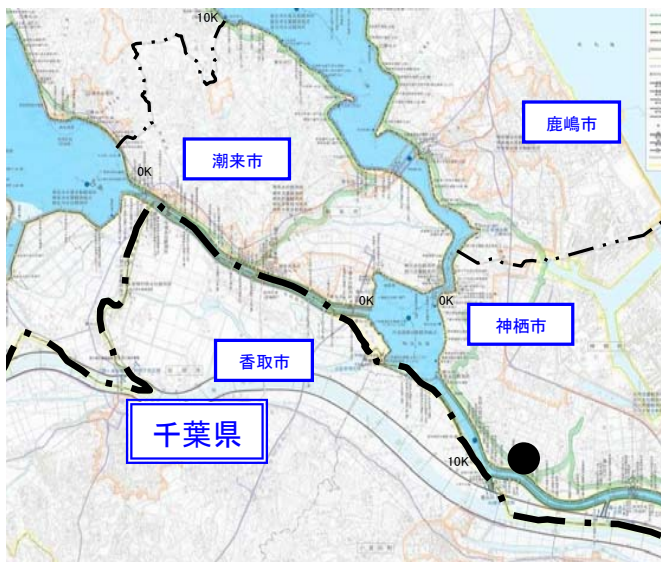


- ・ 被災内容: 堤防川表法面亀裂 L=100m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約200m³
張芝 約400m²
- ・ 着手日: 平成23年3月15日
- ・ 完了日: 平成23年3月27日15時工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

23 地先名:茨城県神栖市息栖地先
河川名:常陸利根川 常陸川(左岸10.7k)

平成23年 3月27日 15:00完了

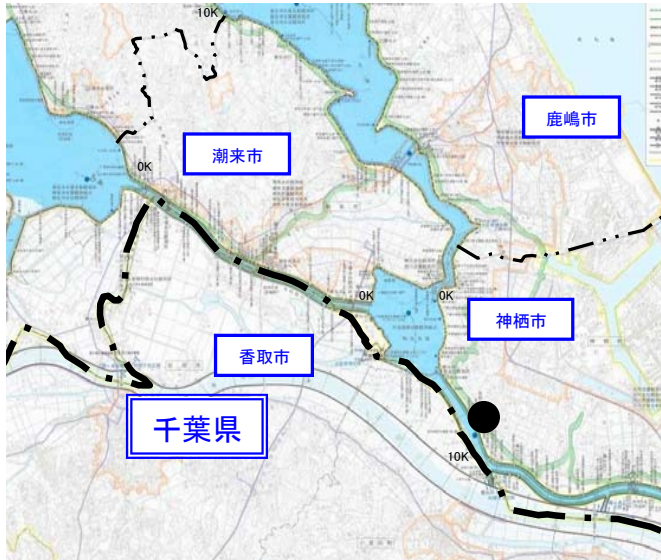


- ・被災内容：堤防沈下（樋管上下流）L=20m
- ・対策工法：盛換工法 約50m³
シート張 約300m²
- ・着手日：平成23年3月15日
- ・完了日：平成23年3月27日15時00分工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

24 地先名:千葉県香取市一ノ分目地先
河川名:常陸利根川 外浪逆浦(右岸0.8k~1.2k)

平成23年 4月3日 15:00完了

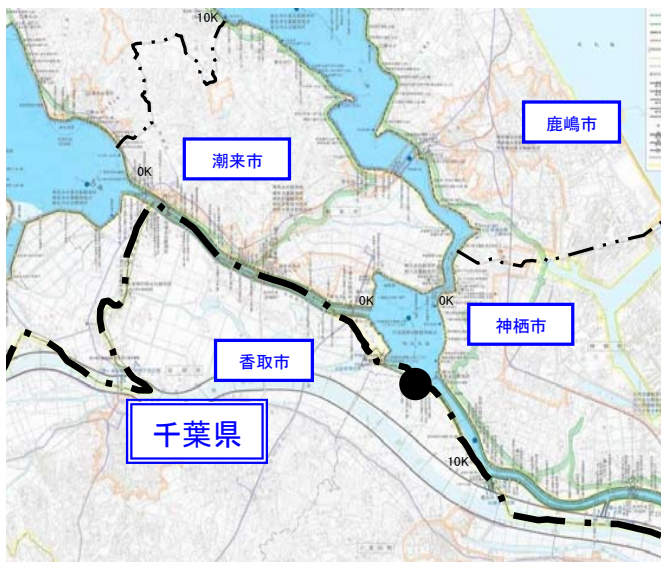

被災状況



- ・被災内容: 堤防沈下、護岸崩壊 L=400m
- ・対策工法: 盛換工法 約5,000m³
シート張 約7,000m²
大型土嚢 約500袋
- ・着手日: 平成23年3月15日
- ・完了日: 平成23年4月3日15時工事完了




完了

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

25 地先名: 茨城県稲敷市本新地先
河川名: 常陸利根川 西浦(右岸1.8k~6.0k)

平成23年 3月31日 14:00現在

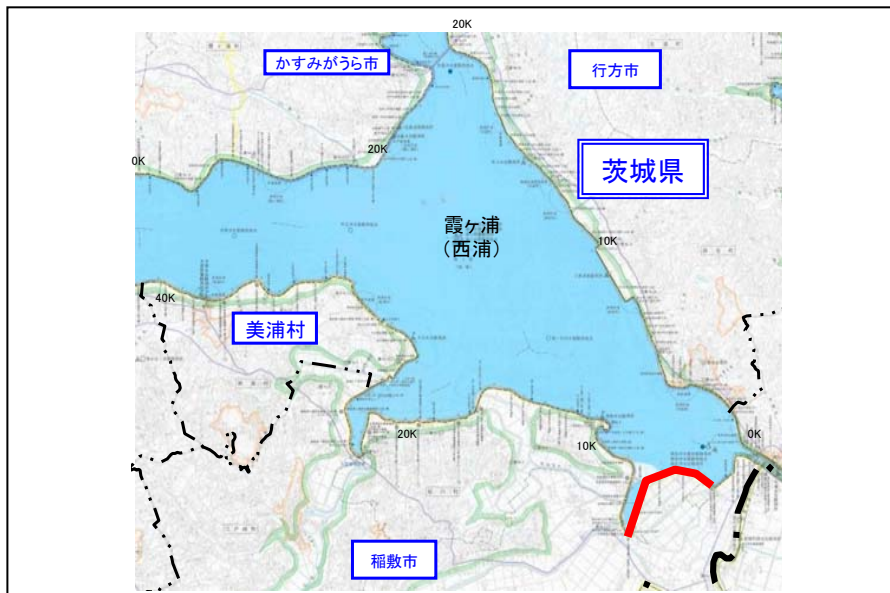


- ・ 被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=4, 250m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約18, 800m³
シート張 約52, 500m²
- ・ 着手日: 平成23年3月16日
- ・ 工事期間: 50日間程度
- ・ 現在の状況: 盛土工施工中




東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

26 地先名: 茨城県稲敷市尾島地先
河川名: 常陸利根川 西浦(右岸7.6k~8.0k)

平成23年 3月30日 11:00完了

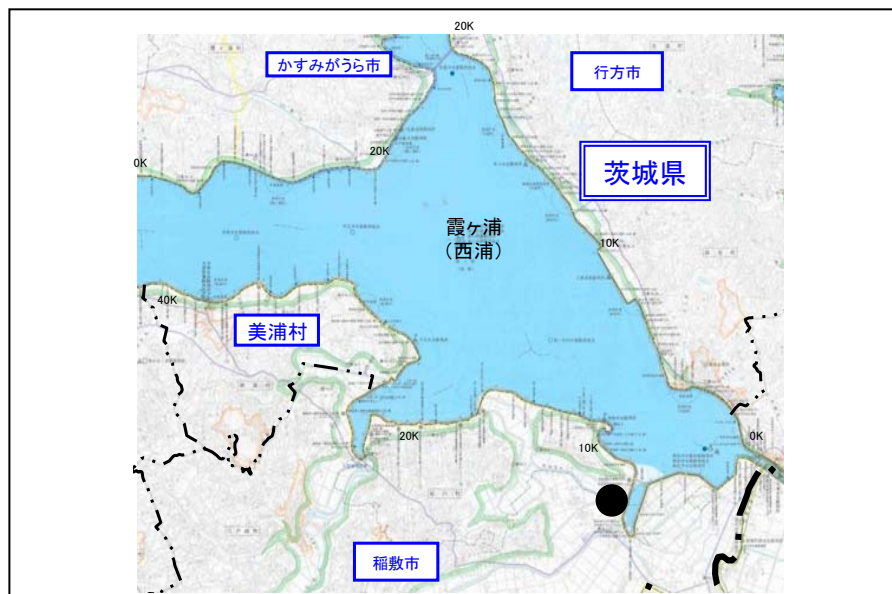


- ・ 被災内容: 堤防沈下、亀裂 L=400m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約1,700m³
シート張 約3,400m²
- ・ 着手日: 平成23年3月16日
- ・ 完了日: 平成23年3月30日11時工事完了

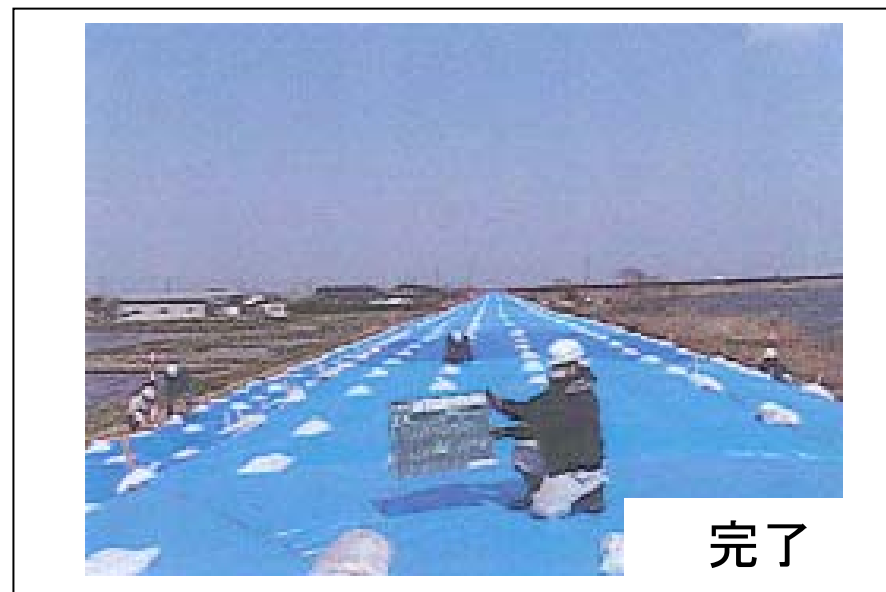

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)


27 地先名: 茨城県稲敷郡美浦村余郷入地先
河川名: 常陸利根川 西浦(右岸26.3k~26.5k)

平成23年 3月31日 17:00完了

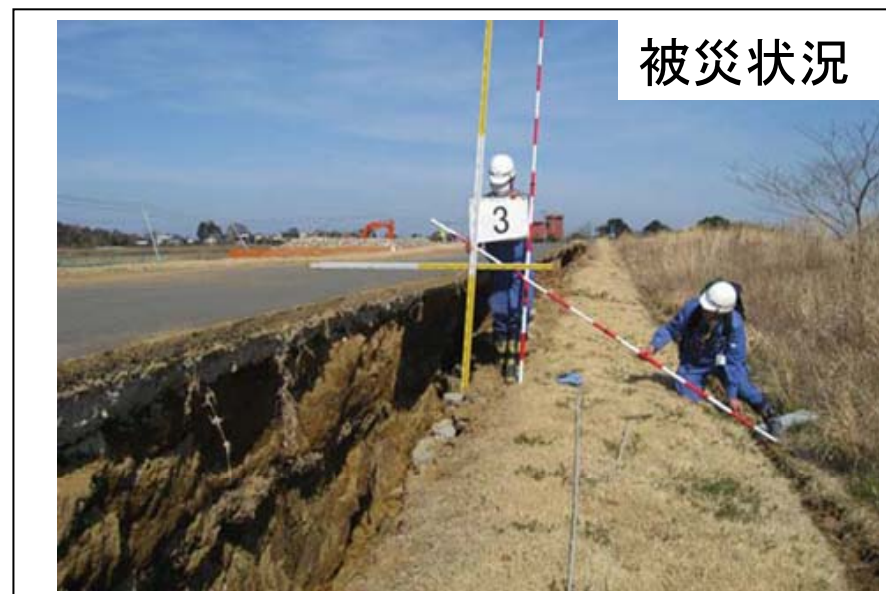

被災状況

- ・ 被災内容 : 堤防沈下・亀裂 L=250m
- ・ 対策工法 : 盛換工法 約2,400m³
シート張 約5,200m²
大型土嚢 約1,000袋
- ・ 着手日 : 平成23年3月16日
- ・ 完了日 平成23年3月31日17時工事完了

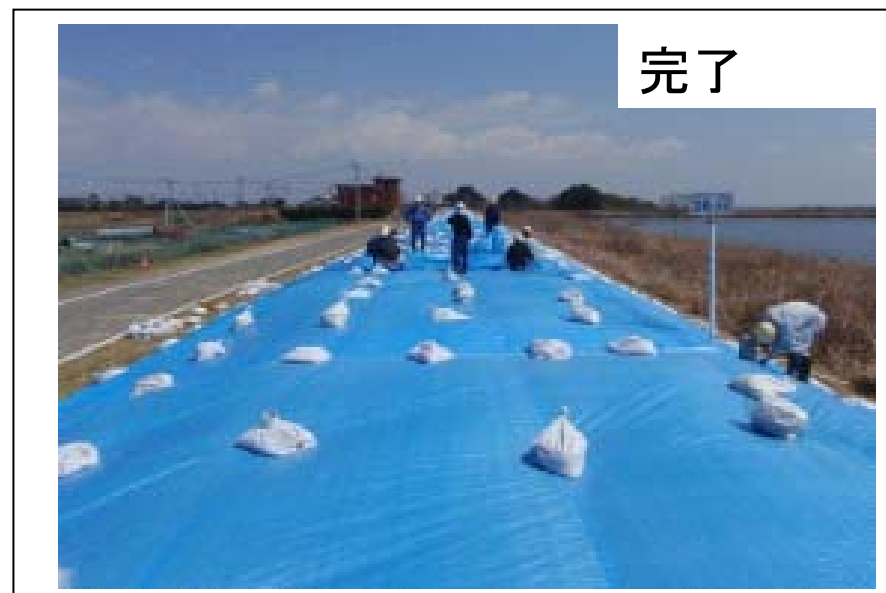

完了

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

28 地先名: 茨城県石岡市井関地先
河川名: 常陸利根川 西浦(中岸33.1k~34.0k)

平成23年 3月31日 14:00現在



- ・ 被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=900m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約2,100m³
シート張 約6,300m²
大型土嚢 約2,500袋
- ・ 着手日: 平成23年3月17日
- ・ 工事期間: 30日間程度
- ・ 現在の状況: 掘削工施工中
盛土工施工中
大型土嚢設置中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

29 地先名: 茨城県行方市小高地先
河川名: 常陸利根川 西浦(左岸8.0k~10.0k)

平成23年 3月31日 14:00現在




- ・ 被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=2,000m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約6,500m³
シート張 約15,000m²
大型土嚢 約3,000袋
- ・ 着手日: 平成23年3月16日
- ・ 工事期間: 30日間程度
- ・ 現在の状況: 土嚢設置中
盛土工施工中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

30 地先名:千葉県香取市筈島地先
河川名:常陸利根川 横利根川(左岸2.7k~2.8k)

平成23年 4月1日 8:00完了

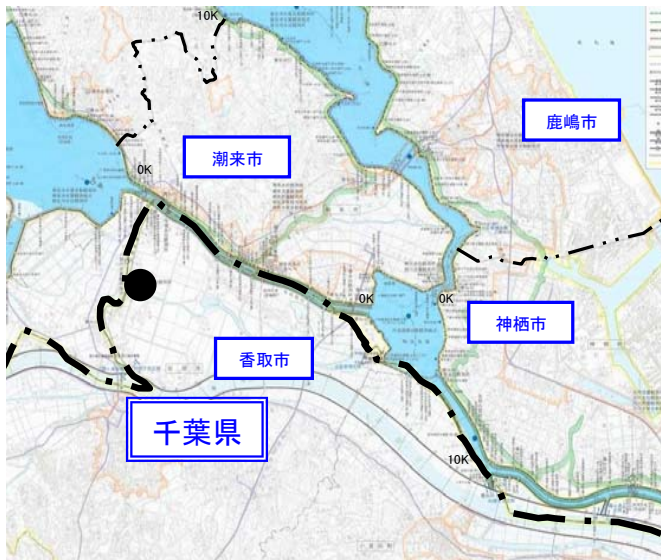


- ・ 被災内容 : 護岸沈下 L=100m
- ・ 対策工法 : 盛換工法 約250m³
シート張 約800m²
大型土嚢 約80袋
- ・ 着手日 : 平成23年3月16日
- ・ 完了日 : 平成23年4月1日8時工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

31 地先名:千葉県香取市八筋川地先
河川名:常陸利根川 横利根川(左岸4.5k~4.6k)

平成23年 3月31日 14:00現在

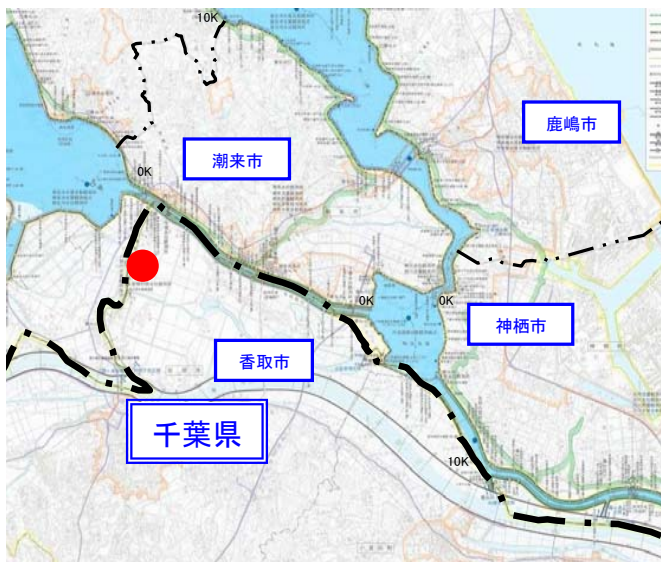

- ・ 被災内容 : 堤防沈下 L=100m
- ・ 対策工法 : 盛換工法 約1,200m³
シート張 約700m²
大型土嚢 約1,300袋
- ・ 着手日 : 平成23年3月16日
- ・ 工事期間 : 20日間程度
- ・ 現在の状況 : 盛土工施工中
大型土嚢設置中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

32 地先名: 茨城県水戸市下大野地先
河川名: 那珂川(右岸3.8k~4.5k)

平成23年 3月30日 13:00完了



- ・ 被災内容: 堤防天端亀裂 L=650m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約17,600m³
シート張 約12,000m²
- ・ 着手日: 平成23年3月15日
- ・ 完了日: 平成23年3月30日13時工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

33 地先名: 茨城県ひたちなか市三反田地先
河川名: 那珂川(左岸5.5k~7.0k)

平成23年 3月31日 14:00現在



被災状況



- ・ 被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=1,365m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約27,400m³
張芝 約14,200m²
- ・ 着手日: 平成23年3月20日
- ・ 工事期間: 10日間程度
- ・ 現在の状況: 掘削工、表土剥ぎ施工中




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

34 地先名: 茨城県水戸市東大野地先
河川名: 那珂川(右岸7.2k~7.3k)

平成23年 3月29日 20:00完了

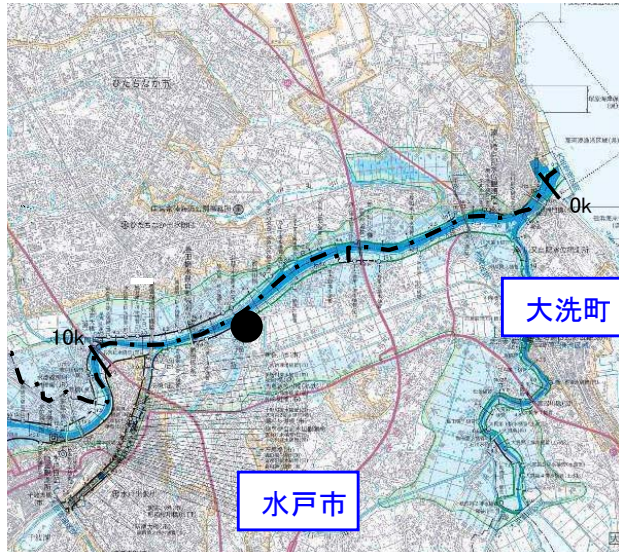

- ・ 被災内容: 堤防川表亀裂 L=150m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約2,000m³
シート張 約1,400m²
- ・ 着手日: 平成23年3月15日
- ・ 完了日: 平成23年3月29日20時工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

35 地先名: 茨城県水戸市若宮地先
河川名: 那珂川(右岸9.2k~9.6k)

平成23年 3月28日 19:30完了




- ・ 被災内容: 堤防天端沈下 L=430m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約3,700m³
シート張 約3,500m²
- ・ 着手日: 平成23年3月15日
- ・ 完了日: 平成23年3月28日19:30工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

36 地先名: 茨城県水戸市根本町地先
河川名: 那珂川(右岸13.0k~13.1k)

平成23年 3月26日 17:00完了

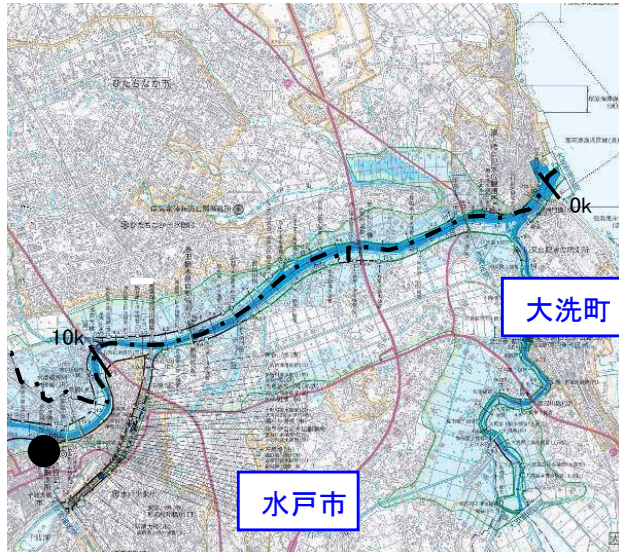

被災状況

- 被災内容: 堤防亀裂 L=165m
- 対策工法: 盛換工法 約3,100m³
張芝 約2,440m²
- 着手日: 平成23年3月16日
- 完了日: 平成23年3月26日17時工事完了




完了

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

37 地先名: 茨城県常陸大宮市小場地先
河川名: 那珂川(左岸30.0k~31.0k)

平成23年 3月19日 5:40完了

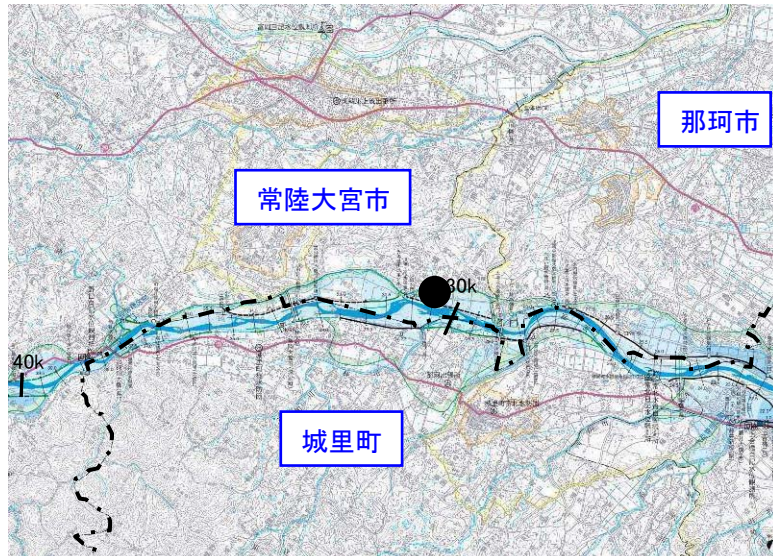

- ・被災内容: 堤防亀裂 L=1,000m
- ・対策工法: 盛換工法 約3,800m³
- ・着手日: 平成23年3月15日
- ・完了日: 平成23年3月19日5時40分工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

38 地先名: 茨城県東茨城郡茨城町下石崎地先
河川名: 那珂川 湊沼川(左岸7.6k~8.0k)

平成23年 3月31日 14:00現在




- ・ 被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=387m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約8,100m³
シート張 約3,300m²
ブロックマット 約2,400m²
- ・ 着手日: 未定
- ・ 工事期間: 18日間程度
- ・ 現在の状況: 転落防止柵撤去中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

39 地先名: 茨城県那珂市本米崎地先
河川名: 久慈川(右岸6.8k~7.0k)

平成23年 3月29日 10:30完了

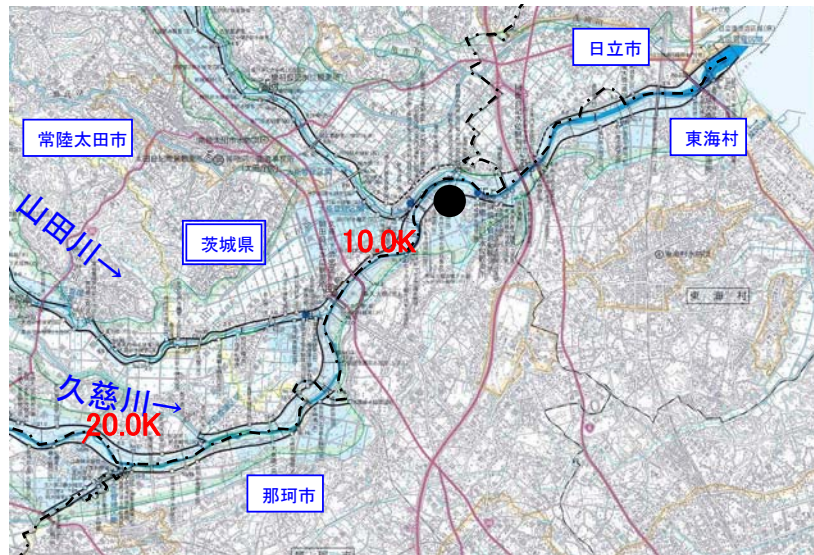

- ・ 被災内容: 堤防沈下 L=171m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約3,200m³
シート張 約4,900m²
- ・ 着手日: 平成23年3月16日
- ・ 完了日: 平成23年3月29日10:30工事完了




東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)


40

地先名: 茨城県常陸太田市栗原地先
河川名: 久慈川(左岸14.0k~14.6k)

平成23年 3月31日 6:00完了

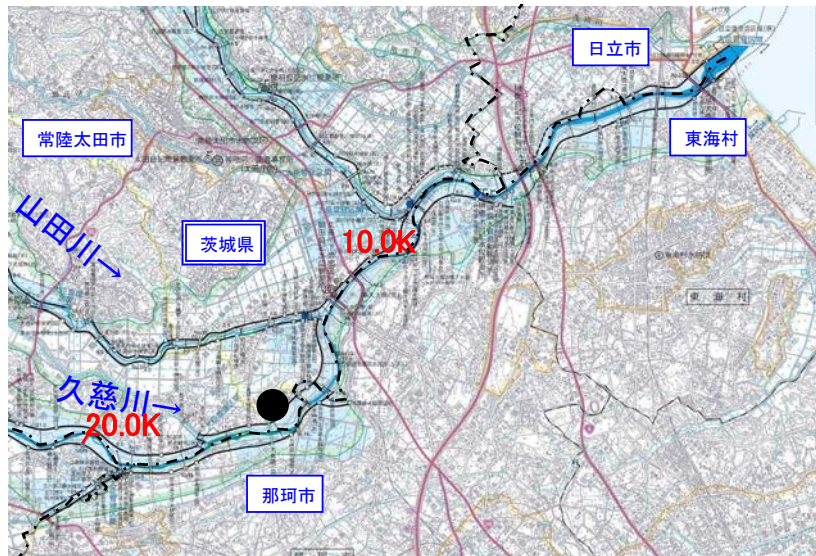


- ・ 被災内容: 堤防天端沈下・亀裂 L=130m
- ・ 対策工法: 盛換工法 約1,800m³
シート張 約1,300m²
- ・ 着手日: 平成23年3月16日
- ・ 完了日: 平成23年3月31日6時工事完了

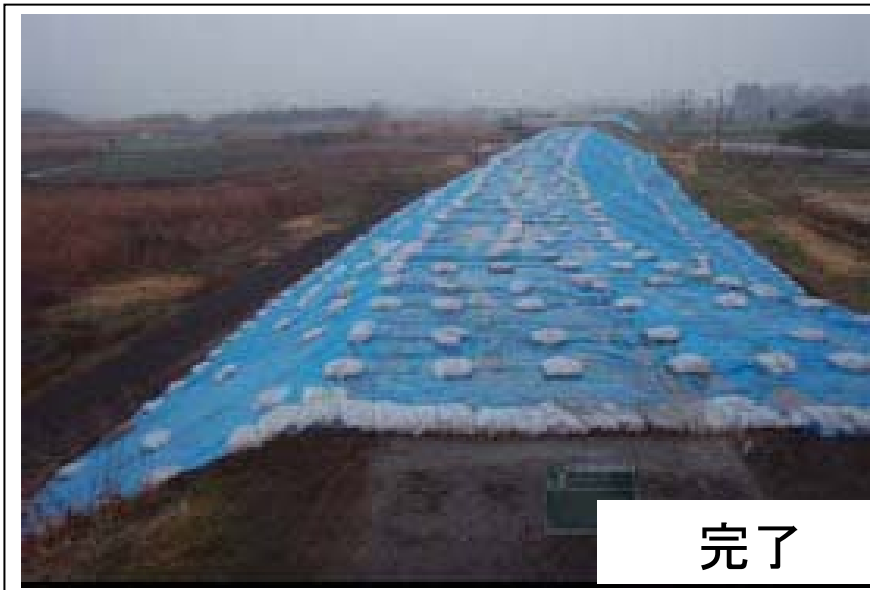

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

41 地先名: 茨城県常陸太田市栗原地先
河川名: 久慈川(左岸15.0k~15.2k)

平成23年 3月31日 14:00現在

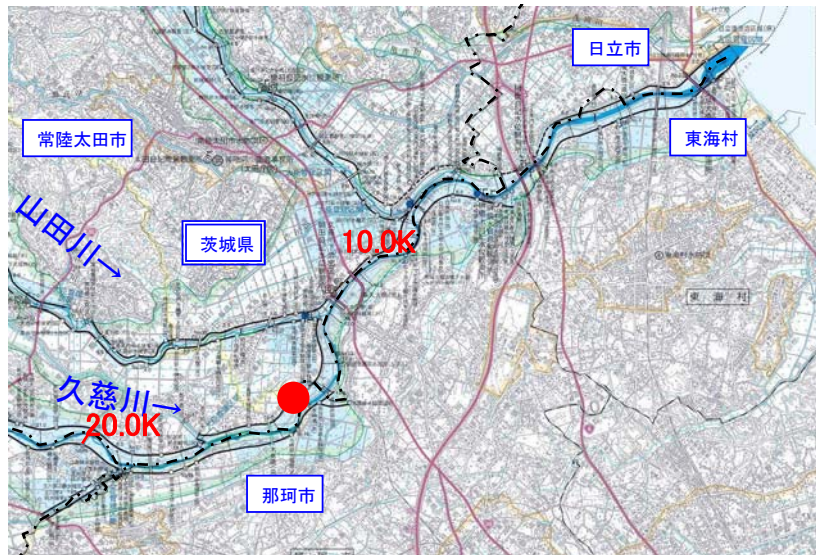

被災状況



- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=115m
- ・対策工法: 盛換工法 約1,500m³
シート張 約1,300m²
ブロックマット 約700m
- ・着手日: 平成23年3月22日
- ・工事期間: 8日間程度
- ・現在の状況: 掘削工施工中
盛土工施工中




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

42 地先名: 茨城県常陸太田市小島地先
河川名: 久慈川(左岸16.5k~16.9k)

平成23年 3月28日 8:00完了

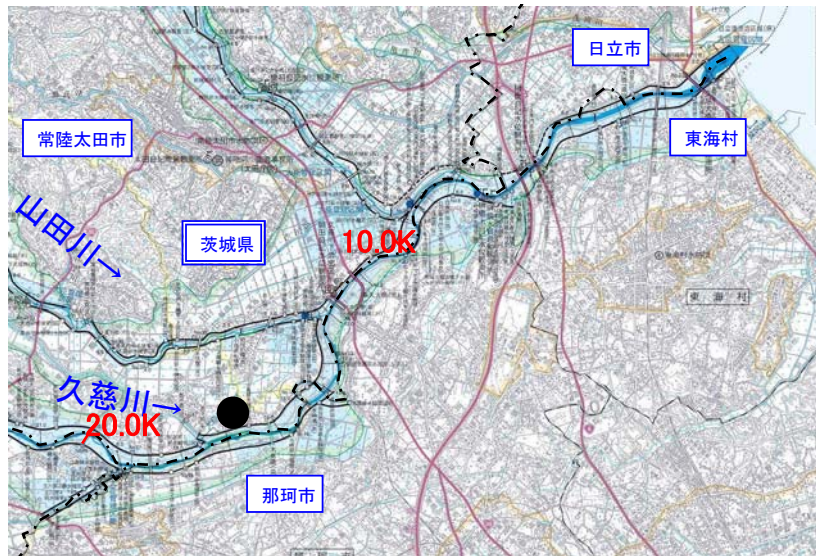

被災状況



- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=400m
- ・復旧工法: 盛換工法 約5,300m³
シート張 約2,700m²
- ・着手日: 平成23年3月20日
- ・完了日: 平成23年3月28日8時工事完了


完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

43 地先名: 茨城県那珂市鹿島地先
河川名: 久慈川(右岸17.5k~18.6k)

平成23年 3月31日 14:00現在

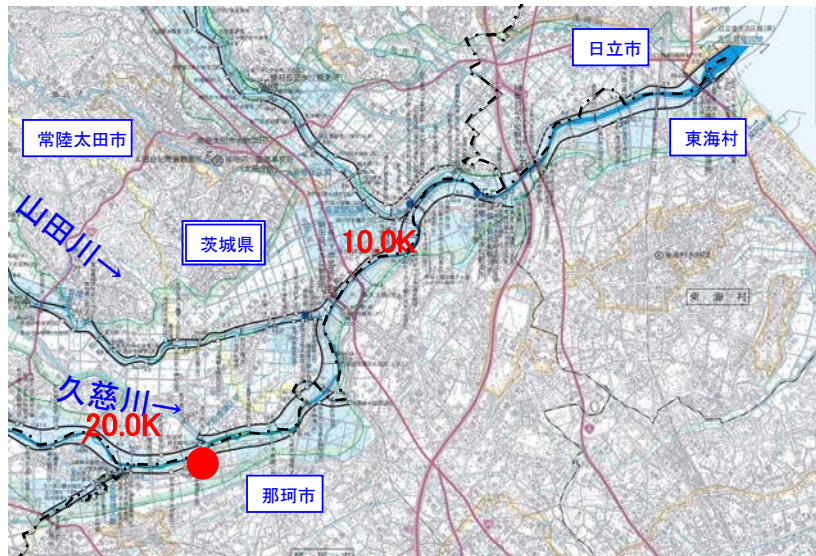

被災状況

- ・被災内容: 堤防天端沈下・亀裂 L=1,241m
- ・対策工法: 盛換工法 約17,300m³
シート張 約11,900m²
- ・着手日: 平成23年3月16日
- ・工事期間: 15日間程度
- ・現在の状況: 掘削工施工中
盛土工施工中




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

44 地先名: 茨城県常陸太田市松栄町地先
河川名: 久慈川(左岸18.3k~18.6k)

平成23年 4月3日15:00完了

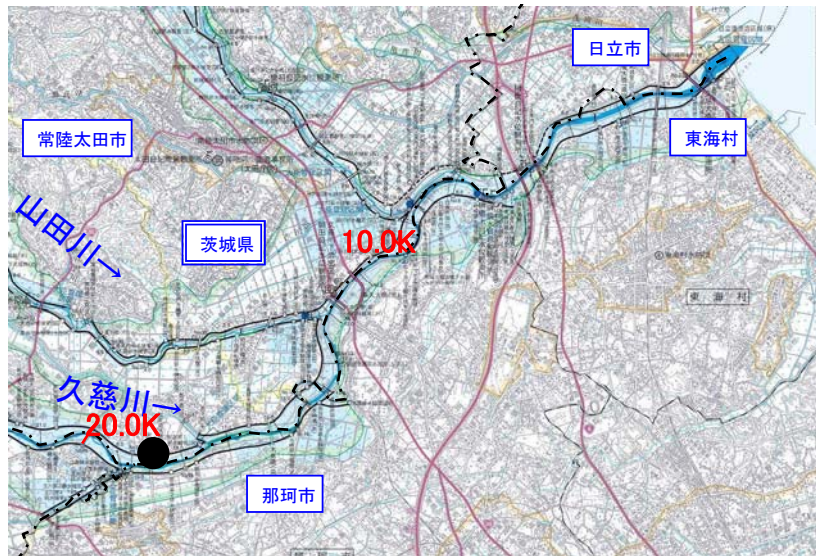


- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=296m
- ・対策工法: 盛換工法 約5,900m³
シート張 約3,700m²
- ・着手日: 平成23年3月25日
- ・完了日: 平成23年4月3日15時工事完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

45 地先名: 茨城県常陸大宮市下岩瀬地先
河川名: 久慈川(右岸19.8k~19.9k)

平成23年 3月31日 6:00完了

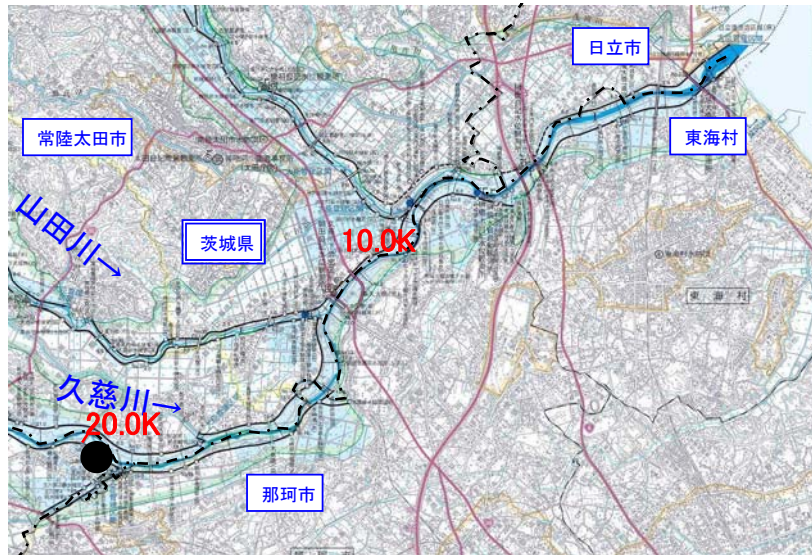

被災状況



- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=150m
- ・対策工法: 盛換工法 約1,300m³
シート張 約1,300m²
- ・着手日: 平成23年3月20日
- ・完了日: 平成23年3月31日6時工事完了




完了

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

46 地先名: 茨城県常陸大宮市富岡地先
河川名: 久慈川(左岸24.0k~25.0k)

平成23年 3月31日 14:00現在

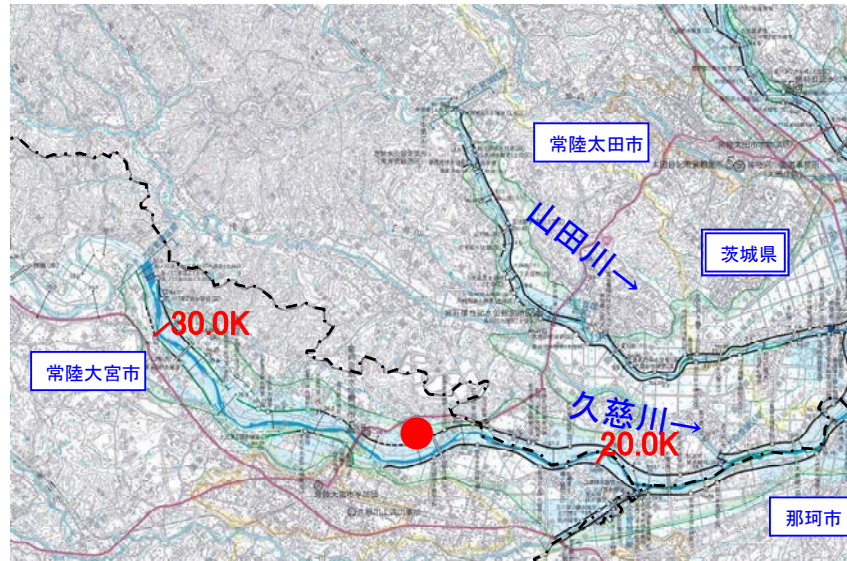


- 被災内容: 堤防天端亀裂 L=955m
- 対策工法: 盛換工法 約6,900m³
張芝 約2,300m²
- 着手日: 平成23年3月15日
- 工事期間: 14日間程度
- 現在の状況: 掘削工完了
盛土工施工中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

47 地先名: 茨城県常陸太田市藤田町地先
河川名: 久慈川 山田川(左岸3.5k~3.7k)

平成23年 3月31日 14:00現在

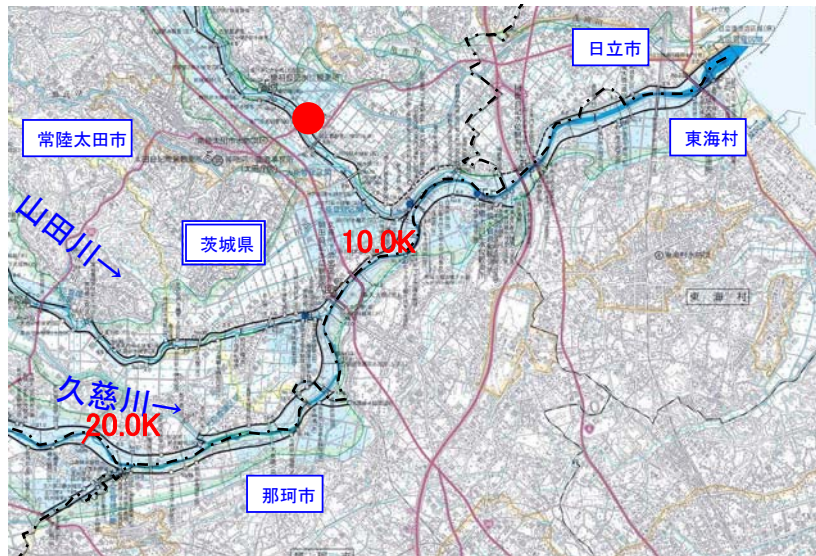

被災状況



- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=108m
- ・対策工法: 盛換工法 約2,100m³
シート張 約1,730m²
ブロックマット 約490m²
- ・着手日: 平成23年3月25日
- ・工事期間: 10日間程度
- ・現在の状況: 舗装版撤去、表土剥ぎ完了
掘削工、盛土工施工中


進捗状況



東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

48 地先名: 茨城県常陸太田市久米町地先
河川名: 久慈川 山田川(左岸6.5k~6.9k)

平成23年 3月30日 6:00完了

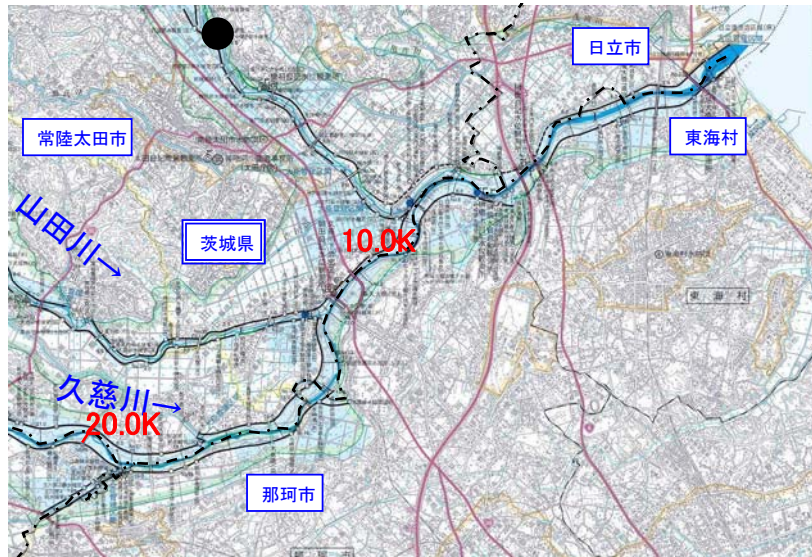

被災状況



- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=420m
- ・対策工法: 盛換工法 約4,500m³
シート張 約3,600m²
ブロックマット約500m²
- ・着手日: 平成23年3月20日
- ・完了日: 平成23年3月30日6時工事完了




進捗状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川における緊急対策実施状況(速報版)

49 地先名: 茨城県常陸太田市落合町地先
河川名: 久慈川 里川(左岸-0.8k~-0.7k)

平成23年 3月31日 14:00現在

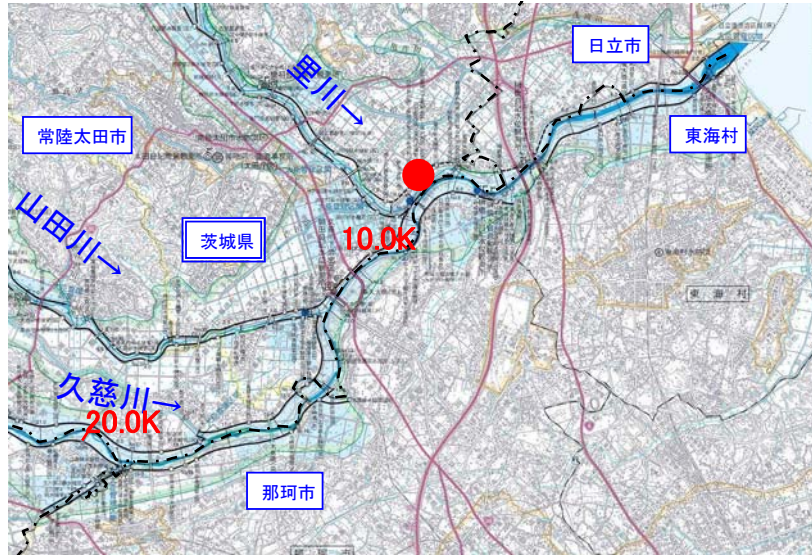

被災状況



- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=103m
- ・対策工法: 盛換工法 約1,800m³
シート張 約900m²
ブロックマット 約1,100m²
- ・着手日: 平成23年3月25日
- ・工事期間: 8日間程度
- ・現在の状況: クラック調査完了
舗装版撤去完了
掘削工施工中



進捗状況
