

大間々砂防通信

OMAMA - SABO TIMES

国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 大間々砂防出張所 編集・発行
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1204 Tel 0277-72-1664 Fax 0277-72-1669
<http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/>

平成26年(2014)

7 月

【第2号】



リアルタイムの雨量と
水位を知りたい時は、
コチラ↓↓↓
<http://i.river.go.jp/>

川の防災情報

降ったり止んだりの断続的な雨で、地盤がかなり緩んでいる可能性があります。裏山などに近づく際は、土砂災害に、より一層の警戒を！

順調な進捗 関守床固群整備事業



写真-1 一部完成した床固を確認する須藤出張所長(左)と萬屋建設㈱高橋現場代理人(右)=6月16日午後

着工から丸3年
この関守床固群整備事業は、「H23関守床固群工事」による現場着手から、今年の7月で丸3年となりました。これまで工事受注者さんと共に、数多の自然と戦いながら、日々、完成目指して事業を進めて参りましたが、これも全て地元の皆様のご協力があったからこそだと考えています。つきましては、今後とも変わらぬご協力をお願いいたします。



写真-2 近隣に住む方(右)と意見交換する須藤所長(中央)=6月

地域と共に作る砂防施設

地元の方との交流を大事に
関守床固群は、みどり市東町荻原地区の住宅地に隣接する河川内に計画されており、工事中は元より、工事完成後の維持管理についても、地元の方々のコミュニケーションは必要不可欠であるため、出張所でも、日頃から出来る限りの意見交換に努めています。

今年4基目に着手

関守床固群は、5基の床固と3基の帯工の計8基の砂防施設で構成されており、このうち2基の床固と1基の帯工が完成済みです。
現在は、「H25関守一号床固工事」が施工中であり、予定どおり7月末で竣工した場合、3基目の床固が完成となります。
そして今年の5月末、新たに「H25関守三号床固工事」が契約となりました。
この工事が順調に行けば、今年度末には、更に1基の床固が追加され、床固+帯工全て含めて、計画8基のうち、半数を超える5基が完成となる予定です。

合計8基の計画のうち
3基完成、1基施工中

関守床固群 全体計画図



合同現地調査の実施

5月、みどり市役所大間々支所建設課の方々と合同の現地調査を行いました。
当日は、実際に現地に赴き、渡良瀬川の整備等に関して、お互い様々な意見交換を行いました。
また、みどり市職員の方々からは、大間々様の様々な歴史についてご教授いただき、より一層、この土地に対する理解を深めた出張所職員一同でした。



写真-3 現地調査の様子Ⅱ5月

6月19日午後、関東地方整備局の稗田副局長が大間々砂防出張所管内の「H25日暮沢二号砂防堰堤工事」の現場を視察に来まし



写真-5 同工事現場=同日午後



写真-6 同工事現場=同日午後

た。
当日は、連日の曇天が嘘のような好天に恵まれ、絶好の現場視察日和となりました。

視察の最後には、副局長から、出張所職員への激励の言葉をいただき、あらためて職務へ取り組む姿勢を新たにしたいと申し述べた。



写真-7 同工事現場=同日午後

桐生市川内町地先の工事現場へ 日暮沢二号砂防堰堤

写真-4 工事現場にて副局長(左)と出張所長(中央)
=6月19日午後

稗田副局長による現場視察

ここ最近、山林火災等も多いため、須藤出張所長は、職員を連れ立ち、現地の安全確認に向かいました。
当日の天候は小雨でしたが、現地では何かを燃やしたような残り火が未だに燦々としており、万が一を考え、消火することにしました。
ところが、手近なところに水が流れておらず、離れた場所からバケツリレーすること数十分、やっとのことで消火を完了することが出来ました。


5月26日、大間々砂防出張所管内の砂防施設等を監視しているカメラに、河床から立ち昇る煙が確認されました。



写真-8 小中川=5月26日午後

河川内に立ち昇る煙？
バケツリレーで消火作業

大間々砂防出張所管内 工事位置図

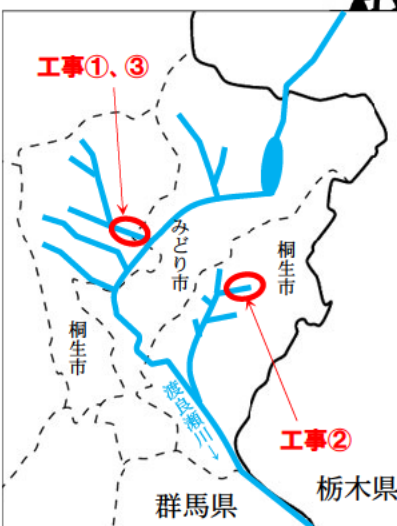

- 工事①** H25関守一号床固工事
工期…H25年7月31日～H26年7月31日
契約額…1億4264万7千円(税込)
受注者…萬屋建設(株)
箇所…桐生市黒保根町水沼～みどり市東町荻原
進捗率…89.5%
- 工事②** H25日暮沢二号砂防堰堤工事
工期…H25年11月20日～H26年12月6日
契約額…1億6016万4千円(税込)
受注者…池下工業(株)
箇所…桐生市川内町
進捗率…37.9%
- 工事③** H25関守三号床固工事
工期…H26年5月27日～H27年2月27日
契約額…1億4094万円(税込)
受注者…萬屋建設(株)
箇所…桐生市黒保根町～みどり市東町
進捗率…1.3%



工事情報

大間々砂防出張所管内における6月25日現在の工事情報を掲載させていただきます。

