


応急復旧工事の進捗状況について

平成27年9月11日 16時現在

- 応急復旧工事として、現地対策本部の指揮により作業ヤードの造成を実施中。(写真参照)
- 本日中に作業ヤードの造成を完了させ、根固めブロック等を投入予定。
- 進捗率 (9月11日 16時現在)

退避場・作業ヤード造成	80.0% (9月10日着手)
荒締切工 ※着手より荒締切工までを1週間程度で完了予定	0.0% (9月11日着手予定)
鋼矢板による締切工 ※荒締切工完了より1週間程度で完了予定	0.0% (未着手)

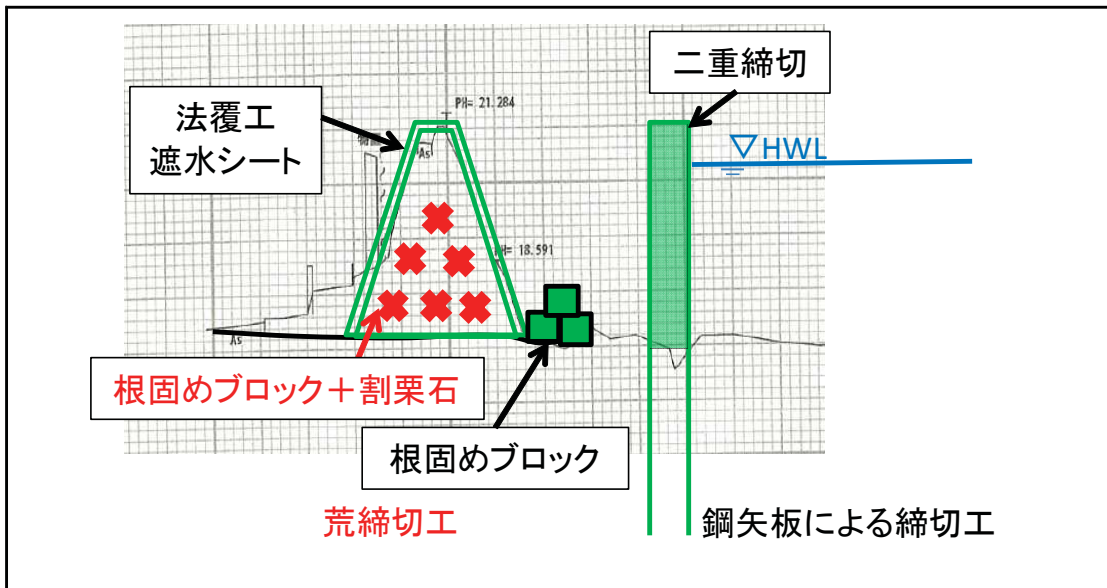

作業ヤードの造成



現地対策本部

