

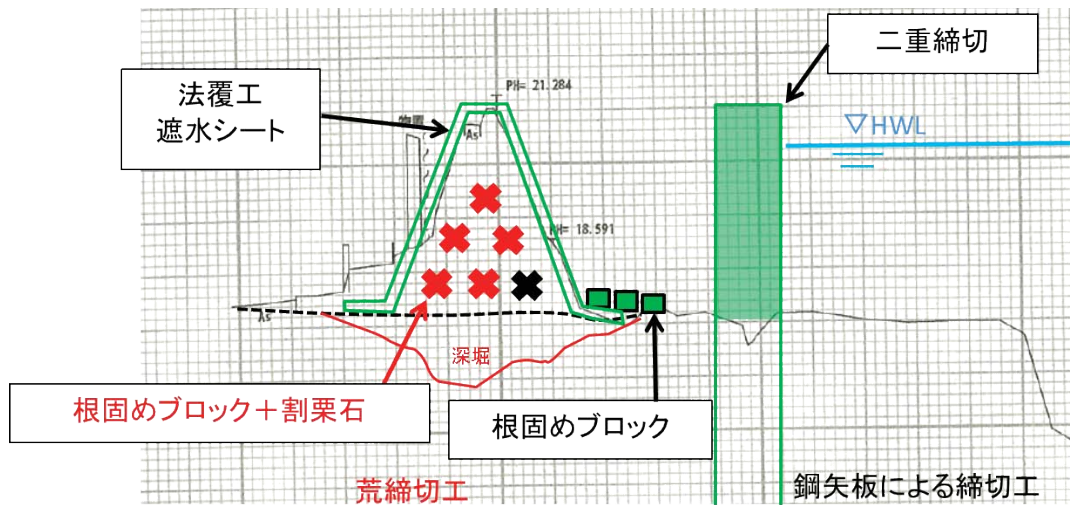
## 応急復旧工事の進捗状況について

平成27年9月13日 16時現在

- 現地での測量の結果、破堤延長は201mに修正。
- 9月11日22時より根固めブロック等を投入中。(写真参照)
- 引き続き、24時間体制で根固めブロック等を投入予定。

## ● 進捗率 (9月13日 16時現在)

退避場・作業ヤード造成 完了 (9月10日着手～9月11日完了)

荒締切工 5.0% (9月11日着手)  
※着手より荒締切工までを1週間程度で完了予定鋼矢板による締切工 0.0% (未着手)  
※荒締切工完了より1週間程度で完了予定

応急復旧工事実施状況（9月13日 9時頃）



上流側

根固ブロックの搬入



下流側

ダンプトラックによる石材（割栗石等）の運搬



応急復旧工事実施状況（9月13日 16時頃）



上流側

根固ブロックの搬入



排水ポンプ車による工事現場内の排水
