

R4年9月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 2 武智川下流床固群工事（施工者：木下建設（株））

場所：長野県諏訪郡富士見町富士見地先（施工場所はこちらをクリック）

(<https://maps.gsi.go.jp/vector/#15.414/35.897067/138.229089/&ls=vstd&disp=1&d=l>)

工期：R2年8月8日～R5年1月31日



下流上空より 施工箇所（全景）を望む



左岸より施工箇所を望む
（第7床固工（側壁）、橋台工（A1橋台））

武智川下流床固群のうち、床固工、帯工、護岸及び人道橋を施工し、土砂・洪水を安全に流下させ、土砂災害を防止する工事。

現在、右岸側の第7床固工（側壁）、橋台工（A1橋台）を実施中。

R4年9月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 3 黒川第五砂防堰堤工事（施工者：（株）早野組）

場所：山梨県北杜市白州町上教来石地先（施工場所はこちらをクリック）

（<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.813063/138.229251/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

工期：R3年 8月3日～R4年9月30日



【完成】下流より本堰堤を望む（コンクリート堰堤工）



【完成】下流 左岸上部より本堰堤を望む
（コンクリート堰堤工）

釜無川右支黒川において、土砂流出に伴う下流域での土砂・洪水氾濫の被害を防止・軽減するため、砂防堰堤を施工する工事。工事完成。

R4年9月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 3 中島砂防堰堤右岸斜面对策工事（施工者：（株）芦沢組土木）

場所：山梨県北杜市白州町鳥原地先（施工場所はここをクリック）

（<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.821754/138.204768/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

工期：R4年5月10日～R5年1月31日



上空より施工箇所を望む



施工箇所上部より施工箇所を望む

中島砂防堰堤の改築にあたり、支障となる右岸崩壊地からの落石対策を行う斜面对策工事。前年度工事から継続で現在、落石防止網工により斜面对策を実施中。

R4年9月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 3 洞ヶ沢第二砂防堰堤改築工事（施工者：松本土建（株））

場所：（施工場所はここをクリック）

（<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.850561/138.220024/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

工期：R4年6月1日～R5年3月24日



上流上空より施工箇所を望む



←右岸より左岸を望む

左岸より右岸を望む→



既設洞ヶ沢第二砂防堰堤の副堰堤下流側に腹付けコンクリートで補強し、改築する工事。前年度工事からの継続で、洪水・土石流氾濫被害を防止・軽減する。現在、側壁工を実施中。

R4年9月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 3 釜無川上流砂防施設工事（施工者：藤森土木建設（株））

場所：長野県諏訪郡富士見町落合地先（施工場所はこちらをクリック）

A地区（<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.806455/138.195562/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）


I地区（<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.822798/138.203073/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

J、K地区（<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.818696/138.204414/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

工期：R4年6月14日～R5年1月31日



上空より施工箇所を望む（A地区）

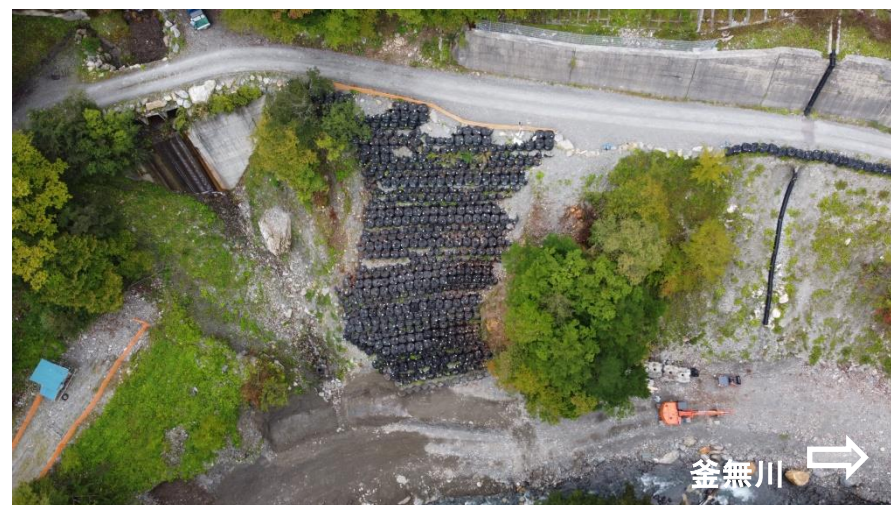

上空より施工箇所を望む（I地区）

令和元年10月の台風による出水で被災した釜無川工事用道路の補修等を実施する工事。
現在、路体盛土工（砂防ソイルセメント）を実施中。

R4年9月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 4 武智川下流床固群工事（施工者：(株)岡谷組）

場所：長野県諏訪郡富士見町富士見地先（施工場所はここをクリック）

(<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.898567/138.227921/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>)

工期：R4年7月27日～R6年3月25日



上空より施工箇所を望む



下流より施工箇所を望む

武智川下流床固群のうち、床固工、帯工及び護岸を施工し、土砂・洪水を安全に流下させ、土砂災害を防止する工事。現在、工事着手に向け、除草、測量など実施中。
