

R 4 年10月時点 工事進捗状況：早川出張所

1. R 2 内河内第五砂防堰堤工事（施工者：株式会社早野組）
場所：早川町新倉地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.491442/138.299954/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 2 年 1 0 月 3 日～R 6 年 9 月 9 日



右岸側を望む



左岸側を望む

砂防堰堤により土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。

現在、本堰堤の左岸及び右岸を施工中。

R 4 年10月時点 工事進捗状況：早川出張所

2. R 3 稲又工事用道路工事（施工者：株式会社八木沢興業）

場所：早川町雨畑地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.374958/138.295555/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 4 年6月8日～R 5 年1月31日



根固めブロック作製

砂防堰堤の工事を行うための工事用道路を造ります。
現在、林道通行止めのため一時中止中。

R 4 年10月時点 工事進捗状況：早川出張所

3. R 4 池の沢第三砂防堰堤工事（施工者：株式会社飯塚工業）

場所：早川町赤沢地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.389426/138.369530/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 4 年 7 月 1 3 日～R 5 年 8 月 3 1 日



下流側上空より望む



上流側上空より望む

池の沢砂防堰堤群のうち最上流の砂防堰堤で、土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。

現在仮設工施工中。

R4年10月時点 工事進捗状況：早川出張所

4. R4塩島沢砂防堰堤工事（施工者：株式会社小林建設所）

場所：南巨摩郡早川町大原野地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.467224/138.343062/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R4年8月18日～R5年3月24日



【上流側より側壁箇所を望む】（側壁設置箇所）



【上流側より施工箇所を望む】（堰堤設置箇所）

早川左支塩島沢において、土砂災害防止を目的とした砂防堰堤と側壁を設置する工事を行っています。

現在、仮設工を実施中。11月より本体工事に着手します。

R4年10月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

1. R3野呂川第三砂防堰堤改築工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.659162/138.298001/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1jOh0kOlOuOtOzOrOsOmOf1>

工期：R4年5月13日～R5年1月31日



【下流側より施工箇所を望む】



【上流側より施工箇所を望む】

既設の砂防堰堤を鋼製透過型砂防堰堤に改築し、土砂捕捉機能の向上と流木災害を防止するための工事を行っています。

透過型砂防堰堤にするために必要な、鋼製枠の設置が完了しました。
11月より本体のコンクリートを打設する予定です。

R4年10月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

2. R4荒川工事用道路工事（施工者：湯澤工業株式会社）


場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.644180/138.278207/&base=ort&ls=ort&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R4年7月13日～R5年12月25日



【橋台施工状況】

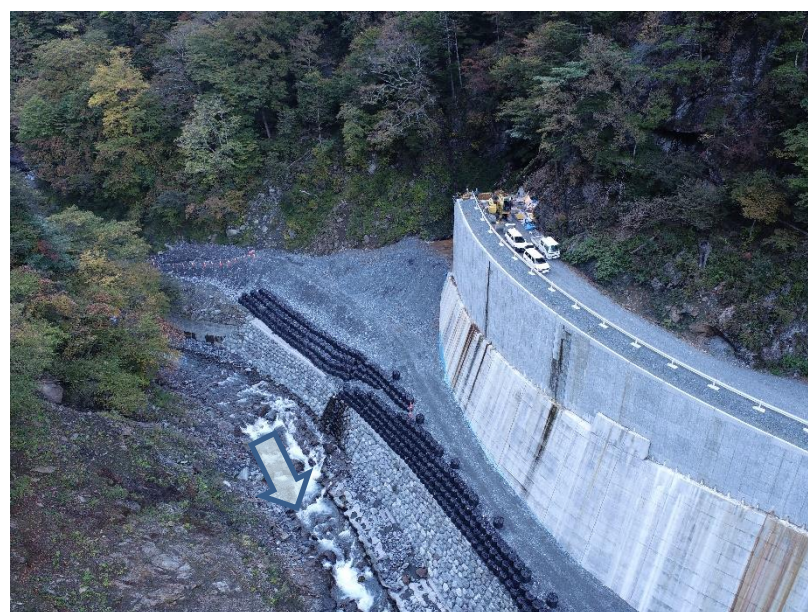

【起点側より施工箇所(下流側より上流側)を望む】

早川右支荒川に、砂防堰堤を整備するための工事用道路を設置する工事を行っています。
現在、橋台施工を行っています。
