

R5年1月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 2 武智川下流床固群工事（施工者：木下建設（株））

場所：長野県諏訪郡富士見町富士見地先（施工場所はここをクリック）

（<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.897064/138.229090/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

工期：R2年8月8日～R5年3月24日



上空より人道橋より上流を望む



下流左岸より流路護岸工 ブロック積擁壁工 施工箇所を望む

武智川下流床固群のうち、床固工、帯工、護岸及び人道橋を施工し、土砂・洪水を安全に流下させ、土砂災害を防止する工事。

現在、右岸側の流路護岸工 ブロック積擁壁工を実施中。

R5年1月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 3 中島砂防堰堤右岸斜面对策工事（施工者：（株）芦沢組土木）

場所：山梨県北杜市白州町鳥原地先（施工場所はここをクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.821754/138.204768/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R4年5月10日～R5年1月31日



上空より施工箇所（全景）を望む



上空より施工箇所（近景）を望む

中島砂防堰堤の改築にあたり、支障となる右岸崩壊地からの落石対策を行う斜面对策工事。前年度工事から継続。工事完成。

R5年1月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 3 洞ヶ沢第二砂防堰堤改築工事（施工者：松本土建（株））


場所：（施工場所はここをクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.850561/138.220024/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R4年6月1日～R5年3月24日



上流上空より施工箇所を望む

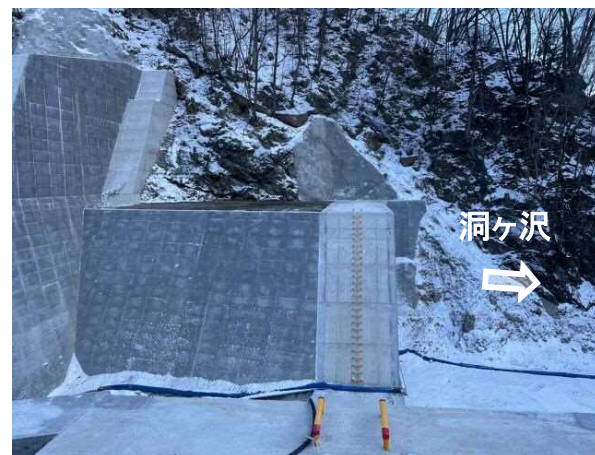

←右岸より左岸を望む

左岸より右岸を望む→



既設洞ヶ沢第二砂防堰堤の副堰堤下流側に腹付けコンクリートで補強し、改築する工事。前年度工事からの継続で、洪水・土石流氾濫被害を防止・軽減する。現在、副堤の腹付け作業が完了し、側壁工背面の埋め戻し、護床工を実施中。

R5年1月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 3 釜無川上流砂防施設工事（施工者：藤森土木建設（株））

場所：長野県諏訪郡富士見町落合地先（[施工場所はこちらをクリック](#)）

A地区（<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.806455/138.195562/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

I地区（<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.822798/138.203073/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

J、K地区（<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.818696/138.204414/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

工期：R4年6月14日～R5年3月15日



上空より施工箇所を望む（A地区）



↑ 上空より施工箇所を望む（I地区：中島砂防堰堤下流）



↑ 上空より施工箇所を望む（J K地区：中島砂防堰堤上流）

令和元年10月の台風による出水で被災した釜無川工事用道路の補修等を実施する工事。
現在、盛土工（A地区・I地区）と擁壁工（A地区）の作業が完了し、根固めブロック工（I地区、JK地区）を実施中。

R5年1月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 4 武智川下流床固群工事（施工者：(株)岡谷組）

場所：長野県諏訪郡富士見町富士見地先（施工場所はここをクリック）

(<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.898567/138.227921/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>)

工期：R4年7月27日～R6年3月25日



下流上空より施工箇所を望む



上流上空より施工箇所を望む

武智川下流床固群のうち、床固工、帯工及び護岸を施工し、土砂・洪水を安全に流下させ、土砂災害を防止する工事。現在、左岸側の第10床固工（本堤、副堤）を実施中。

R5年1月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

R 4 空谷砂防堰堤改築（2期）工事（施工者：(株)岡谷組）

場所：長野県諏訪郡富士見町富士見地先 山梨県北杜市白州町下教来石地先（施工場所はこちらをクリック）
(<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.831836/138.207471/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>)

工期：R4年11月21日～R5年12月25日



【着手前】下流より本堰堤を望む（コンクリート堰堤工）



【着手前】下流 上空より本堰堤を望む
（コンクリート堰堤工）

既設空谷砂防堰堤に嵩上げ及びアンカー工を設置し、改築する工事。前年度から継続施工し、洪水・土砂氾濫被害を防止・軽減する。現在、工事着手に向け測量等を実施中。
