

## R5年10月時点 工事進捗状況：早川出張所

1. R 2内河内第五砂防堰堤工事（施工者：株式会社早野組）  
場所：早川町新倉地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.491442/138.299954/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 2年10月3日～R 6年9月9日



左岸側より望む



上流側より望む

砂防堰堤により土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。

現在、本堰堤は完了し水叩工右岸側掘削完了。

## R5年10月時点 工事進捗状況：早川出張所

2.R 4 池の沢第三砂防堰堤工事（施工者：株式会社飯塚工業）

場所：早川町赤沢地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.389426/138.369530/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 4年7月13日～R 5年12月25日



下流側上空より望む



上流側上空より望む

池の沢砂防堰堤群のうち最上流の砂防堰堤で、土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。

現在、右岸側副堰堤袖部・側壁工・水叩工を施工中。

R 5年10月時点 工事進捗状況：早川出張所

3.R 4春木川崩壊地対策工事（施工者：ライト工業株式会社）

場所：早川町赤沢地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.375553/138.375759/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1GSI>

工期：R 4年8月29日～R 5年12月25日



対岸より望む



雪害防止網工(厚ネット)完了

赤丸部分今回施工範囲

早川右支川の春木川左岸の斜面において、崩壊の抑制・拡大防止を目的として山腹工を施工する工事行っています。

現在、雪害防止網工(厚ネット)完了し仮設撤去施工中。

R 5 年10月時点 工事進捗状況： 早川出張所

4.R 4 稲又第三砂防堰堤改築（1期）工事（施工者：株式会社八木沢興業）

場所：早川町雨畑地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.376060/138.290191/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 5 年4月1日～R 6 年2月2日



右岸側より施工箇所を望む



起点側より施工箇所を望む

稲又第三砂防堰堤の改築工事を行うための仮排水路を造る工事です。  
現在、工事用道路施工中。

## R 5年10月時点 工事進捗状況：早川出張所

5.R 4 春木川流域砂防設備工事（施工者：井上建設株式会社）

場所：早川町赤沢地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.393572/138.376515/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.371704/138.381300/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 5年5月8日～R 6年3月25日



仲島工区 下流側上空より望む



大春木工区 下流側上空より望む

本工事は、早川右支の春木川筋に設置されている既設の仲島砂防堰堤について、流木災害を防止するために、流木捕捉工を設置する工事 及び早川右支川の春木川筋における既設の大春木床固群について、流路機能を維持向上させるため、改築を実施する工事です。現在、仲島工区は堰堤左岸側護岸施工中。大春木工区は導流堤築堤盛土(砂防ソイルセメント)は完了し管理用道路施工中。

R5年10月時点 工事進捗状況：早川出張所

6. R5 塩島沢第二砂防堰堤工事（施工者：加藤建設株式会社）

場所：南巨摩郡早川町大原野地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.467224/138.343062/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R5年7月12日～R6年3月25日



上流側より施工箇所を望む



左岸側より施工箇所を望む

本工事は、早川左支塩島沢において、土砂災害防止を目的とした砂防堰堤を施工する工事です。  
現在、堰堤工施工中。

## R5年10月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

### 1. R4荒川工事用道路工事（施工者：湯澤工業株式会社）


場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.644180/138.278207/&base=ort&ls=ort&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R4年7月13日～R5年12月25日



【下流側上空より施工箇所を望む】

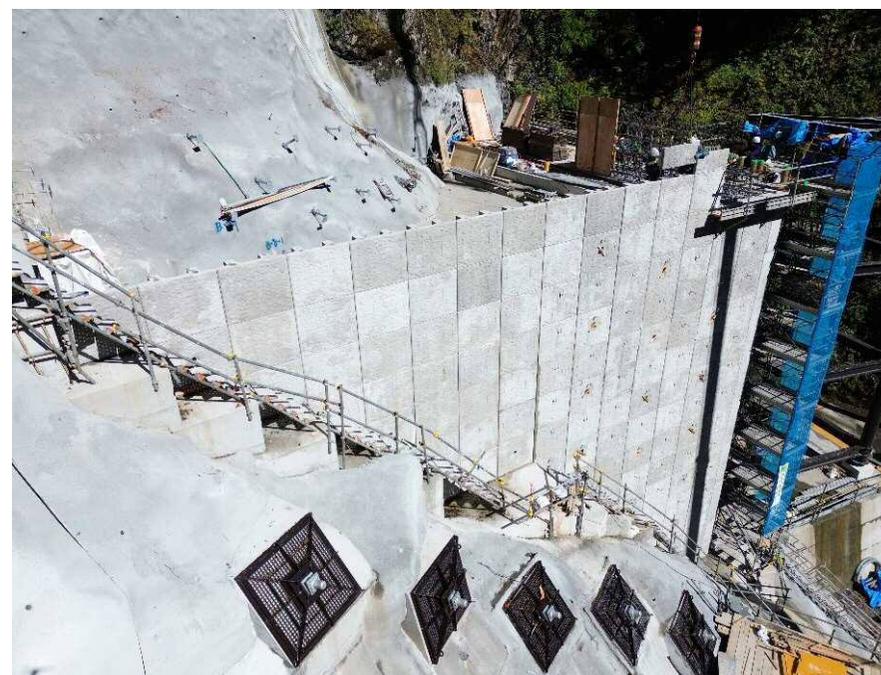

【軽量盛土工 施工状況（壁面材設置）】

早川右支荒川に、砂防堰堤を整備するための工事用道路を設置する工事を行っています。軽量盛土工の壁面材設置とエアミルク打設、橋台の施工が完了しました。現在、グラウンドアンカー工を施工中です。

# R5年10月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

## 2. R4広河内工事用道路他工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590048/138.283356/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>  
<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590031/138.299879/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R5年4月1日～R6年12月10日

【工事用道路整備箇所】



【右岸側上空より施工箇所を望む】

【堰堤整備箇所】



【下流側上空より施工箇所を望む】

継続中であった砂防堰堤の整備と、上流域の砂防堰堤を整備するための工事用道路を設置する工事を行っています。

工事用道路設置個所のモルタル吹付が完了しました。

当月より堰堤の整備を開始し、工事用道路の迂回路整備を行っています。

## R5年10月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

### 3. R4野呂川第三砂防堰堤改築工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.659162/138.298001/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R5年4月1日～R5年12月25日



【下流側上空より施工箇所を望む】



【コンクリート打設 施工状況】

既設の砂防堰堤を鋼製透過型砂防堰堤に改築し、土砂捕捉機能の向上と流木災害を防止するための工事を行っています。

既設堰堤袖部の補強が完了しました。

現在、水通し部の鋼製透過型化の施工を行っています。
