

R 6 年9月時点 工事進捗状況：早川出張所

1. R 2 内河内第五砂防堰堤工事（施工者：株式会社早野組）

場所：早川町新倉地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.484095/138.303891/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 2 年10月3日～R 6 年12月18日



下流側より望む



右岸下流側より望む

砂防堰堤により土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事です。
本堰堤施工中。

R 6 年9月時点 工事進捗状況：早川出張所

2. R 4 稲又第三砂防堰堤改築（1期）工事（施工者：株式会社八木沢興業）

場所：早川町雨畑地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.390082/138.320564/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 5 年4月1日～R 6 年11月30日



根固ブロック製作中



根固ブロック運搬

稲又第三砂防堰堤の改築工事を行うための仮排水路を造る工事です。
工事用道路復旧に使用する根固ブロックを製作運搬中

R 6 年9月時点 工事進捗状況：早川出張所

3. R 6 春木川崩壊地対策工事（施工者：ライト工業株式会社）

場所：早川町赤沢地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.374932/138.373961/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 6 年8月9日～R 7 年12月26日



着工前近景（赤予定箇所）

春木川左岸の斜面において、崩壊の抑制・拡大防止を目的として 法面工を施工する工事です。

着手準備中

R 6 年9月時点 工事進捗状況：早川出張所

4. R6池の沢第二砂防堰堤工事（施工者：植野興業株式会社）

場所：早川町雨畑地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.384537/138.377395/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f2>

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.392531/138.373833/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f2>

工期：R 6 年8月19日～R 7 年10月31日



池の沢着工前（赤予定箇所）



小春木着工前（赤予定箇所）

池の沢第二砂防堰堤の第2副堤・側壁・水叩の施工並びに小春木第二砂防堰堤の水叩の施工を行う工事です。

着手準備中

R6年9月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

1. R 4 広河内工事用道路他工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590048/138.283356/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>
<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590031/138.299879/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 5 年 4 月 1 日～R 6 年 12 月 10 日

【上流工区 工事用道路整備箇所】



【下流側上空より施工箇所を望む】



【鉄筋挿入工施工状況】

継続中であつた砂防堰堤の整備と、上流域の砂防堰堤を整備するための工事用道路を設置する工事を行っています。
鉄筋挿入工を施工しています。

R6年9月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

2. R 5 野呂川第三砂防堰堤改築工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.659162/138.298001/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 6年 4 月1日～R 7年1月24日



【上流側上空より施工箇所を望む】



【下流側上空より管理用道路施工箇所を望む】

土砂捕捉機能の向上と流木災害を防止するために、既設の砂防堰堤を鋼製透過型砂防堰堤に改築する工事と、維持管理に資するための、管理用道路の一部を施工する工事を行っています。管理用道路の基礎設置と石張り工、盛土を施工しています。また9月より砂防堰堤の施工を開始しました。

R6年9月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

3. R 6 木挽崩沢護岸工事（施工者：長田組土木株式会社）

場所：南巨摩郡早川町奈良田（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.582466/138.304460/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 6年9月4日～R 7年6月30日



【下流側上空より施工箇所を望む】



【右岸側上空より施工箇所を望む】

木挽崩沢砂防堰堤下流部の河岸侵食を防ぐため、コンクリート擁壁工及び根固ブロックの設置等の工事を行います。

現在、現場着手の準備をしています。


R6年9月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

4. R 6 荒川工事用道路工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.644180/138.278207/&base=ort&ls=ort&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 6年9月11日～R 7年12月26日

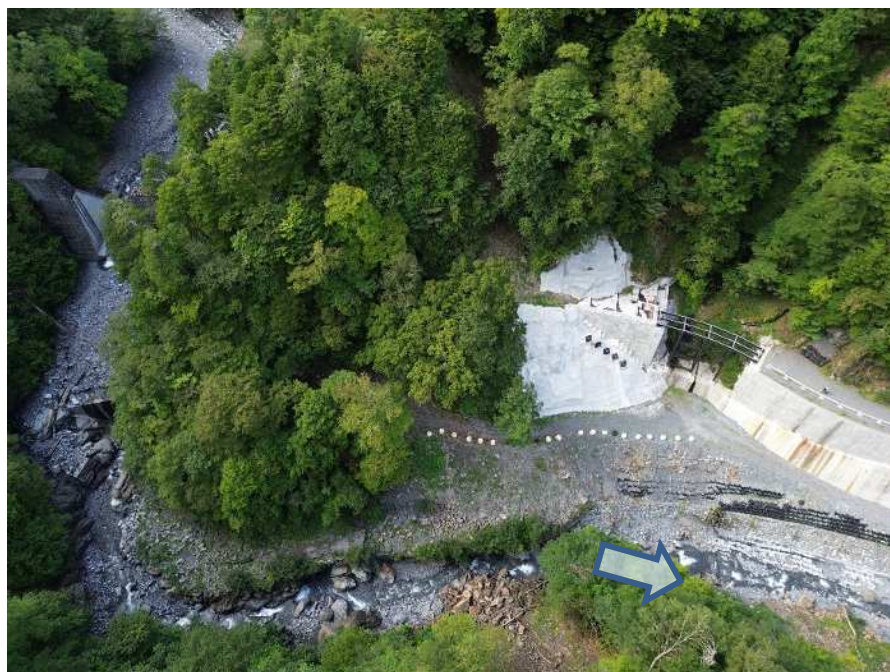

【上空より施工箇所全体を望む】



【上空より上部工施工箇所を望む】

早川右支荒川に、砂防堰堤を整備するための工事用道路を設置する工事を行っています。
現在、現場着手の準備をしています。
