


2026年8月28日・8時時点

シールドマシン1号機 初期掘進の進捗状況


2026年8月28日時点

- 初期掘進（1回目）：回転立坑～本設セグメント8Rまで（①）
- 段取替（1回目）：仮セグメント一部解体。ターンテーブル（上り線側）、No.2スクリーンコンベア、セグメント供給装置、セグメント仮搬送クレーン設置。仮セグメント復旧。（②）
- 初期掘進（2回目）：本設セグメント9R～城神明橋通過まで（③）
- 段取替（2回目）：仮セグメント、反力支保工、土砂圧送設備、マシン受台を撤去。後続台車No.0～3投入、初期掘進用ベルトコンベア、ターンテーブル（下り線側）設置。（④）
- 初期掘進（3回目）：城神明橋～後続台車や土砂搬送設備（ベルコン等）設置延長まで（⑤）
- 段取替（3回目）：初期掘進用ベルトコンベアから本掘進用ベルトコンベアへ切り替え、後続台車No.4～10投入。（⑥）


① 初期掘進（1回目）【完了】

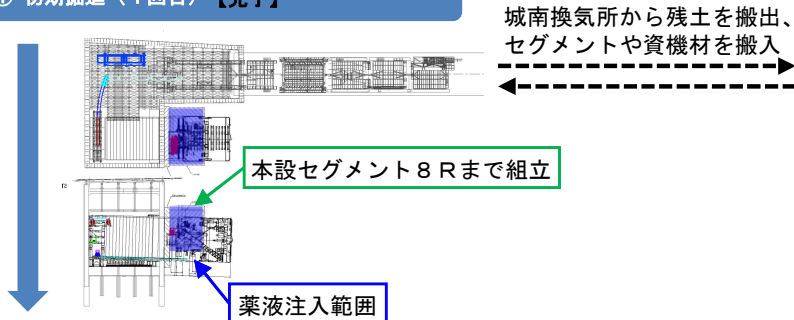

② 段取替（1回目）【完了】

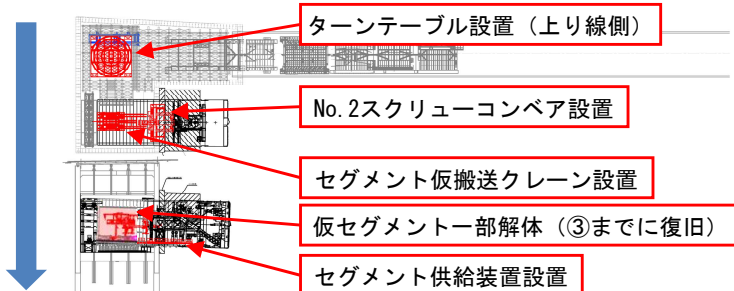


③ 初期掘進（2回目）【完了】

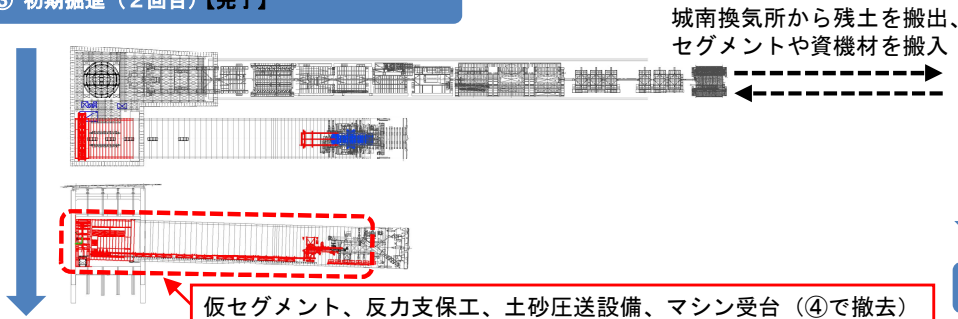


④ 段取替（2回目）


現在ココ

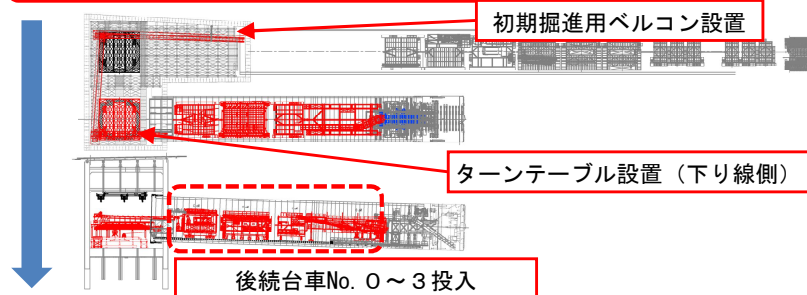

⑤ 初期掘進（3回目）

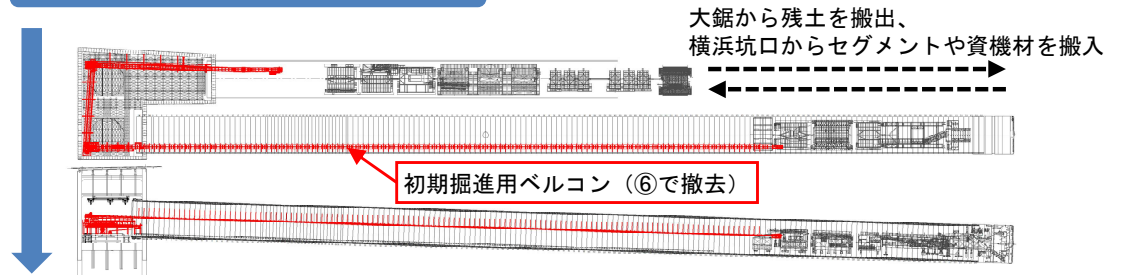

⑥ 段取替（3回目）

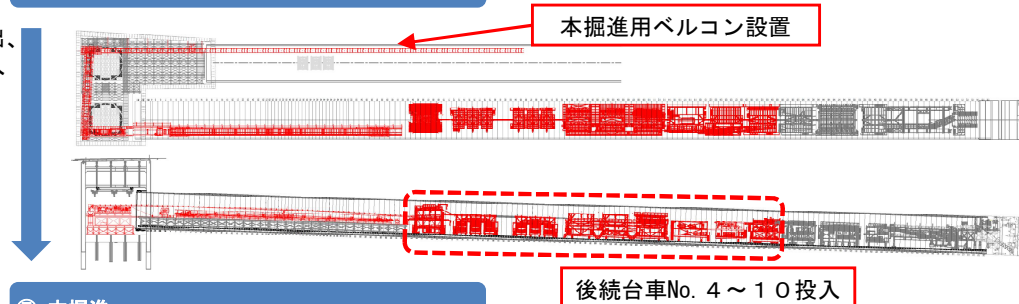

⑦ 本掘進
