

さがみ縦貫道路敷地内の安全性の確認状況について（中間報告その４）

記 者 発 表 資 料

○相模海軍工廠跡地におけるさがみ縦貫道路敷地内のP 2 7～P 2 8間（仮囲い内）のボーリング作業中に、微量のマスタードが検知されたことを受けて、3月18日（火）に、「さがみ縦貫危険物処理に関する有識者委員会」の現地調査を以下のとおり行います。

- ・日時：平成15年3月18日（火） 11：30～12：00
- ・場所：橋脚工事現場

＊現地取材される場合は、橋脚工事現場詰所前にお集まり下さい。なお、安全確保等のため、制限区域外からの取材に限らせていただきます。

○現地調査終了後、記者会見を以下のとおり行います。

- ・場所：寒川町消防本部 3階講堂 13：00～13：30

○3月14日（金）12時現在、微量のマスタードが検知されたP 2 7～P 2 8間と掘削調査予定のP 2 8～P 3 0間を除くボーリング調査結果は以下のとおりです。

調査期間	2月17日（月）～3月14日（金）12時
ボーリング作業実施済箇所 作業時測定結果	P 1 1～P 2 7、P 3 2～P 3 4 計107箇所 いずれもマスタード等の検知なし
ボーリング作業実施済の うち土壌調査実施済箇所 （安全性を確認した箇所）	P 1 1～P 2 7 98箇所
土壌調査結果	いずれもマスタード等の検知なし

平成15年3月14日

国土交通省 横浜国道工事事務所
神奈川県 防災局 災害対策課
寒川町 町民部 防災交通課

発 表 記 者 ク ラ ブ

神奈川県県政記者クラブ

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道工事事務所

TEL 045-311-2981

副 所 長 小 口 安 雄

工務課長 箕 作 光 一

神奈川県 防災局 災害対策課

TEL 045-210-3512

応急対策担当課長 小 松 義 次

寒川町 町民部 防災交通課

TEL 0467-74-1111

防災交通課長 福 岡 英 俊

さがみ縦貫道路敷地内の安全性の確認状況について


平成15年3月14日12時現在

調査区間		ボーリング作業			ボーリング作業実施済 箇所での土壌調査結果
		実施済数	作業時測定結果	作業状況	
1	P11 ～ P12	2	検知なし	H15. 2. 20済	検知なし(H15.2.24)
2	P12 ～ P13	8	検知なし	H15. 2. 21済	検知なし(H15.2.24)
3	P13 ～ P14	8	検知なし	H15. 2. 22済	検知なし(H15.2.27)
4	P14 ～ P15	8	検知なし	H15. 2. 23済	検知なし(H15.2.27)
5	P15 ～ P16	8	検知なし	H15. 2. 25済	検知なし(H15.2.27)
6	P16 ～ P17	12	検知なし	H15. 2. 26済	検知なし(H15.2.27)
7	P17 ～ P18	4	検知なし	H15. 2. 27済	検知なし(H15.3.1)
8	P18 ～ P19	6	検知なし	H15. 2. 27済	検知なし(H15.3.1)
9	P19 ～ P20	6	検知なし	H15. 2. 28済	検知なし(H15.3.1)
10	P20 ～ P21	4	検知なし	H15. 2. 28済	検知なし(H15.3.1)
11	P21 ～ P22	6	検知なし	H15. 3. 1済	検知なし(H15.3.1)
12	P22 ～ P23	6	検知なし	H15. 3. 3済	検知なし(H15.3.4)
13	P23 ～ P24	6	検知なし	H15. 3. 4済	検知なし(H15.3.6)
14	P24 ～ P25	5	検知なし	H15. 3. 4済	検知なし(H15.3.6)
15	P25 ～ P26	5	検知なし	H15. 3. 5済	検知なし(H15.3.7)
16	P26 ～ P27	6	検知なし	H15. 3. 10済	4箇所検知なし(H15.3.7) 2箇所調査中
17	P27 ～ P28	0	検知あり(注1)		保管庫で保管
18	P30 ～ P31				
19	P31 ～ P32				
20	P32 ～ P33	4	検知なし	H15.3.14一部済	調査中
21	P33 ～ P34	3	検知なし	H15.3.13済	調査中
計		107			

※作業時測定結果は、ボーリング作業時の大気検知調査結果を記載しています。

※土壌調査結果は、採取した土壌について危険物の有無を調査しています。(多少の時間が必要になります。)

(注1) 詳細については、3月10日の記者発表資料を参照してください。

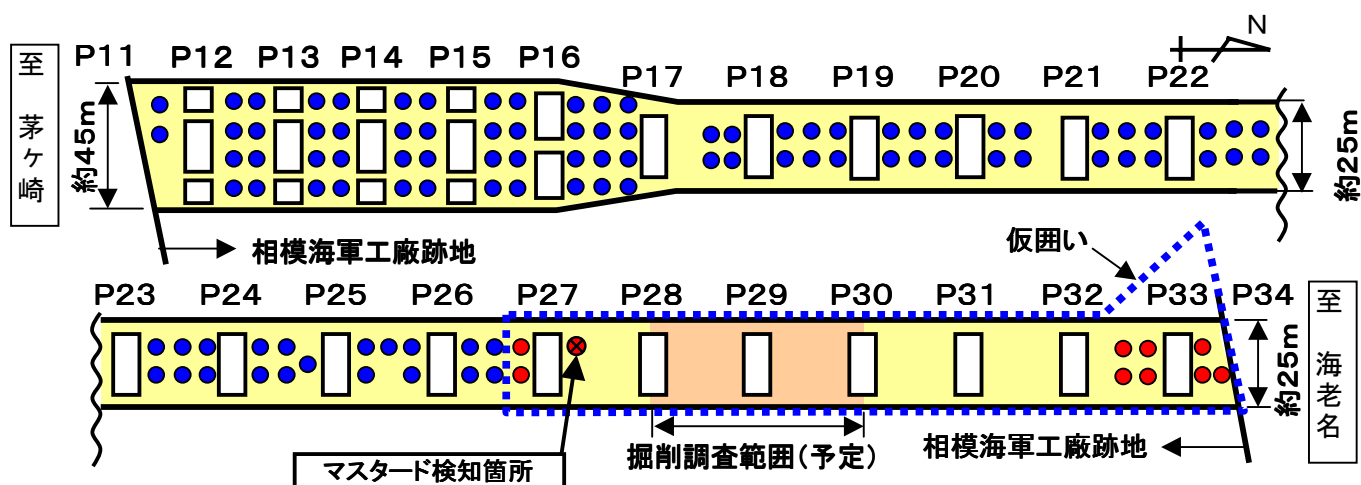

凡例	
	:ボーリング調査予定箇所
●	:ボーリング作業実施済箇所
●	:ボーリング作業実施済のうち土壌調査実施済箇所
	:掘削調査範囲(予定)
