

発行の
ごあいさつ

日頃から道路行政にご協力いただきありがとうございます。
また、情報誌“はねかわ”の発行が遅れており申し訳ありません。

排水計画の見直しにより工事着手が1年遅れておりました1工区は、本年7月より電線共同溝工事を本格着手いたしました。

2及び3工区は、用地取得協議中であり、また、4工区についても今年度より用地取得協議に着手し、皆様のご協力をいただき整備が進むよう努力して参る所存です。

工事にあたりましては、皆様にご不便お掛け致しますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。 宇都宮国道事務所

整備計画の目的

利用者の皆様にとって安全で快適な歩道空間を形成することを目的としています。

歩道整備の進捗状況と今後の予定

排水計画の見直しにより遅れておりました1工区につきましては、羽川交差点から北側約700mの区間を7月中旬から南側より工事を行っております。その他の工区につきましては、用地取得協議を行っております。

各工区ごとの今後の予定は以下のとおりです。

1工区：今回工事では、新設側溝及び排水管路の側溝への接続、及び、電線類を地中化するための電線共同溝（管路及びマス）の設置を行います（右下図参照）。主な作業内容及び工程は下表のとおりです。

2・3・4工区：平成23年頃の工事着手を目指し、引き続き、用地取得協議を行って参ります。

平成20年度 1工区工実施予定スケジュール

1工区 の主な作業内容	平成20年						平成21年	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
舗装切替、低木移植	→							
排水工事	既存排水施設取壊し、新設排水施設設置、排水管移植							
電線共同溝 (電線類収容施設)			既存排水施設取壊し、電線類収容施設設置					
舗装復旧							緑石、舗装復旧、区間境	


平成20年度 羽川歩道整備事業 実施予定スケジュール

	平成20年	平成21年							
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第1工区				電線共同溝工事					
第2工区				用地取得協議					
第3工区				用地取得協議					
第4工区				用地取得協議					


※ 既存側溝に接続している排水管は、新設側溝に接続します。

※ 電線類の地中化は、今回の工事で行いません。次回工事で電線類地中化を行います。


平成20年度 工実施予定位置図

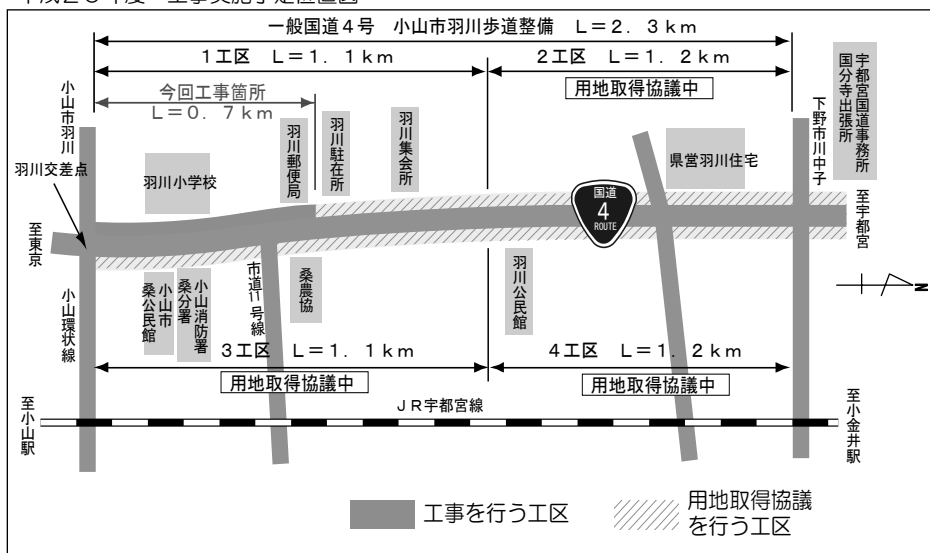

【歩道整備前】



【歩道整備後】

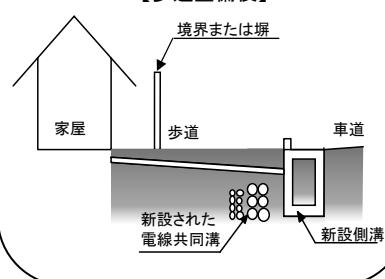

電線共同溝の施工に伴う電柱の移設について

電柱の移設は、用地取得協議や工事の進捗に合わせて次の手順で実施しています。

1. 拡幅する用地の調査を行い、取得協議の後、用地の補償・取得を行います。
2. 歩道を拡幅し、仮舗装を実施します（写真1）。電線移設のために、仮の電柱を民地側に建てる予定です。この時、一時的に電柱は2本並びます（電柱の管理者との協議により、仮舗装と仮の電柱設置の順番が逆になることもあります）。
3. 仮の電柱に電線を移設し、既存の電柱は撤去します。（写真2）
4. 仮舗装を撤去し、電線共同溝を埋設します。共同溝に電線を移設後、仮の電柱を撤去します。（次回工事以降）

【第1工区における電柱の移設状況】



写真1 電柱移設前

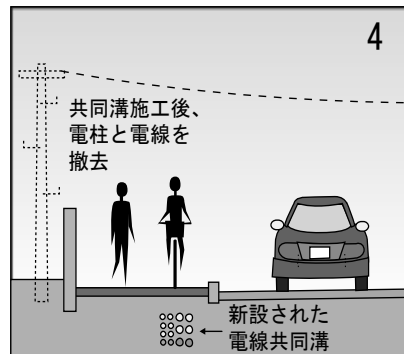
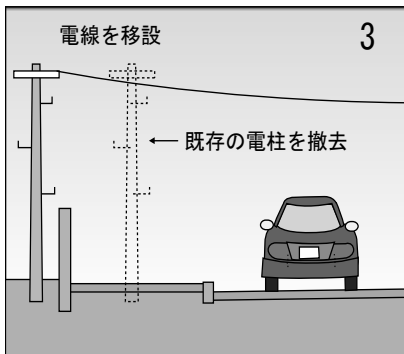
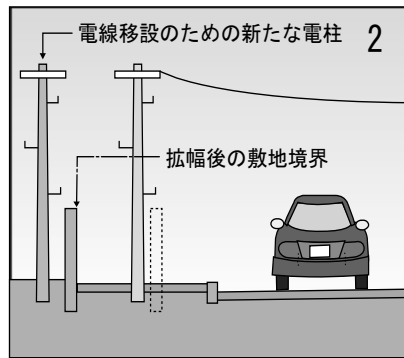
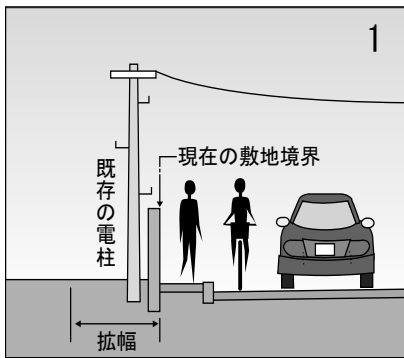


写真2 電柱移設完了

※現在の第1工区は2および3の段階に該当します。

お問い合わせ

【工事に関するお問い合わせ】

宇都宮国道事務所 国分寺出張所
 〒 329-0415
 下野市川中子3329番地77
 TEL 0285-44-1335



【用地に関するお問い合わせ】

宇都宮国道事務所 用地課
 〒 321-0931
 宇都宮市平松町504番地
 TEL 028-638-2183

※今後は、情報誌“はねかわ”の定期的な発行に努力して参ります。
