

## 第２８回 東京外環トンネル施工等検討委員会

再発防止対策及び地域の安全・安心を高める取り組みを踏まえた工事の状況等について  
＜ 東 名 Ｊ Ｃ Ｔ    Ｈ ラ ン プ シ ー ル ド ト ン ネ ル ＞

令和５年１２月２２日

国土交通省    関東地方整備局    東京外かく環状国道事務所  
東日本高速道路株式会社関東支社    東京外環工事事務所  
中日本高速道路株式会社東京支社    東京工事事務所

## 目


## 次

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 1. 工事の進捗状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 1     |
| 1. 1    東名JCTHランプ  Hランプシールド工事の概要・・・・・・・・      | 1     |
| 1. 2    工事進捗状況・・・・・・・・・・・・・・・・                | 1     |
| 2. 再発防止対策を踏まえた工事の対応状況・・・・・・・・                 | 2     |
| 2. 1    東名JCT  Hランプシールド工事  添加剤使用起基本計画・・・・・・・・ | 3     |
| 2. 2    塑性流動性とチャンバー内圧力のモニタリングと対応・・・・・・・・      | 4～8   |
| 2. 3    排土量管理について・・・・・・・・・・・・・・・・             | 9～16  |
| 2. 4    掘進管理項目および掘進管理基準に関する施工データ・・・・・・・・      | 17～21 |
| 2. 5    再発防止対策を踏まえた掘進管理・・・・・・・・               | 22～23 |
| 3. 地域の安全・安心を高める取り組みの対応状況・・・・・・・・              | 24    |
| 3. 1    振動・騒音のモニタリングの強化・・・・・・・・               | 25～26 |
| 3. 2    地表面変状の確認・・・・・・・・                      | 27～29 |
| 3. 3    地域住民の方への情報提供・・・・・・・・                  | 30～32 |

# 1. 工事の進捗状況

## 1. 1 東名JCT Hランプシールド工事の概要


- 工事名称 : 東京外かく環状道路 東名ジャンクションランプ  
シールドトンネル・地中拡幅（南行）工事
- 発注者 : 東日本高速道路(株) 関東支社
- 施工者 : 安藤・間・西松・日本国土特定建設工事共同企業  
体
- 工事内容 : 泥土圧シールド  
（シールド機外径φ13.94m、  
セグメント外径φ13.7m）  
延長 約1,010m
- 工事箇所 : 東京都世田谷区大蔵～成城

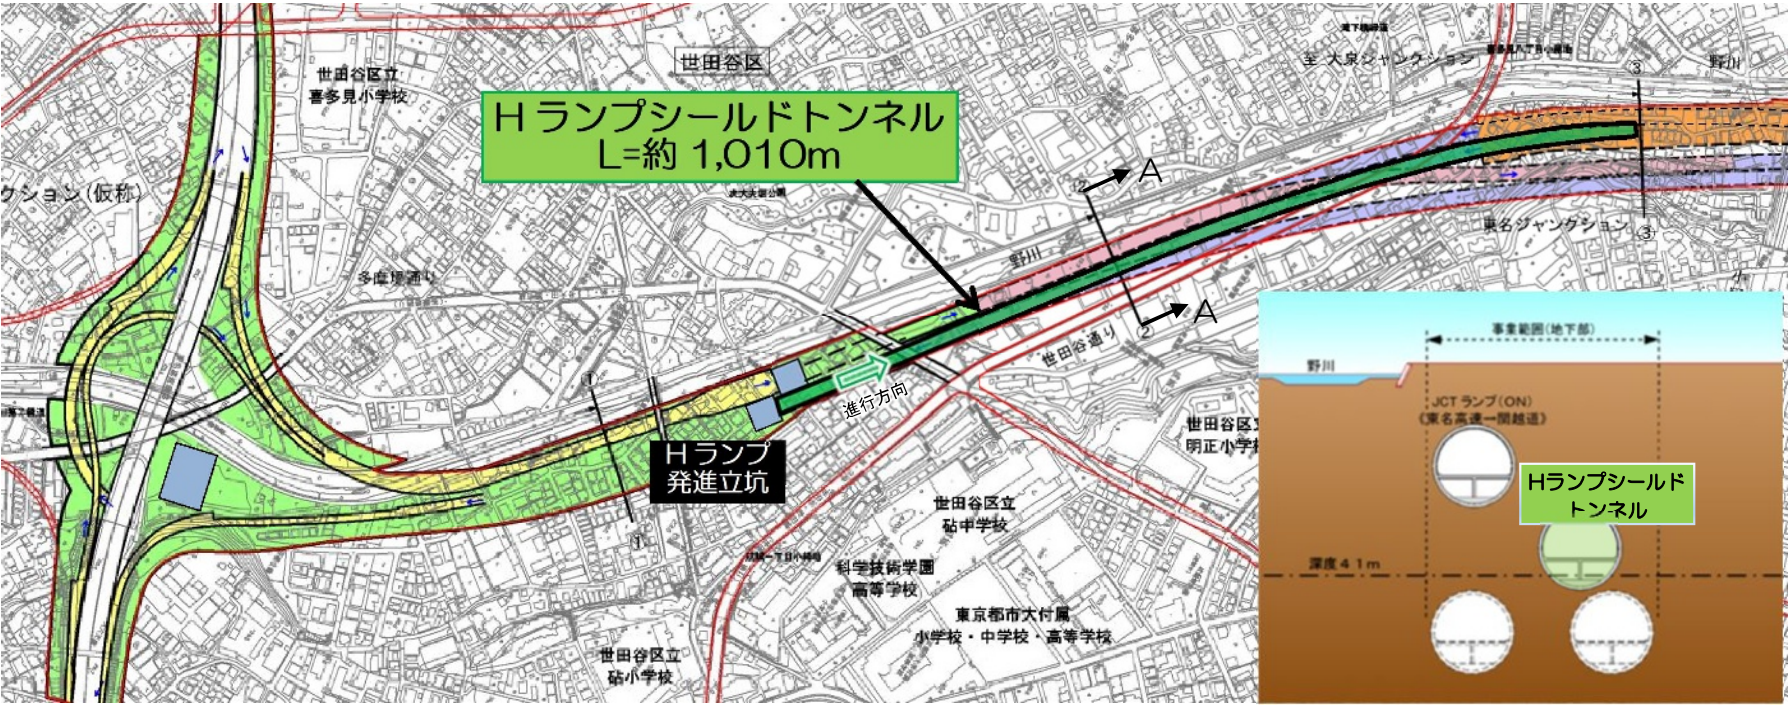

A-A断面

## 1. 2 工事進捗状況（令和5年11月30日現在）

東名JCT Hランプシールド工事は令和5年5月1日から令和5年11月30日の間にセグメント20Rから147Rまでの約200mの掘進作業を行った。

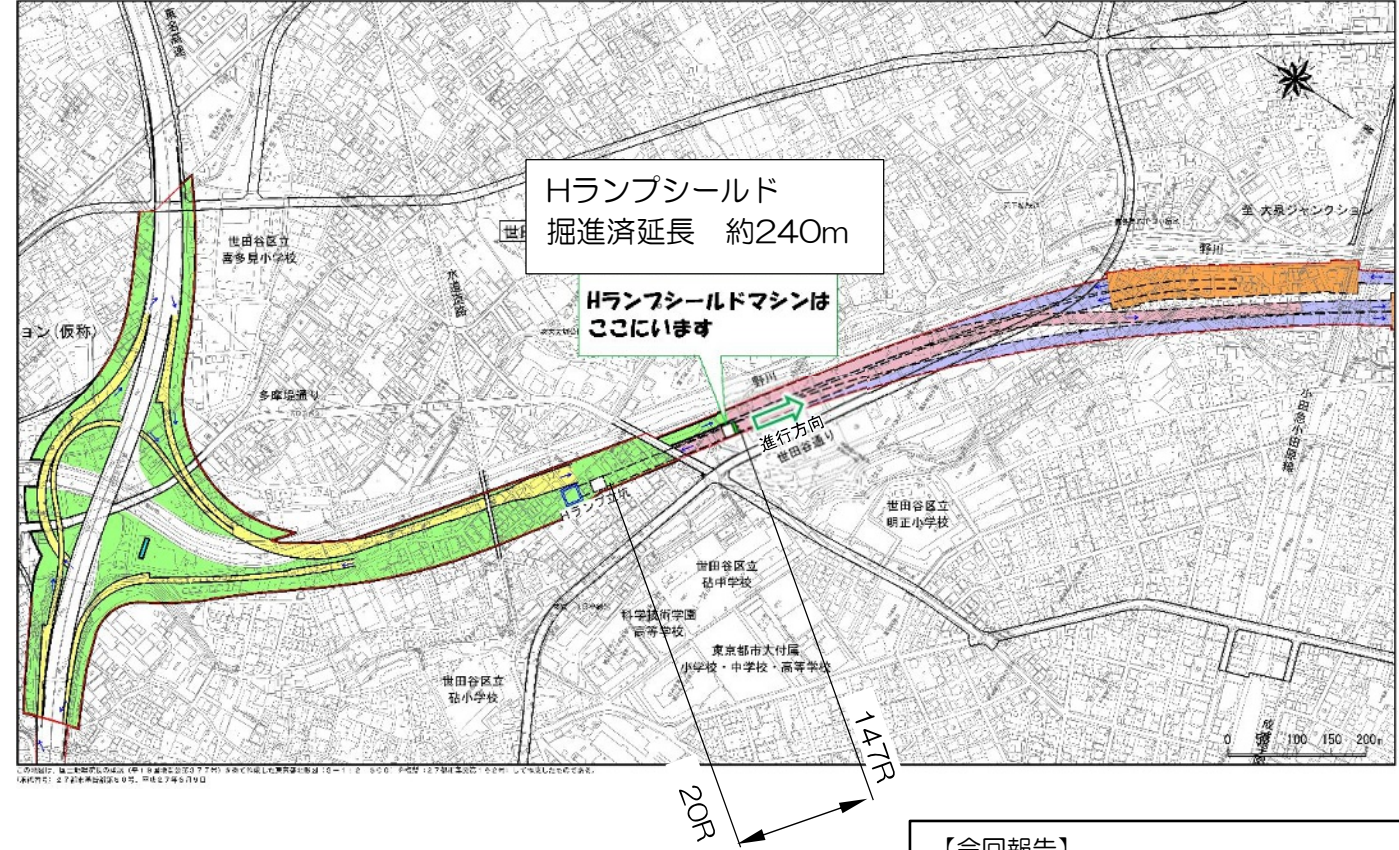

【今回報告】  
令和5年5月1日～令和5年11月30日  
掘進実績 約200m (128R)




発進立坑



シールドマシン背面



発進坑口

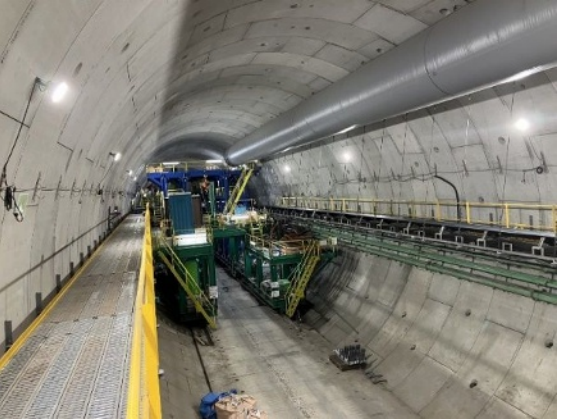

後続台車背面


## 2. 再発防止対策を踏まえた工事の対応状況

第26回東京外環トンネル施工等検討委員会で、次の陥没・空洞の推定メカニズムを踏まえた再発防止対策を確認した。  
掘進作業にあたっては、再発防止対策が機能していることを丁寧に確認し、施工状況や周辺環境をモニタリングしながら細心の注意を払い慎重に進めている。

### 陥没・空洞の推定メカニズムを踏まえたトンネル再発防止対策

陥没・空洞の推定メカニズムを踏まえた、東京外環事業における今後のシールドトンネル施工を安全に行うための再発防止対策は以下のとおりである。空洞・陥没が発生したことでシールドトンネル工事に起因した陥没等に対する懸念や、振動・騒音等に対する不安の声等が多く寄せられていることを受け、地盤変状の監視強化や振動計測箇所の追加、振動・騒音対策の強化など、「地域の安全・安心を高める取り組み」を加え、再発防止対策として実施していくこととする。


#### ■陥没・空洞の推定メカニズムを踏まえたトンネル再発防止対策

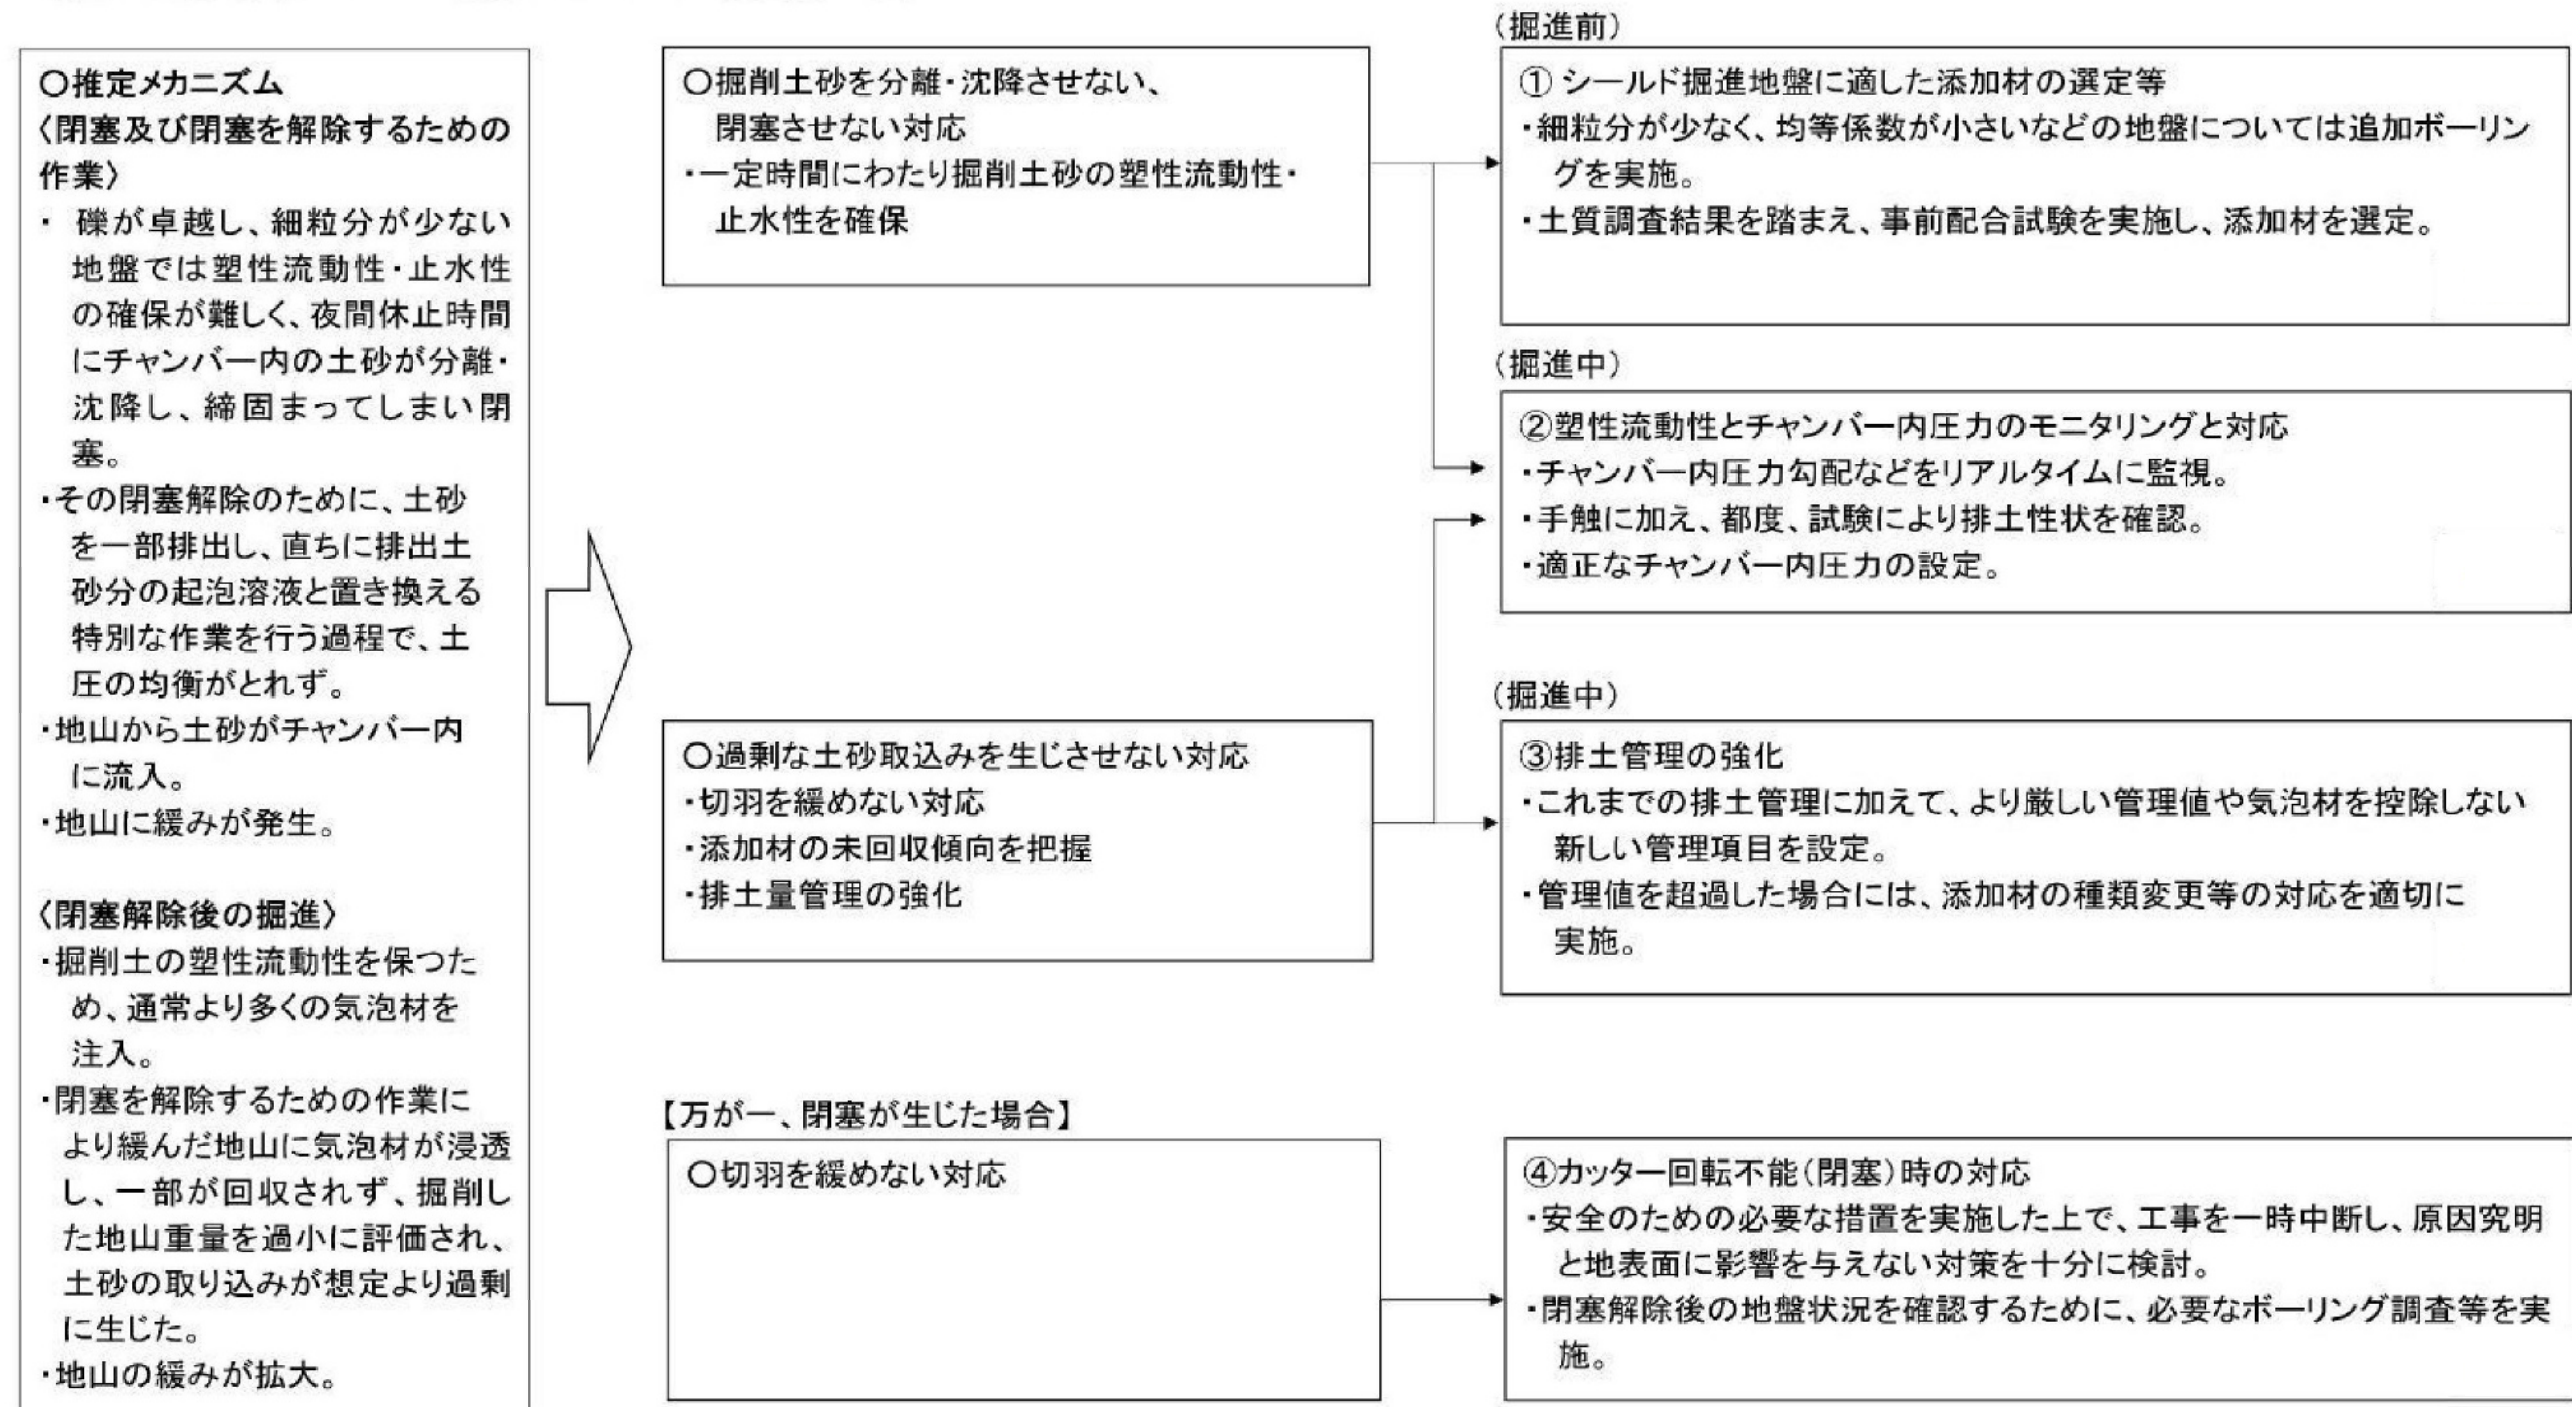

## 2. 1 東名JCT Hランプシールド工事 添加材使用基本計画

第26回東京外環トンネル施工等検討委員会でとりまとめた、再発防止対策のシールド掘進地盤に適した選定等の結果を踏まえ、添加材は起泡溶液を適切に使用している。  
Hランプシールドは発進直後から全断面固結シルト層（北多摩層）の掘進となることから、シールドマシンには、チャンバー内土砂の常時塑性流動性の確保を図るために、起泡溶液の濃度を臨機応変に変更できる設備を搭載している。

添加材使用基本計画

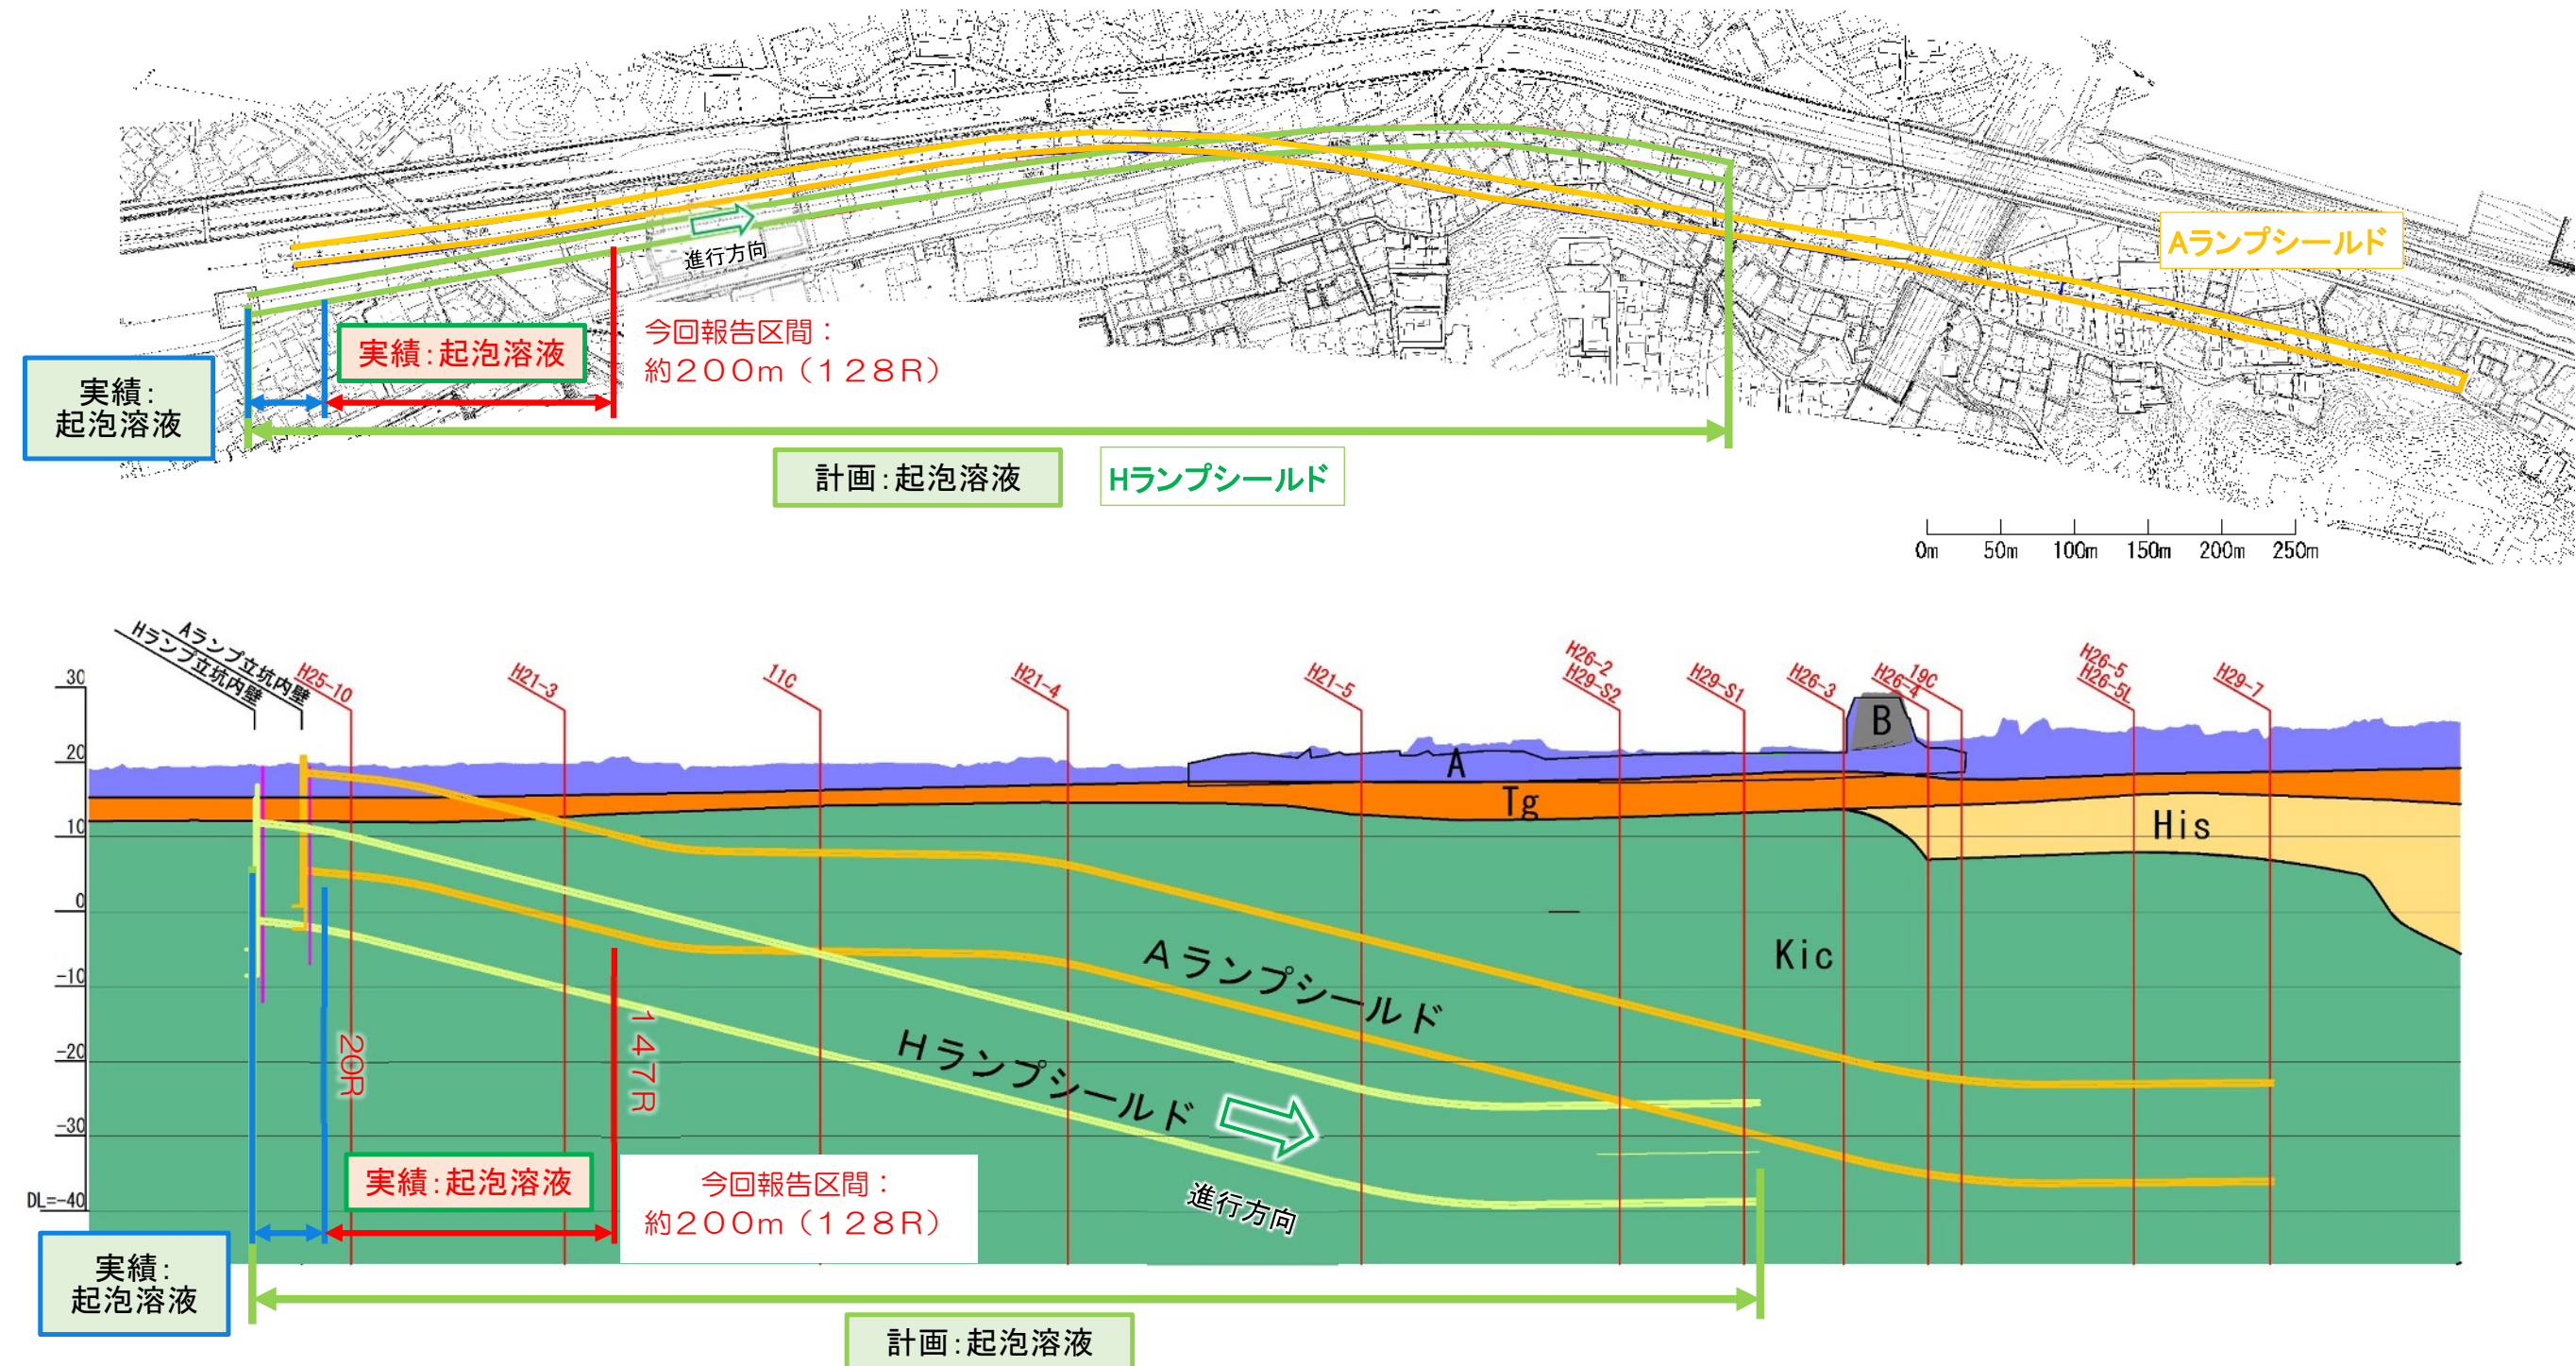

各種モニタリングや排土性状を確認し、塑性流動性の悪化が懸念される場合は、添加材の注入量や濃度を変更し改善を図る。

2. 2 塑性流動性とチャンバー内圧力のモニタリングと対応


2. 1. 1 第26回東京外環トンネル施工等検討委員会で確認された再発防止対策

- ・これまでの塑性流動性の確認項目に加え、新たにチャンバー内の圧力勾配、ミニスランプ、粒度分布での確認を行うこととする。
- ・塑性流動性のモニタリングをしながら、添加材注入量や添加材の種類を適切に調整し、塑性流動性・止水性の確保を行う。なお、塑性流動性の確保が困難となる兆候が確認された場合は原因の解明と対策を検討する。

掘進データからの塑性流動性確認方法

| 管理項目       | 管理内容                                                                                        | 管理値・確認内容                                                                                                                                                                            | 対応                                                                                                        | 備考                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| カッタートルク    | カッターヘッドを回転させるために必要なトルク値であり、地盤状況ごとの想定トルク値および装備能力に対して計測トルクの割合と計測トルクの変動についても確認を行う(確認頻度_リアルタイム) | 管理値: 装備トルク 80%以下<br>・掘進中やチャンバー土砂の攪拌時は監視モニターでリアルタイムに確認する                                                                                                                             | ・掘進速度の低減(カッタートルク対応)<br>・チャンバー内圧力設定の見直し<br>・添加材注入量の増加<br>・夜間等掘進休止時において、チャンバー内土砂の分離を防ぐため、定期的にチャンバー内土砂の攪拌を実施 |                                                                                        |
| チャンバー内圧力勾配 | チャンバー内圧力勾配の変化を確認する(確認頻度_リアルタイム、毎リング管理)                                                      | 圧力勾配の傾きと直線性を確認する<br>・下限圧力と上限圧力との間で掘進時のチャンバー内圧力を管理することで、切羽の安定を常時管理する<br>・事前のボーリングデータと添加材注入率等から算出される理論圧力勾配との差を確認する<br>・下部チャンバー内圧力が大きくなるなどの異常が無いことを確認<br>・掘進中および停止中は監視モニターでリアルタイムに確認する |                                                                                                           | 傾きが想定以上に大きい場合は、添加材の地山への過度な浸透が生じている可能性<br><br>傾きが小さい場合や直線性が損なわれている場合は、土砂の分離・沈降が生じている可能性 |
| 手触目視       | 掘削土のまとまり具合を手触と目視で確認する(確認頻度(目視:リアルタイム、手触:2回/日))                                              | 添加材の添加量や種類、濃度変更による掘削土の排土性状の変化を確認する<br>例) 添加材注入量増加に見合う湿潤状態など                                                                                                                         |                                                                                                           | 掘削土には高分子材が添加                                                                           |
| ミニスランプ試験   | 掘削土のスランプ値を計測し、値と変化を傾向管理する(確認頻度 2 回/日)                                                       | 直近の掘削土の性状と比較する                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 掘削土には高分子材が添加                                                                           |
| 粒度分布       | 掘削地山の土層を把握するために試験室にて粒度分布試験を実施し添加材の注入率設定のデータとする(確認頻度 20 リングに 1 回を基本とし、塑性流動性のモニタリングに応じて適宜実施)  | 既往ボーリング結果と比較する                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 細粒分や礫分の比率など地層の変化を確認                                                                    |

○ チャンバー内圧力勾配の変化を確認

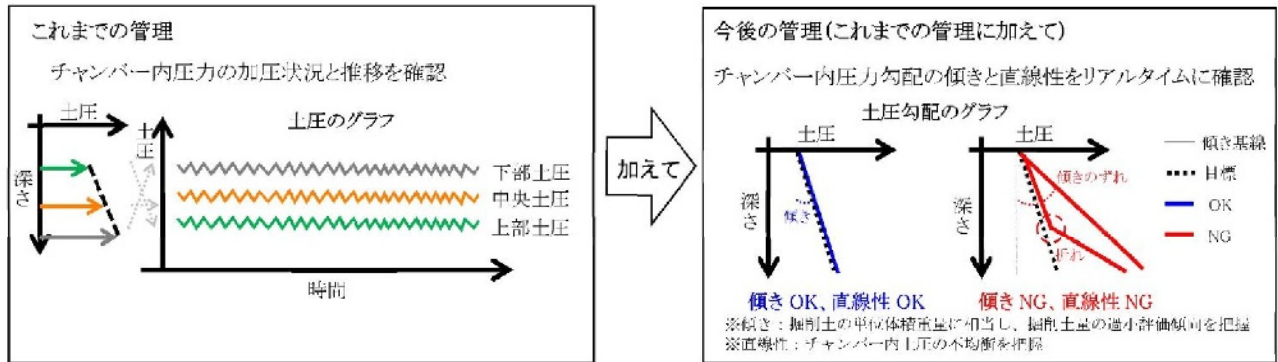

○ 排土性状の確認




2. 2. 2 東名JCT Hランプシールドトンネル工事での対応状況

(1) カッタートルク


掘進管理フローに基づき掘進管理システムの監視モニターでカッタートルクをリアルタイムで監視し、管理値内で掘進できていることを確認した。なお、支障物（下水道管）切削区間では掘進速度を大きく低下させたことから、カッタートルクが小さくなったことを確認している。

リング毎データ

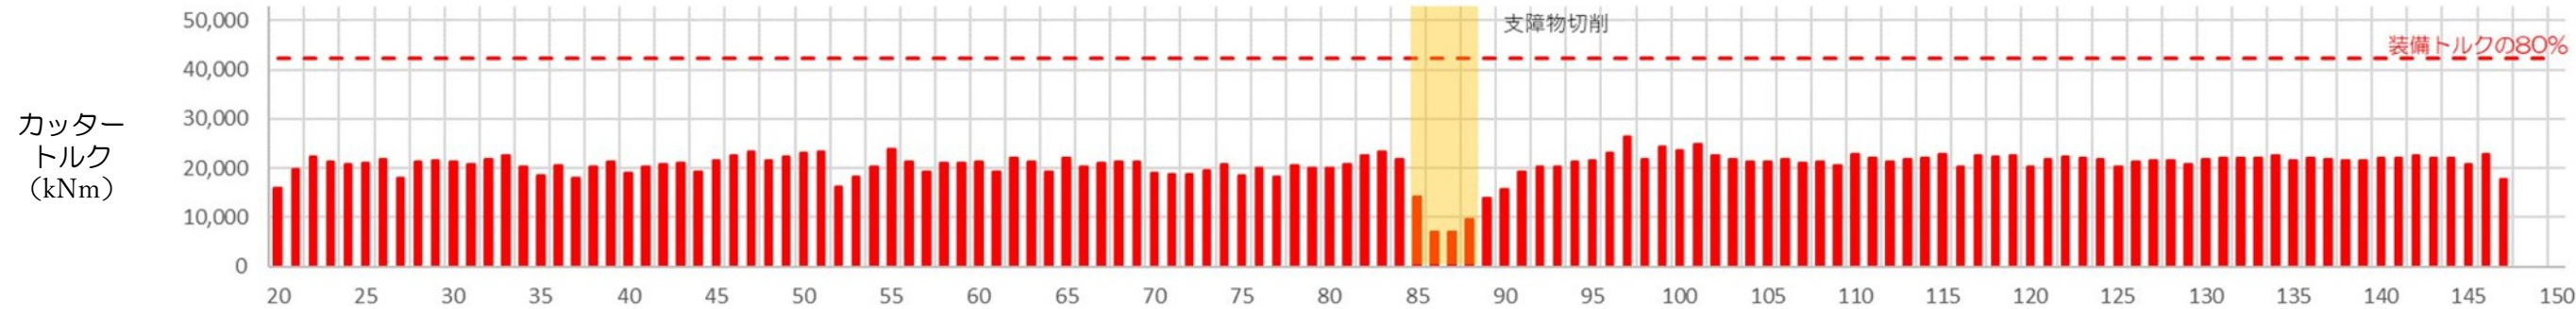


掘進リング（R）

カッタートルクのリアルタイム掘進状況（105R）

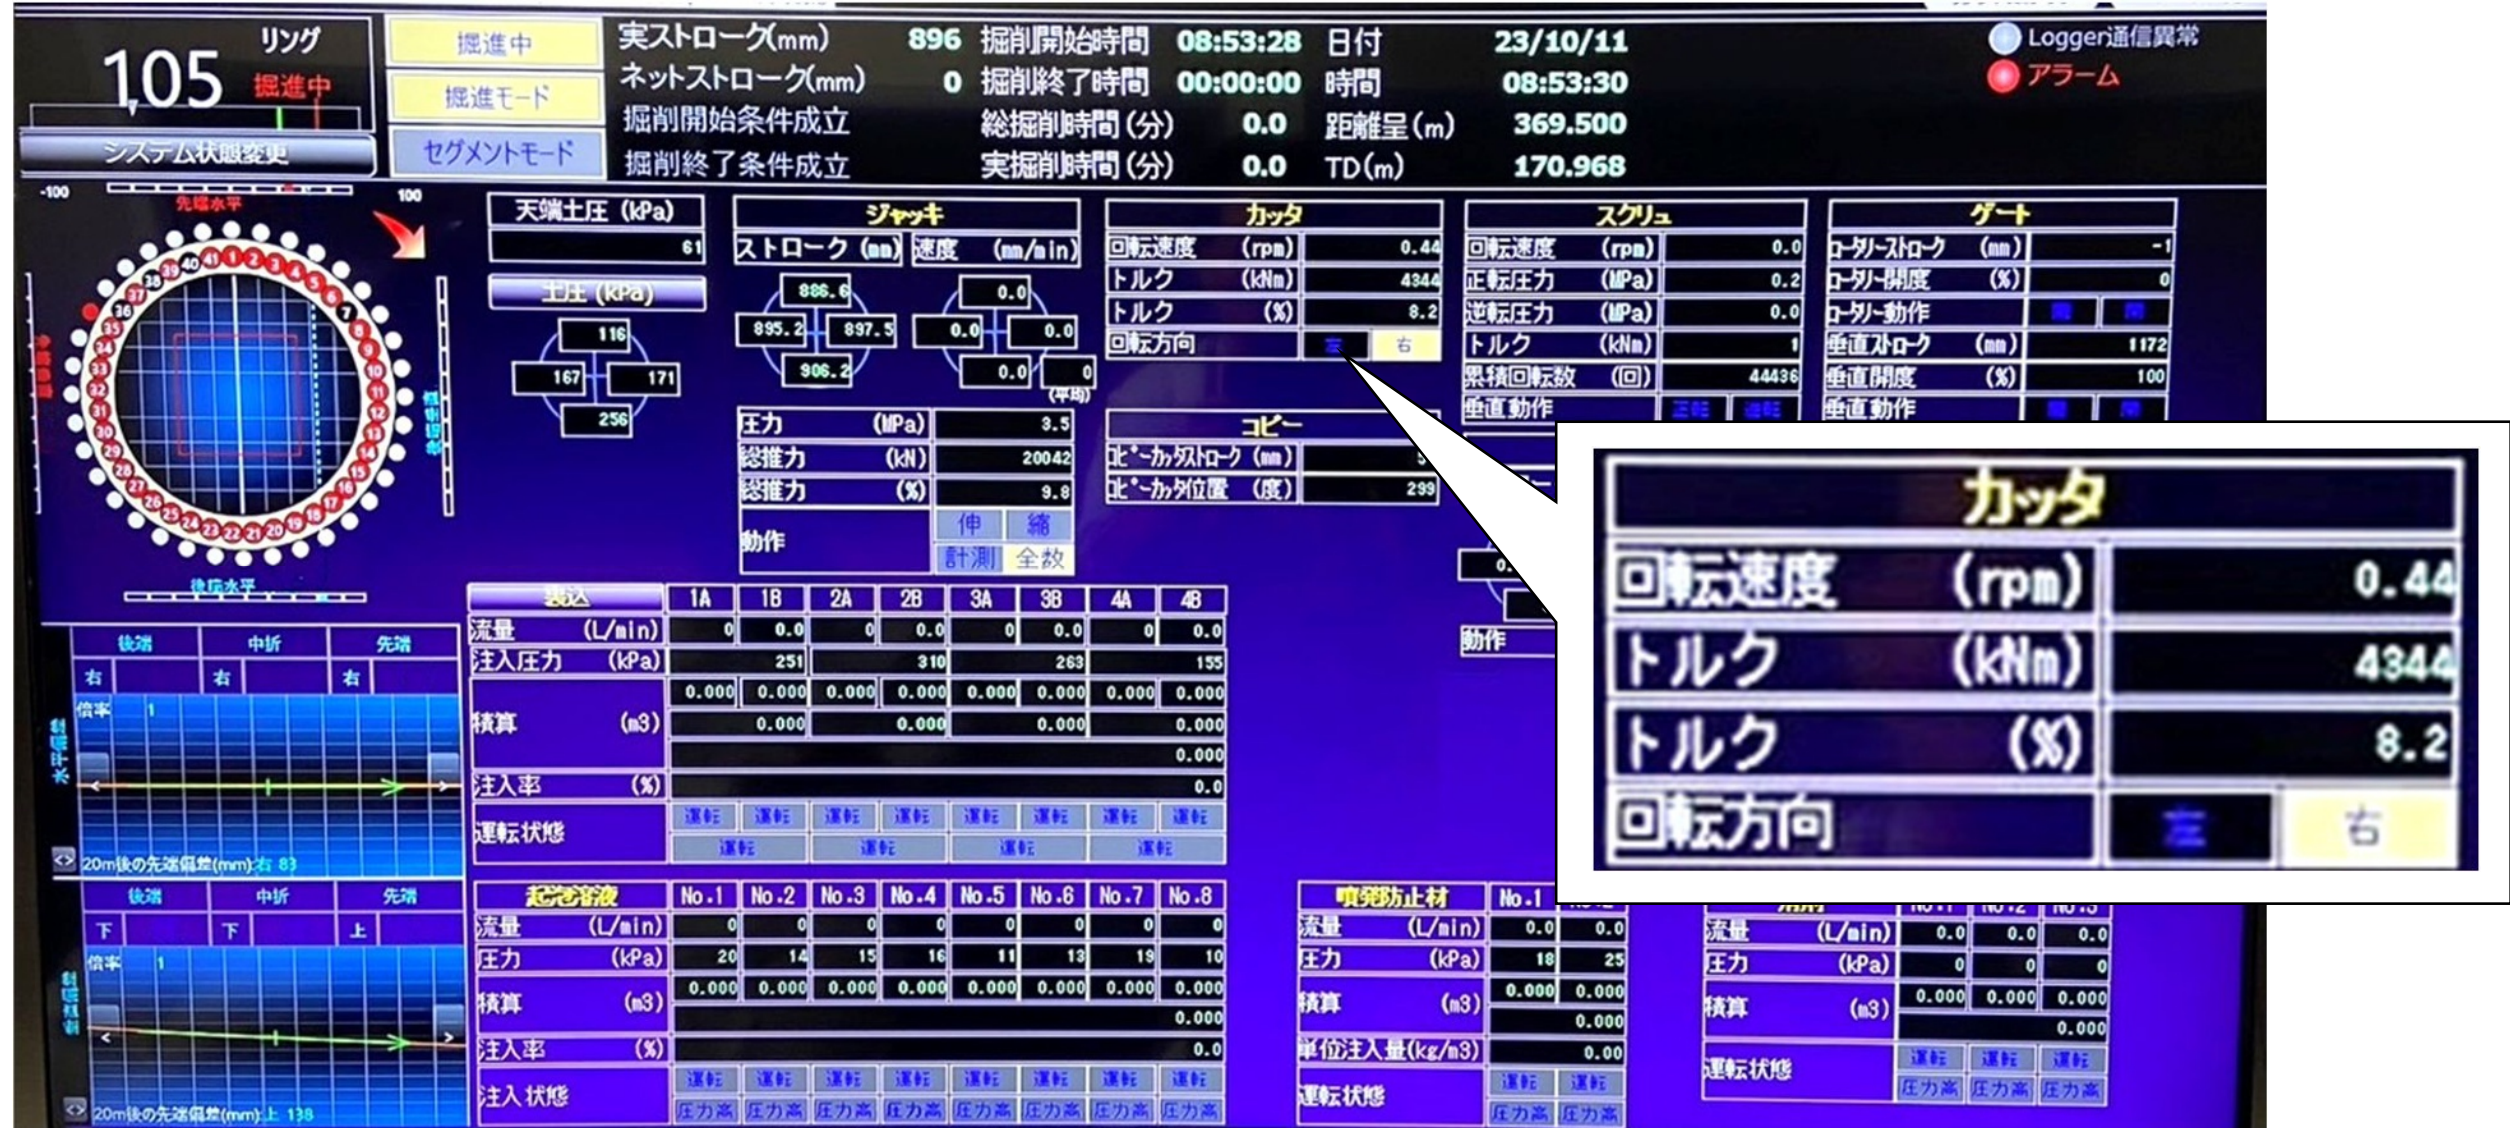


## (2) チャンバー内圧力勾配

掘進管理フローに基づき、掘進管理システムの監視モニターでリアルタイムおよびリング毎にチャンバー内圧力勾配の変化を監視し、理論圧力勾配と同じ傾向を示していること、圧力勾配の傾き・直線性や下部チャンバー内圧力が大きくなるなどの異常がないことを確認した。理論圧力勾配よりもチャンバー内圧力勾配が低めになる傾向が見られており、固結シルトの粘性の影響と考えられる。

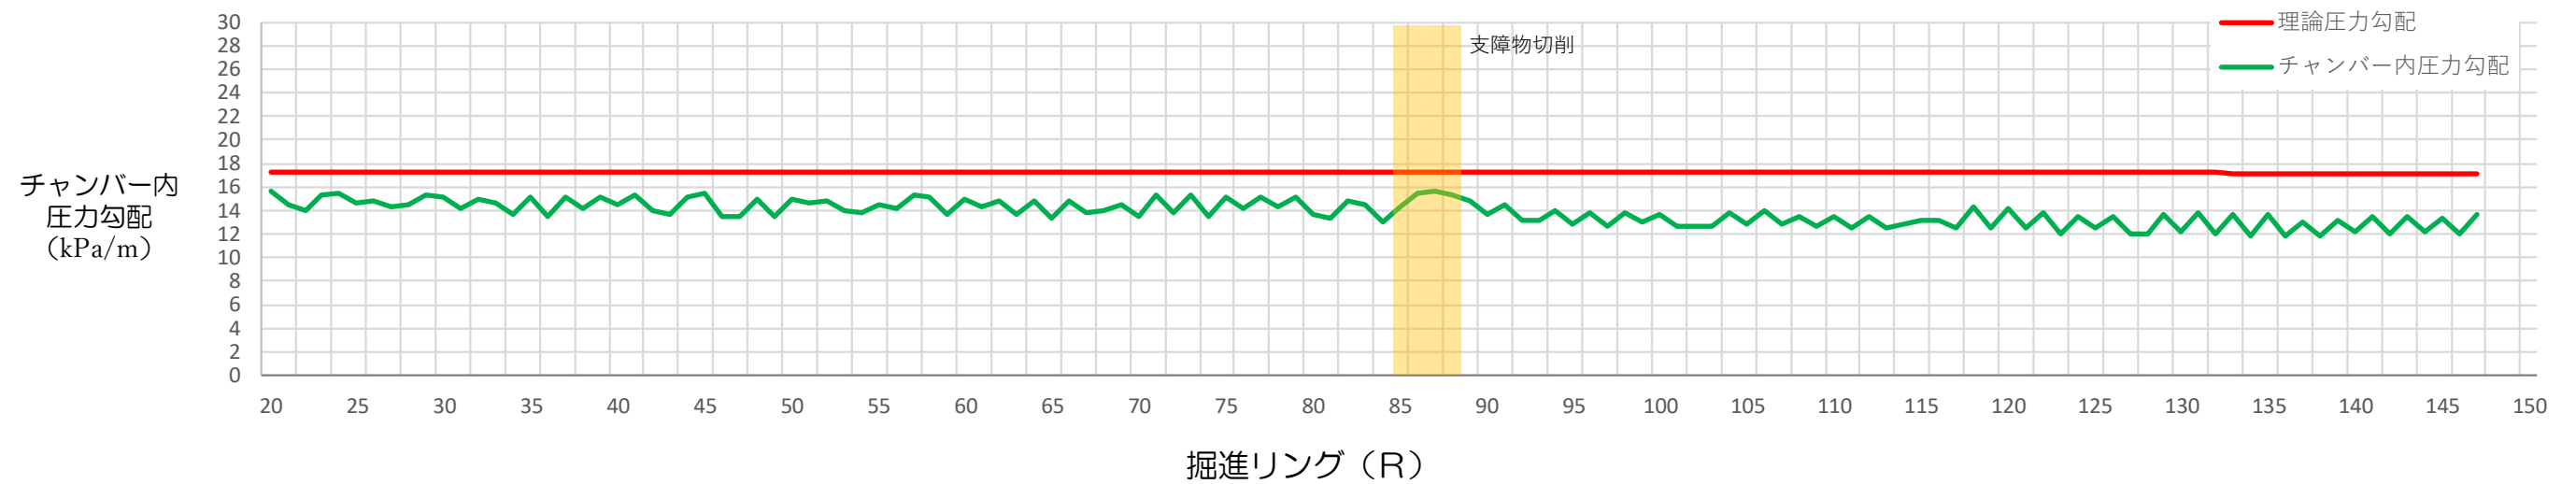


チャンバー内土圧計配置図（切羽から坑口を望む）

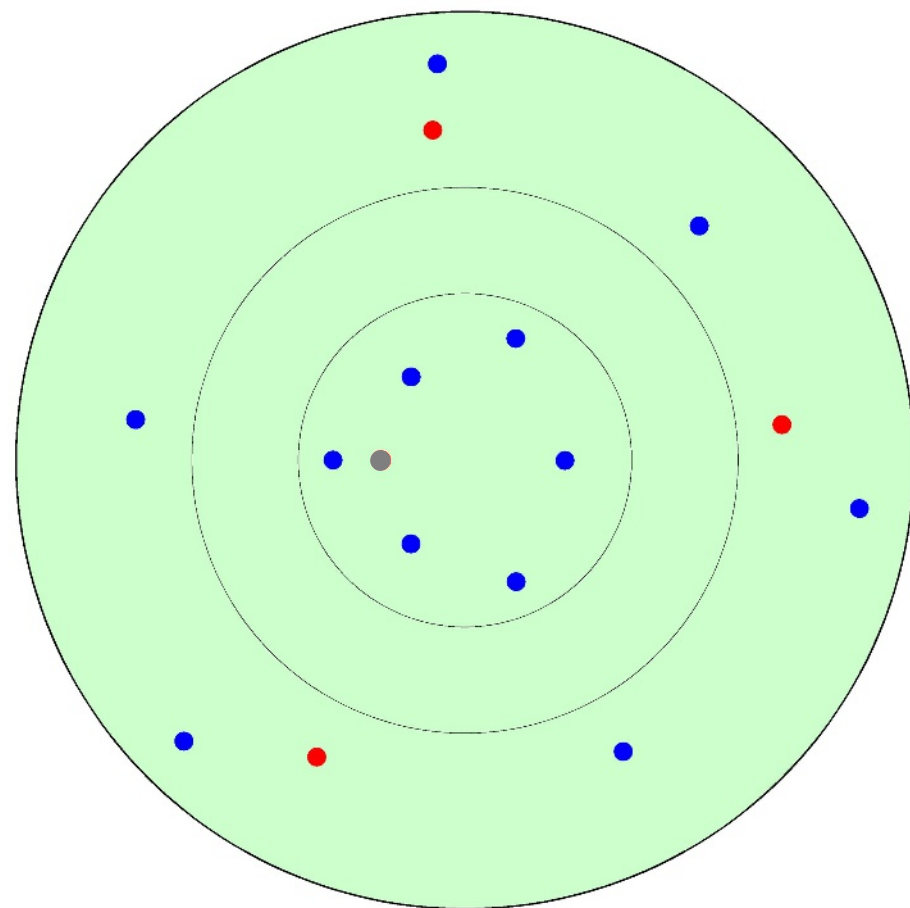

- 土圧計（近似線算出に使用）
- せん断土圧計（近似線算出に不使用）
- 故障のため近似線算出に不使用









チャンバー内圧力勾配リアルタイム監視状況（105R）

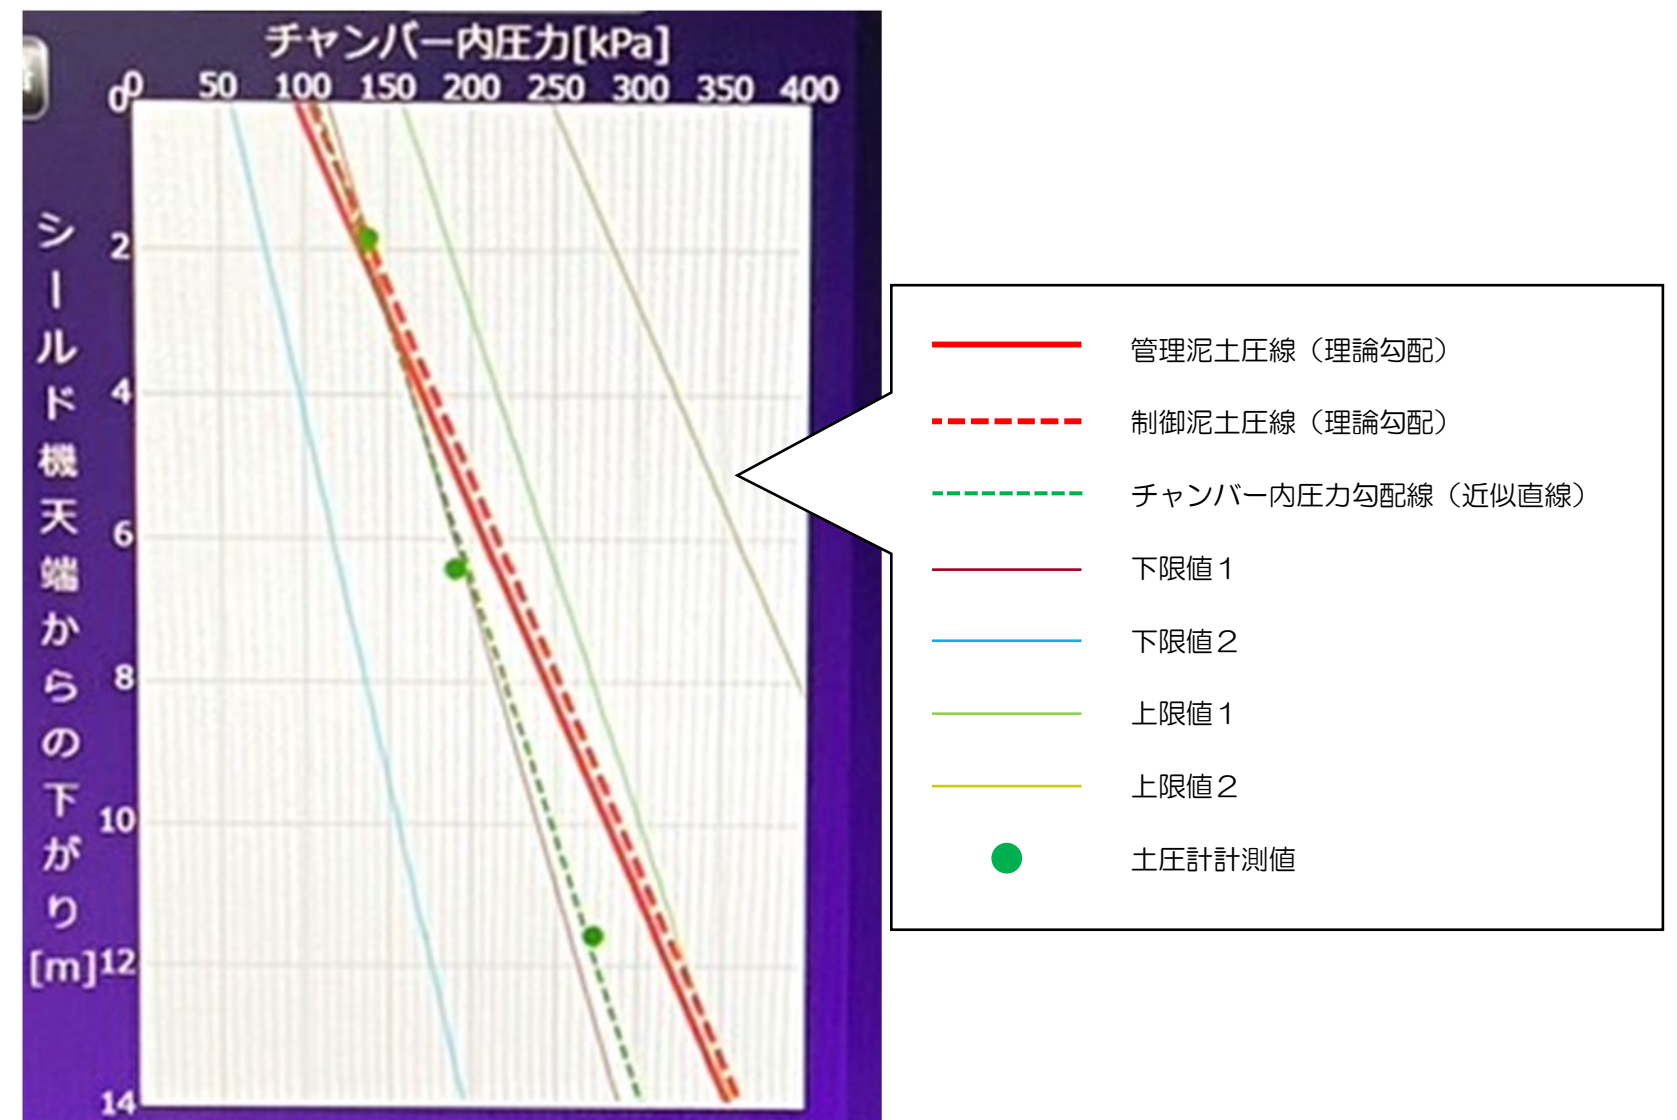


## ■掘進停止中のリアルタイム塑性流動性の確認

休日掘進停止・長期掘進停止から掘進再開までの間も施工データをリアルタイムで監視している。以下に休日掘進停止、長期掘進停止から掘進再開までのチャンバー内圧力勾配データの一例を示す。圧力勾配の直線性や傾きを確認しており、チャンバー内の塑性流動性悪化の兆候はなく、休日掘進停止後・長期掘進停止後の掘進再開時のカッターの起動も円滑に行われている。

固結シルトの場合、カッター攪拌時は塑性流動性のある泥土性状を示し理論圧力勾配に近づくが、掘進停止後に徐々に圧力が小さくなり、水圧に近づく傾向が見られている。その状態でカッターを起動させてもトルク異常は発生せず、速やかに停止前の理論圧力勾配に戻ることを確認している。地表面沈下や排土量、天端空洞等を点検しているが異常は発生していない。カッター攪拌を停止すると固結シルトの粘着力により側方土圧成分が相殺され、水圧のみがかかっていると考えられる。

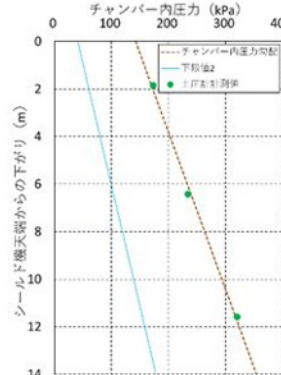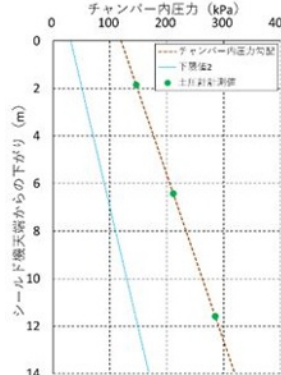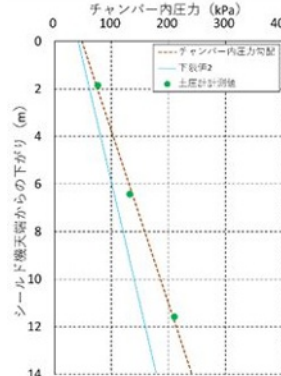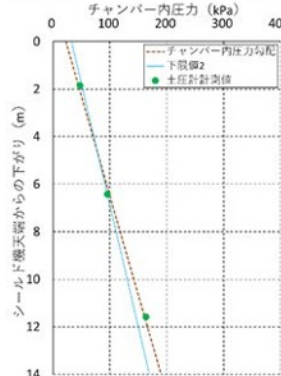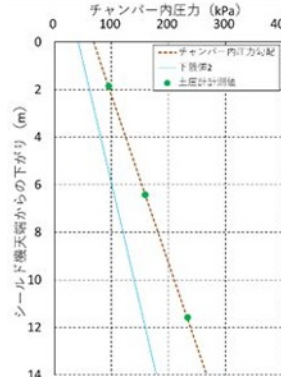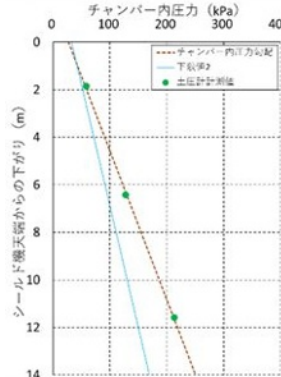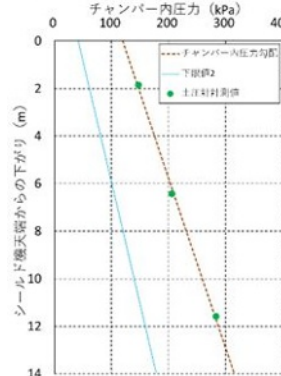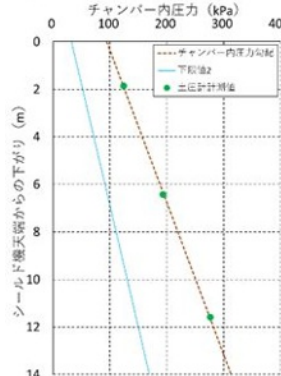
|           | 休日掘進停止・再開時                                                                                                                   | 長期掘進停止・再開時                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掘進完了時(停止) | 63Ring掘進完了時(停止)<br>土圧分布(9/1 17:28)        | 51Ring掘進完了時(停止)<br>土圧分布(6/20 13:09)       |
| 掘進開始前(停止) | 64Ringカッター起動前(停止)<br>土圧分布(9/4 14:22)     | 52Ringカッター起動前(停止)<br>土圧分布(8/24 8:53)     |
| カッター起動時   | 64Ringカッター起動時<br>土圧分布(9/4 14:27)        | 52Ringカッター起動時<br>土圧分布(8/24 14:53)       |
| 掘進中       | 64Ring掘進中(st1000mm)<br>土圧分布(9/4 15:21)  | 52Ring掘進中(st500mm)<br>土圧分布(8/24 16:34)  |

(3) 手触、目視、ミニスランプ試験、粒度分布  
 シールド施工熟練者によりリアルタイムでベルトコンベア上の掘削土の性状を目視するとともに、2回/日の頻度で採取し、手触、目視、ミニスランプ試験により排土性状の変化を確認した。なお、粘性土であることから1日/回の頻度で含水比を計測している。  
 20リングに1回の頻度を基本として掘削土の粒度分布試験を実施し、塑性流動性の低下が懸念される粒度分布ではないことを確認した。
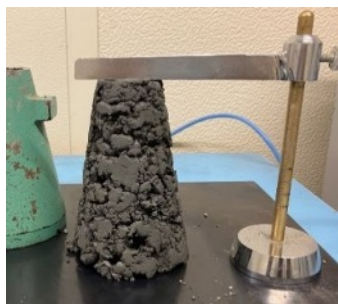
| 20R                                                                                         | 40R                                                                                         | 60R                                                                                         | 80R                                                                                         | 100R                                                                                        | 120R                                                                                        | 140R                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 触手・目視                                                                                       | 触手・目視                                                                                       | 触手・目視                                                                                       | 触手・目視                                                                                       | 触手・目視                                                                                       | 触手・目視                                                                                       | 触手・目視                                                                                       |
|            |            |           |          |          |          |          |
| ミニスランプ 0.2cm                                                                                | ミニスランプ 0.3cm                                                                                | ミニスランプ 0.4cm                                                                                | ミニスランプ 0.2cm                                                                                | ミニスランプ 0.1cm                                                                                | ミニスランプ 0.7cm                                                                                | ミニスランプ 0.6cm                                                                                |
|           |           |          |         |         |         |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・固結シルトである。</li> <li>・直近で採取した土砂の傾向と大きな変化なし</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・固結シルトである。</li> <li>・直近で採取した土砂の傾向と大きな変化なし</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・固結シルトである。</li> <li>・直近で採取した土砂の傾向と大きな変化なし</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・固結シルトである。</li> <li>・直近で採取した土砂の傾向と大きな変化なし</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・固結シルトである。</li> <li>・直近で採取した土砂の傾向と大きな変化なし</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・固結シルトである。</li> <li>・直近で採取した土砂の傾向と大きな変化なし</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・固結シルトである。</li> <li>・直近で採取した土砂の傾向と大きな変化なし</li> </ul> |

(上表の掘削土は、排土時に高分子材を添加しているもの)

■ 粒度分布試験結果

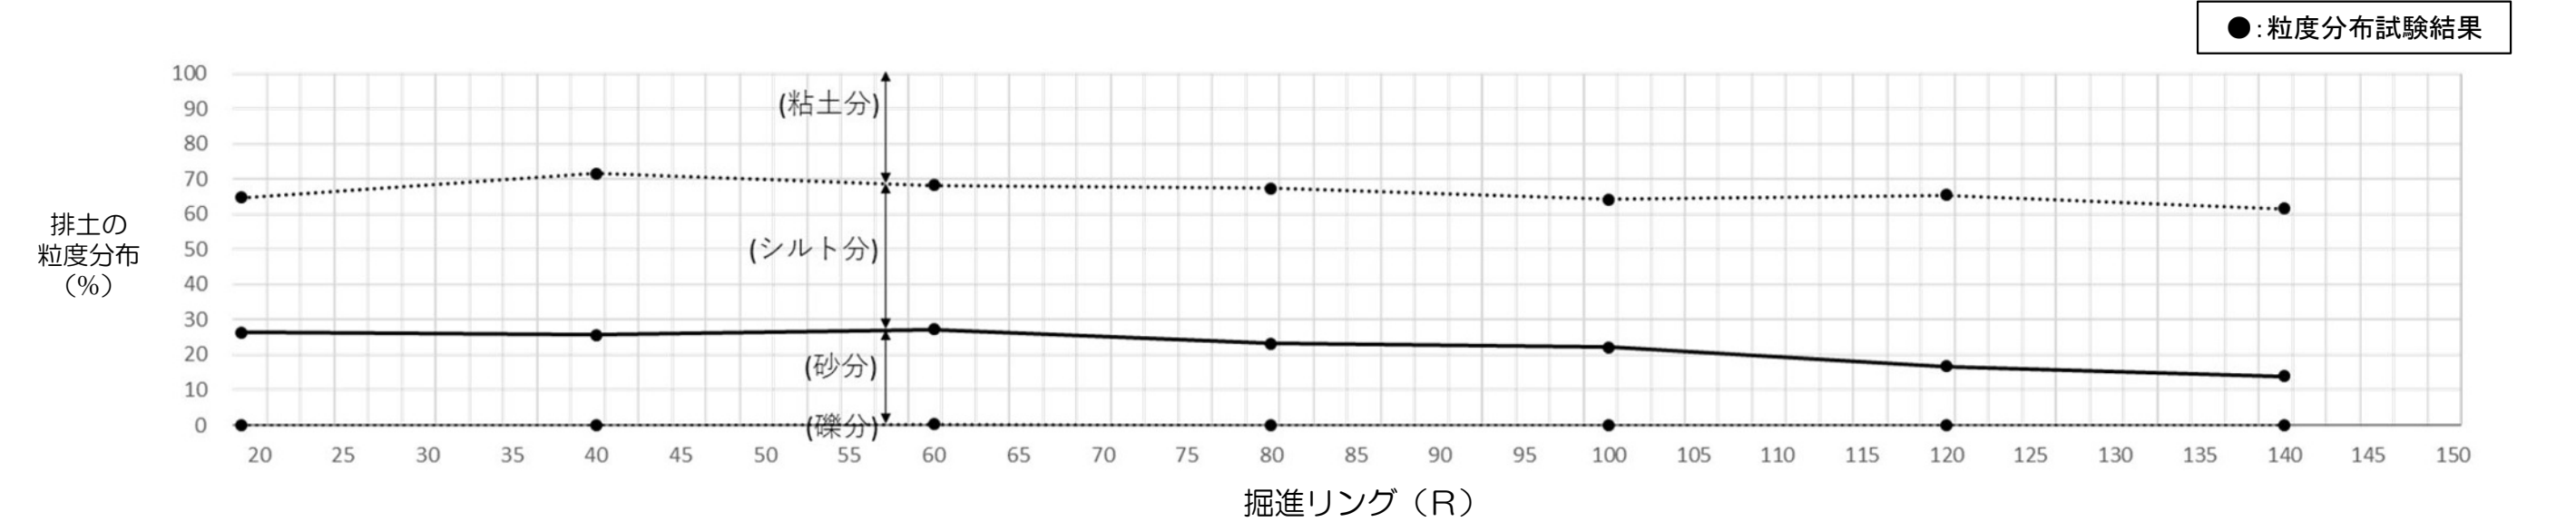

## 2. 3 排土量管理について

### 2. 3. 1 第26回東京外環トンネル施工等検討委員会で確認した再発防止対策

#### (1) 排土管理の内容について

従来は、地盤条件により地山単位体積重量が変化していくことを踏まえ、前 20 リング平均との比較により掘削土重量の傾向管理を行ってきたが、掘削土重量が徐々に増加していく場合などにおいて、過剰な取込の兆候をより早く把握するため、今後は、ボーリングデータ等から推定した地山単位体積重量を用いて1リング毎に掘削土体積を算出し、実績値と理論値とを比較する絶対値管理も併せて行っていく。

○ベルトスケールで排土重量を計測し、手前 20 リング平均との比較により以下の排土重量を管理

- ・添加材が全量回収されることを前提とし添加材の全重量を控除した地山重量
- ・添加材の重量を控除しない排土全重量

○これまでの管理値より厳しい±7.5%を 1 次管理値として設定

- ・閉塞が生じたリングの手前 20 リングでは、掘削土量が+7.5%を超過しているリングがあることを確認
- ・1 次管理値を±7.5%として設定し、閉塞及び閉塞を契機とする取り込み過剰の兆候をいち早く把握

○排土率(地山掘削土量と設計地山掘削土量の比率)による、理論値と実績値を比較する新たな指標を追加

- ・従来の排土重量の管理では手前 20 リング平均との比較にて取り込み過剰の兆候を把握するが、排土重量が徐々に増加していく場合などにおいては、さらにリング毎の排土率を確認することで、早期に兆候を把握できる可能性がある（排土率は、添加材が全量回収されることを前提とし添加材の全重量を控除した地山重量を用いて算出）

○地山単位体積重量の変化を確認

- ・掘削土体積や排土率は、地山単位体積重量をボーリングデータを用いて算出するが、10 リングかつ 1 日 1 回排土を突き固めて計測した排土単位体積重量により、地山単位体積重量の変化を確認

○添加材未回収分を考慮した排土率についても確認

- ・添加材の回収状況について、チャンバー内土圧勾配より推定したチャンバー内土砂単位体積重量を用いて確認し、過剰な土砂取込みの兆候を確認


| 管理項目             | 計測内容                                               | 管理手法                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 単位                           | 1 次管理値                | 2 次管理値               | 備考                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掘削土重量<br>(掘削土体積) | 掘削土の重量<br>(掘削土の体積)<br>(確認頻度<br>リアルタイム監視<br>毎リング管理) | (1) 添加材の全重量を控除した地山掘削重量(体積)<br>・ベルトスケールで計測した排土重量から添加材が全量回収されることを前提とし添加材の全重量を控除した地山重量で掘削土量の管理を行う。<br>・前 20 リング平均の掘削土量と比較して、大きなバラツキがないことと管理値内で掘進できていることを確認する。<br>(2) 添加材の重量を控除しない排土全重量(体積)<br>・ベルトスケールで計測した添加材の重量を控除しない排土全重量で掘削土量の管理を行う。<br>・前 20 リング平均の掘削土量と比較して、大きなバラツキがないことと管理値内で掘進できていることを確認する。 | 重量:t<br>(体積:m <sup>3</sup> ) | 前 20 リング平均<br>±7.5%以内 | 前 20 リング平均<br>±15%以内 | ・監視モニターでリアルタイムに監視<br>・ボーリングデータおよび掘削土の単位体積重量をもとに換算した掘削土体積も管理<br>(掘削土の単位体積重量を用いてボーリングデータの単位体積重量を補正)                          |
| 排土率              | 地山掘削土量と設計地山掘削土量の比率<br>(確認頻度<br>リアルタイム監視<br>毎リング管理) | (1) ベルトスケールで計測した排土重量から添加材が全量回収されることを前提とし添加材の全重量を控除した地山重量で排土率の管理を行う。                                                                                                                                                                                                                              | %                            | 設計地山掘削土量の±7.5%以内      | 設計地山掘削土量の±15%以内      | ・ボーリングデータおよび掘削土の単位体積重量をもとに換算した掘削土体積も管理<br>・添加材が地山へ浸透している場合は、排土率が過少に評価される                                                   |
|                  |                                                    | (2) チャンバー内土砂の理論単位体積重量とチャンバー内圧力勾配から推定される単位体積重量とを比較することにより添加材の浸透量を評価し、それを考慮した排土率の管理を行う。                                                                                                                                                                                                            | %                            | 設計地山掘削土量の<br>±7.5%以内  |                      | ・ボーリングデータおよび掘削土の単位体積重量をもとに換算した掘削土体積も管理<br>・添加材の浸透量を評価し、それを考慮した掘削土体積も管理<br>・自立性が高い粘性土等では、チャンバー内圧力勾配から推定される単位体積重量が適応しない場合がある |

## 2. 3. 2 東名JCT Hランプシールトトンネル工事での対応状況


### (1) 掘削土重量管理

添加材の全重量を控除した地山掘削土重量および添加材の重量を控除しない排土全重量について、管理掘進フローに基づき、前20リング平均の掘削土重量と比較して大きなバラツキがなく、管理値内で掘進できていることを確認した。

#### ① ベルトスケール排土重量（溶液控除）（t）

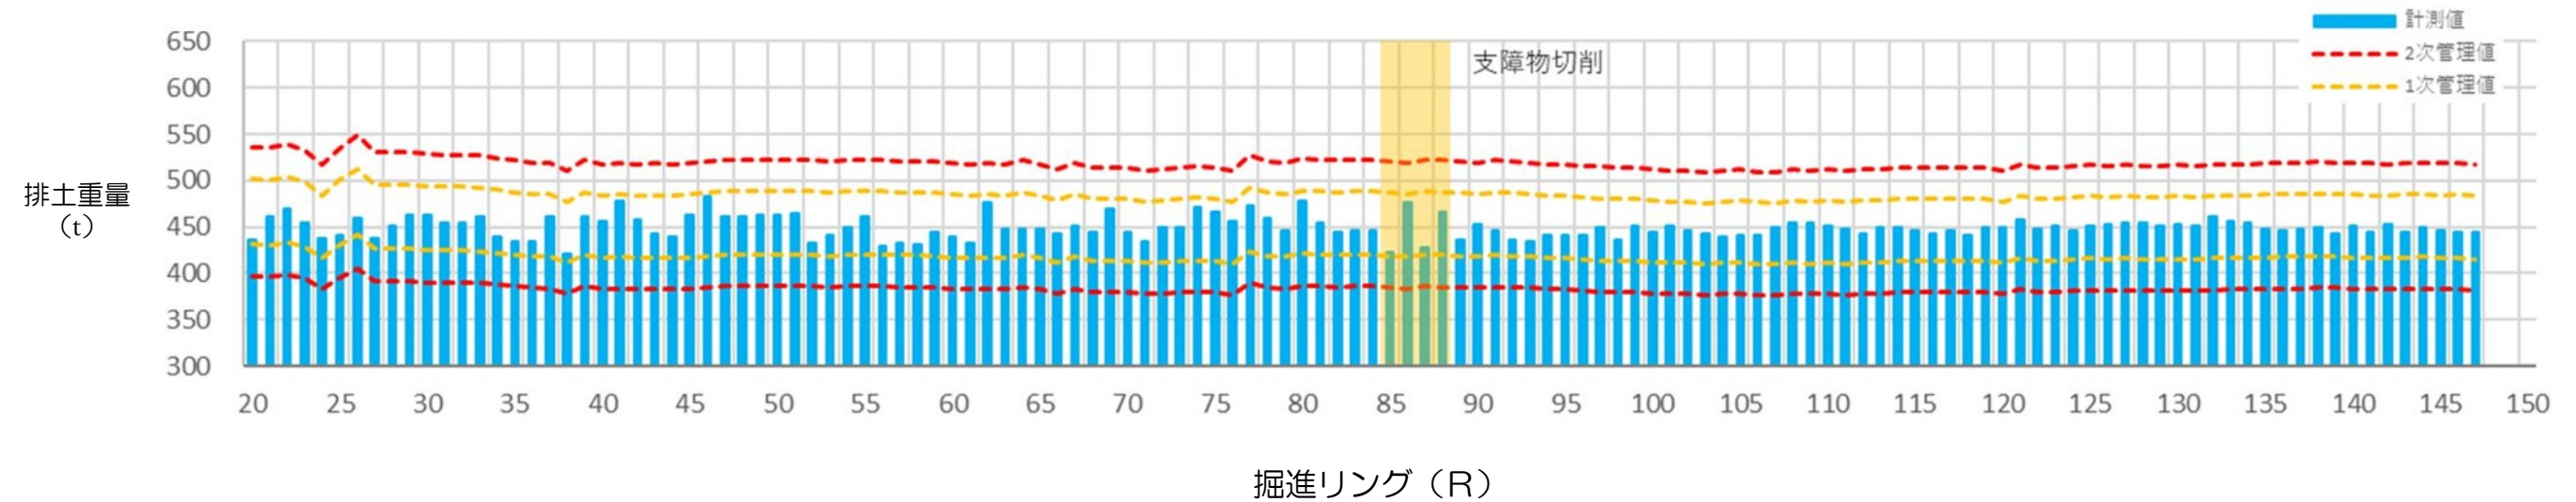



#### ② ベルトスケール排土重量（全重量）（t）

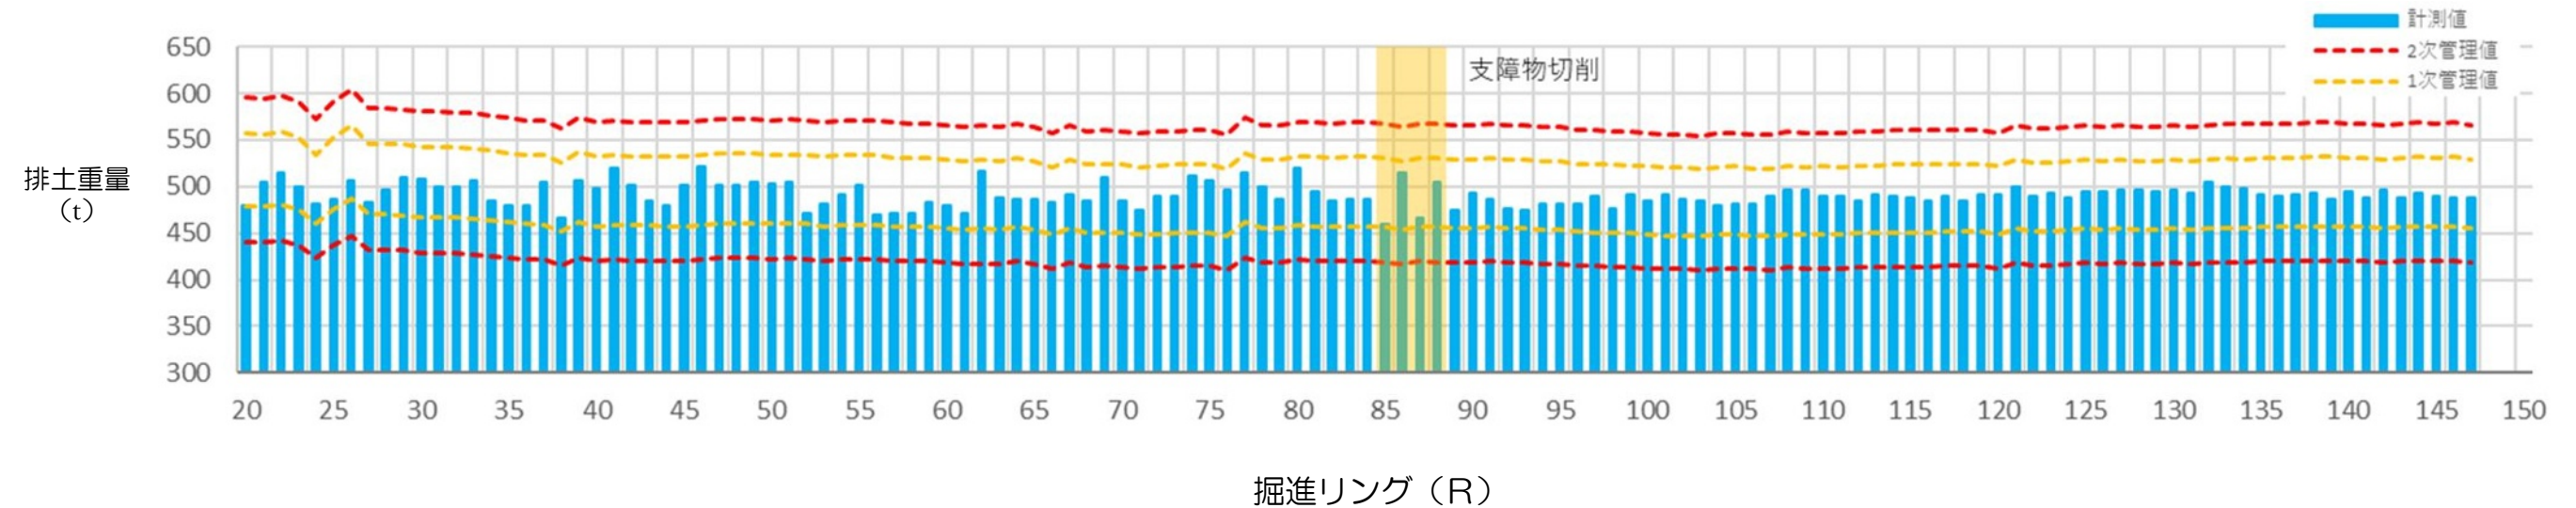

■排土重量のリアルタイムの監視状況

ベルトスケールで計測した排土重量を掘進管理システムの監視モニターでリアルタイムに監視している。

105Ring 排土重量リアルタイム監視状況

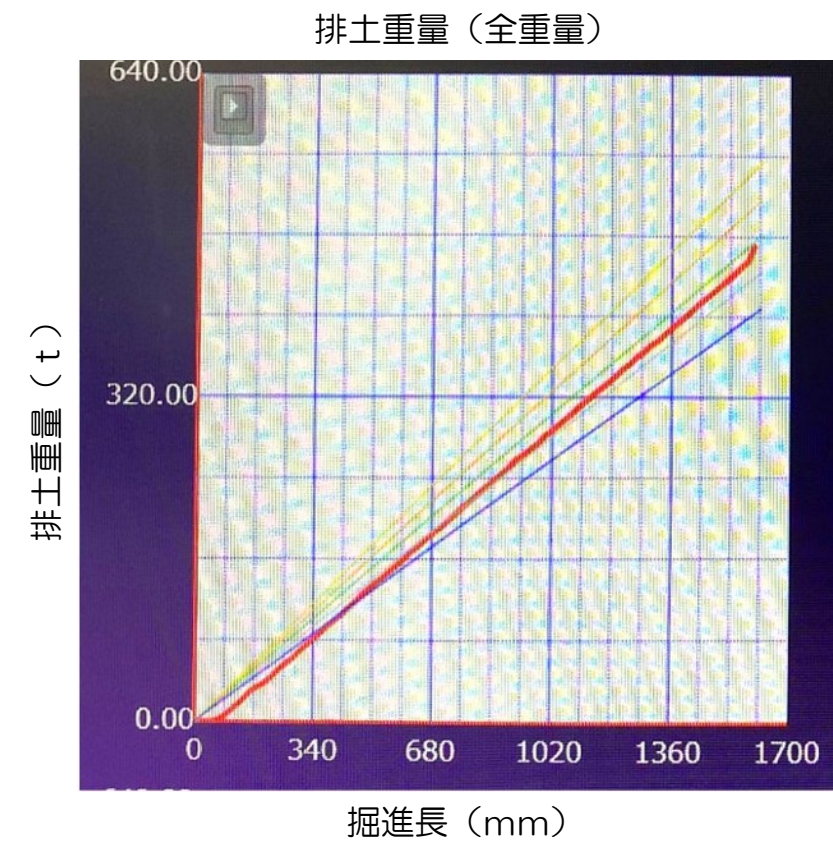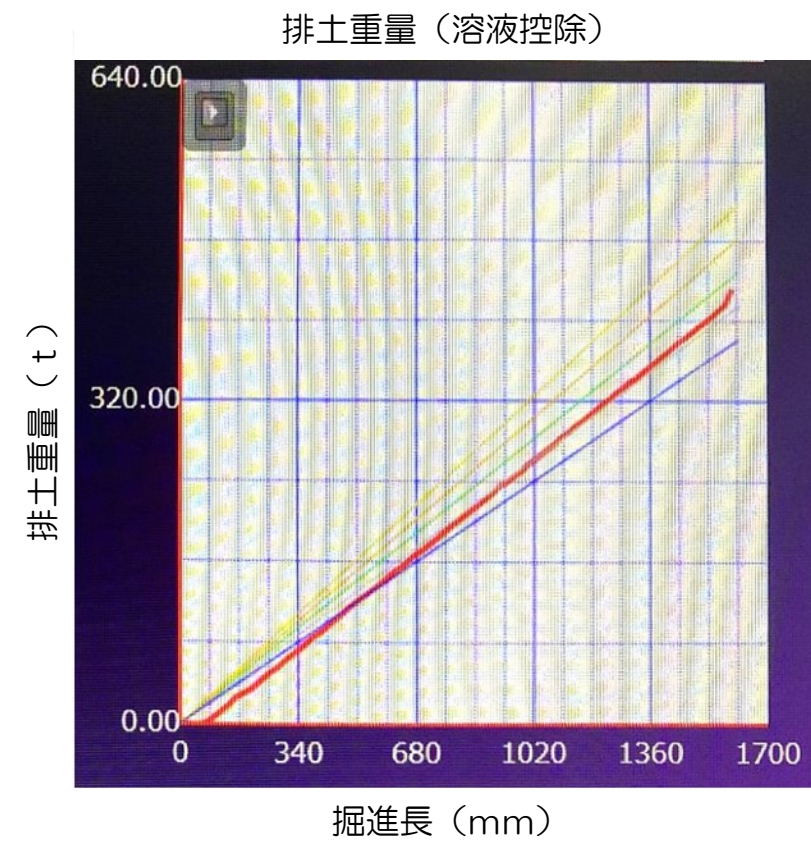


※計測値は掘進開始時の初期値を0で設定し、意図的に排土開始のタイミングを遅らせて所定の切羽圧力を保持している。

また、排土重量を計測するベルトスケールの位置がスクリーコンベアの後ろになるため初期の計測値が遅れて記録される。最終値はマシン停止後にもベルトスケール上を通過するため遅れて記録される。


## （２）掘削土体積管理

添加材全量を控除した地山掘削土体積および添加材全量を控除しない掘削土体積について、管理掘進フローに基づき、前20リング平均の掘削土量と比較して大きなバラつきがなく、管理値内で掘進できていることを確認した。

### ① 掘削土体積（添加材全量回収、溶液控除）（m<sup>3</sup>）

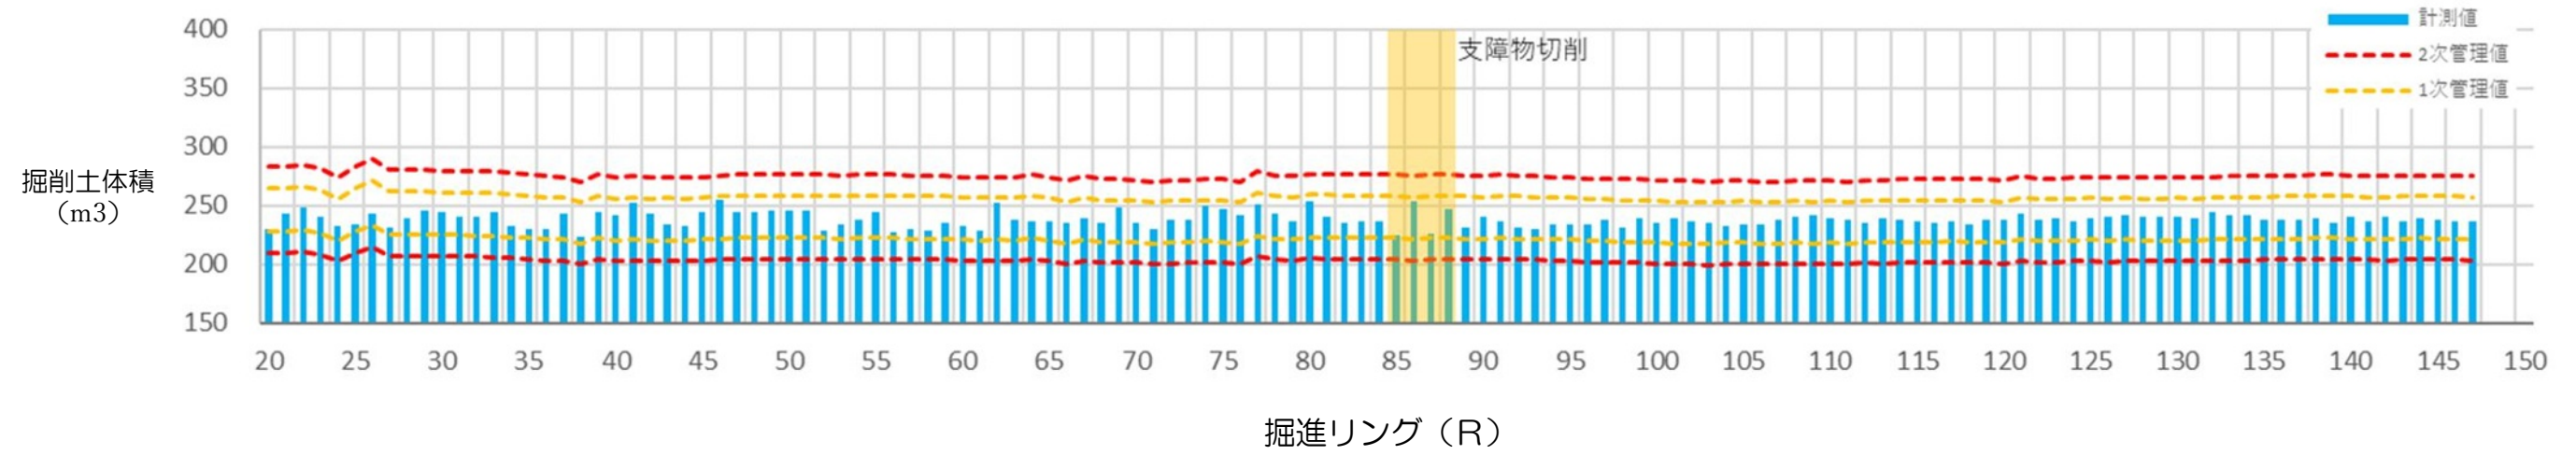



### ② 掘削土体積（全体積）（m<sup>3</sup>）

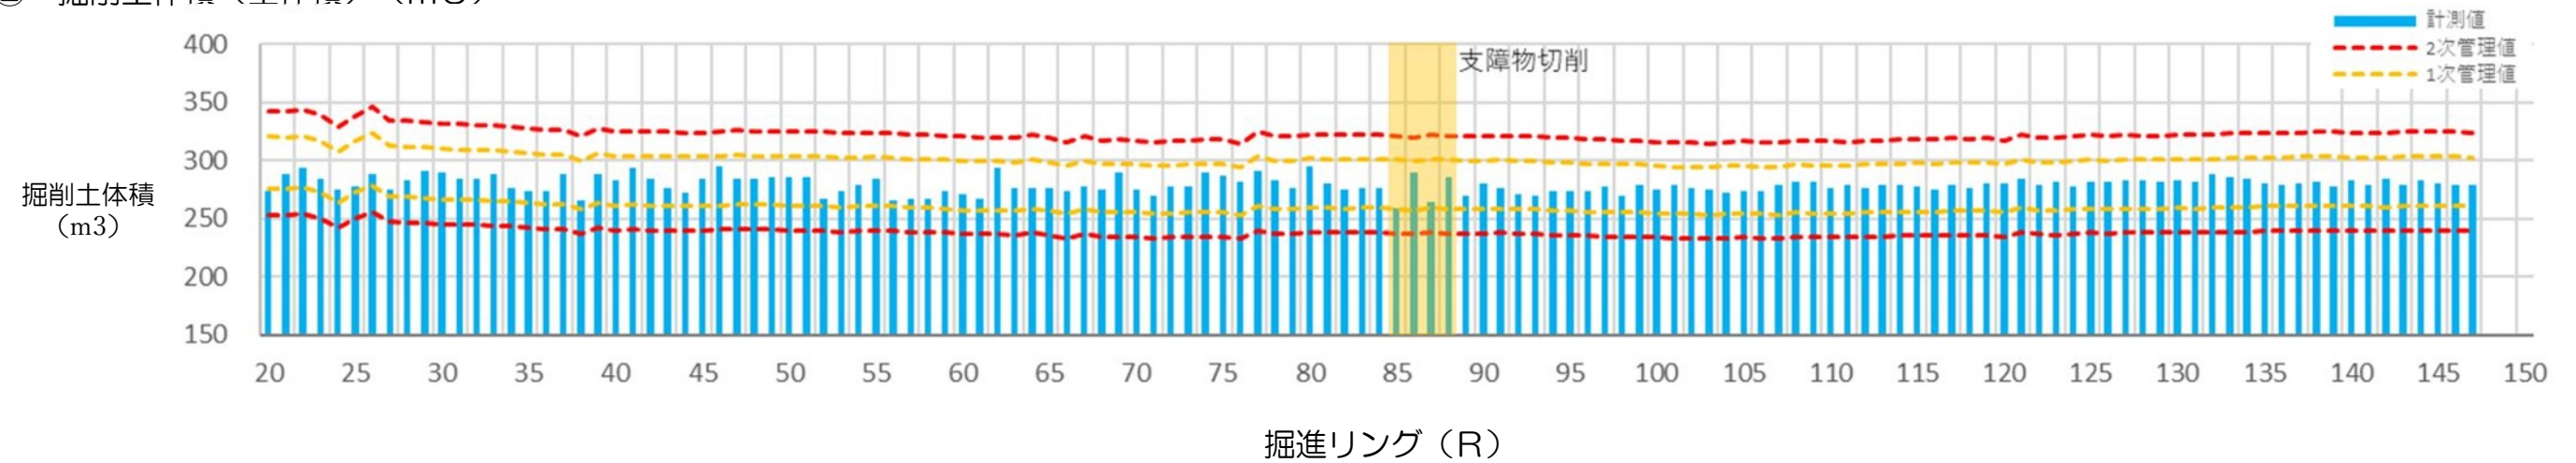

■排土重量のリアルタイムの監視状況

ベルトスケールで計測した排土重量から単位体積重量を用いて算出した掘削土体積を掘進管理システムの監視モニターでリアルタイムに監視している。

105Ring 掘削土体積リアルタイム監視状況

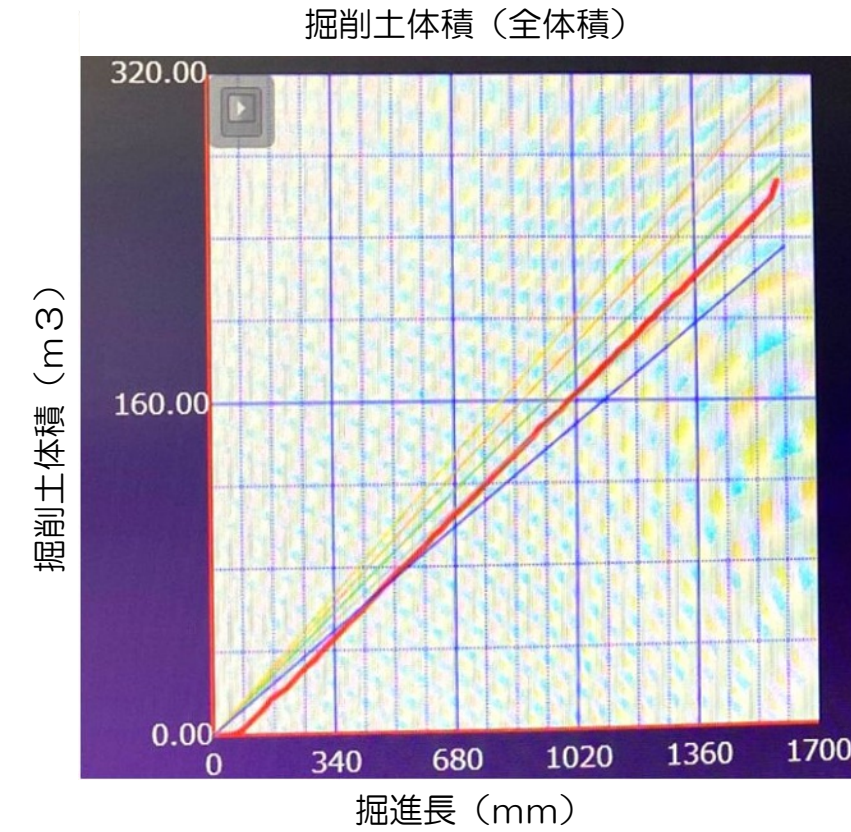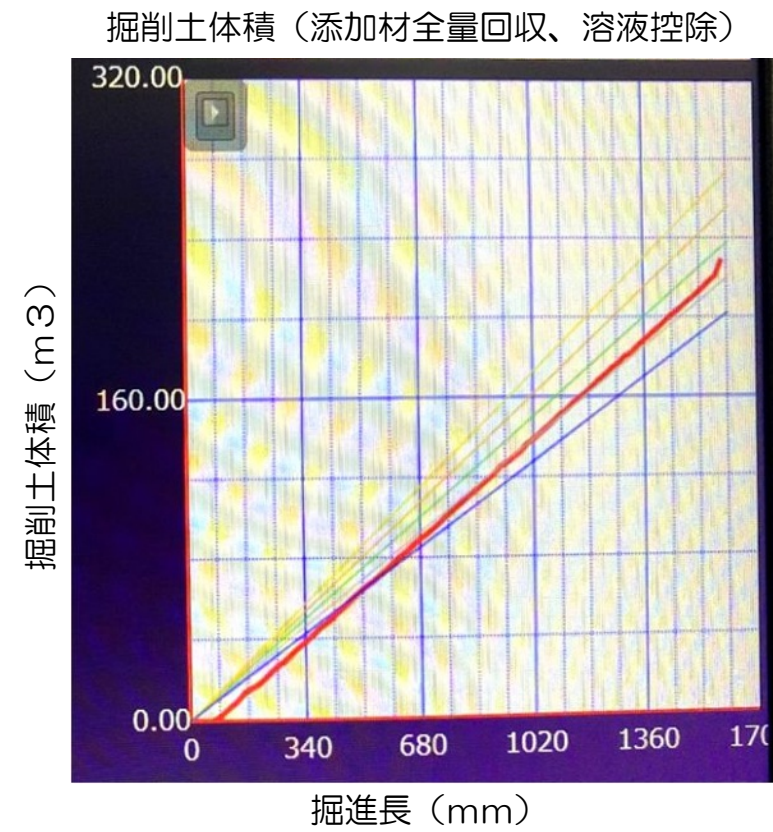

※計測値は掘進開始時の初期値を0で設定し、意図的に排土開始のタイミングを遅らせて所定の切羽圧力を保持している。

また、排土重量を計測するベルトスケールの位置がスクリーコンベアの後ろになるため初期の計測値が遅れて記録される。最終値はマシン停止後にもベルトスケール上を通過するため遅れて記録される。

### (3) 排土率管理


管理掘進フローに基づき、ベルトスケールで計測した排土重量から添加材が全量回収されることを前提とし添加材の全重量を控除した地山重量から算出した排土率を確認した。また、チャンバー内土砂の理論単位体積重量とチャンバー内圧力勾配から推定される単位体積重量を比較することにより添加材の地山への浸透量を評価し、それを考慮した排土率を確認した。

排土率（浸透量考慮、溶液控除）は、掘進開始時より下限側の1次管理値を超過している状況が確認されたことから、掘進管理フローに基づき、


- ・リアルタイムでマシン負荷(カッタートルク、掘進推力)に異常がない
- ・掘削土重量の変動傾向は安定しており、チャンバー内圧力勾配から求められる単位体積重量、排土を突き固めて得られる単位体積重量の変化の傾向と整合している
- ・チャンバー内圧力勾配の直線性やカッタートルク、排土性状の変化から塑性流動性などの施工データを確認した結果、塑性流動性の悪化の傾向は確認されていない
- ・カッタートルクや掘進推力は安定しており、マシン負荷に異常の傾向は確認されていない

ことから、取り込み過多・過少の兆候を確認されておらず、リング毎に掘進継続の判断を行っている。なお、排土率（浸透量考慮、溶液控除）が低くなる傾向については、自立性の高い粘性土が卓越する地盤であり、チャンバー内圧力勾配から推定される単位体積重量が適応しないこと等が要因であると推察されるため、今後は参考扱いとする。

#### ① 排土率（添加材全量回収）


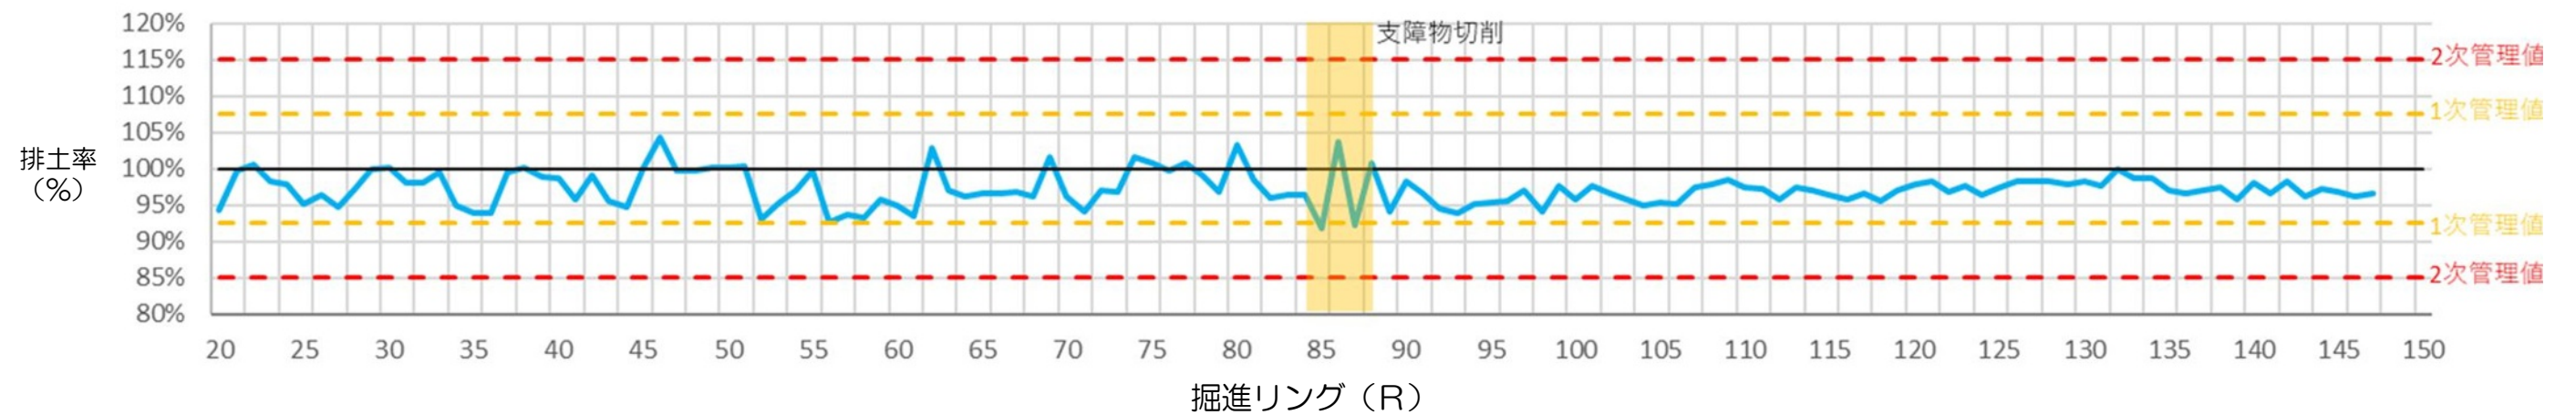


#### 【参考】 排土率（浸透量考慮、溶液控除）

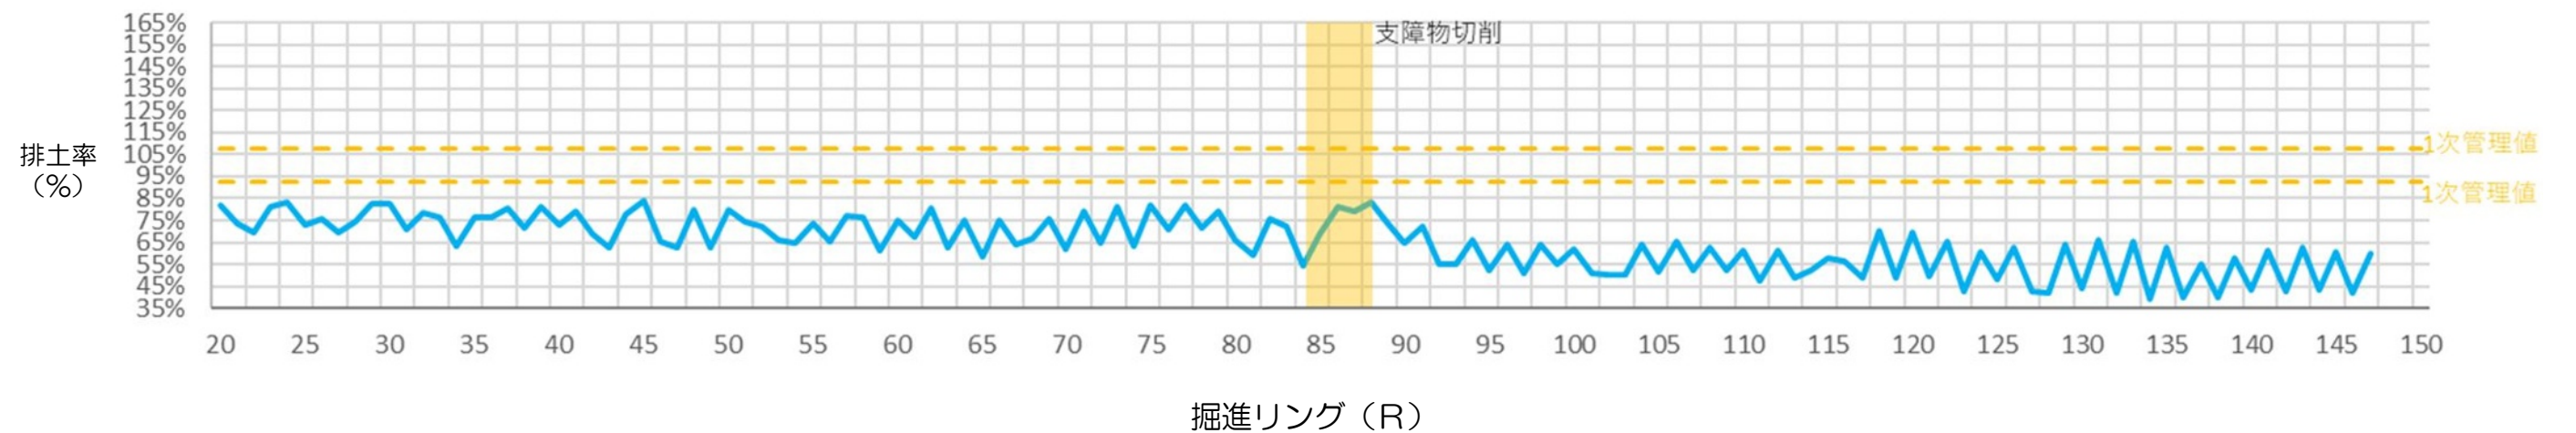

■排土率のリアルタイムの監視状況


「添加材を全量回収されることを想定した排土率」と「添加材の浸透量を考慮した排土率」それぞれについて、掘進管理システムの監視モニターでリアルタイムに監視している。

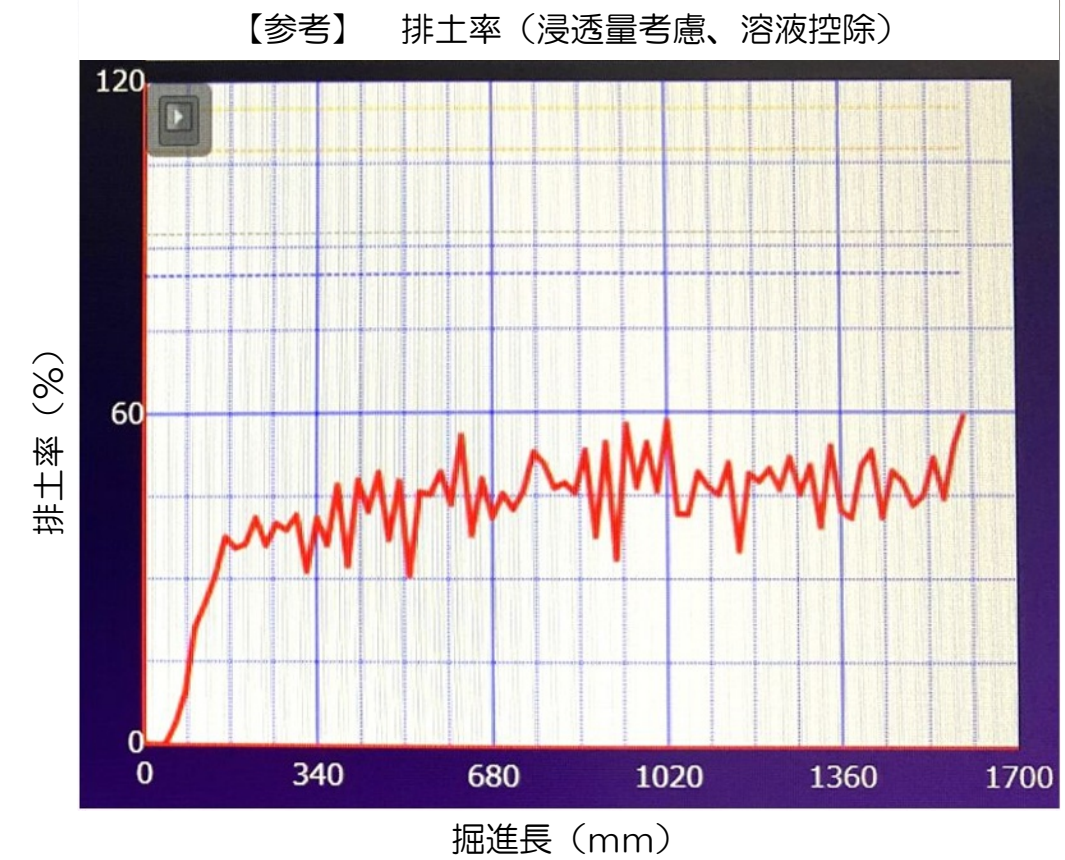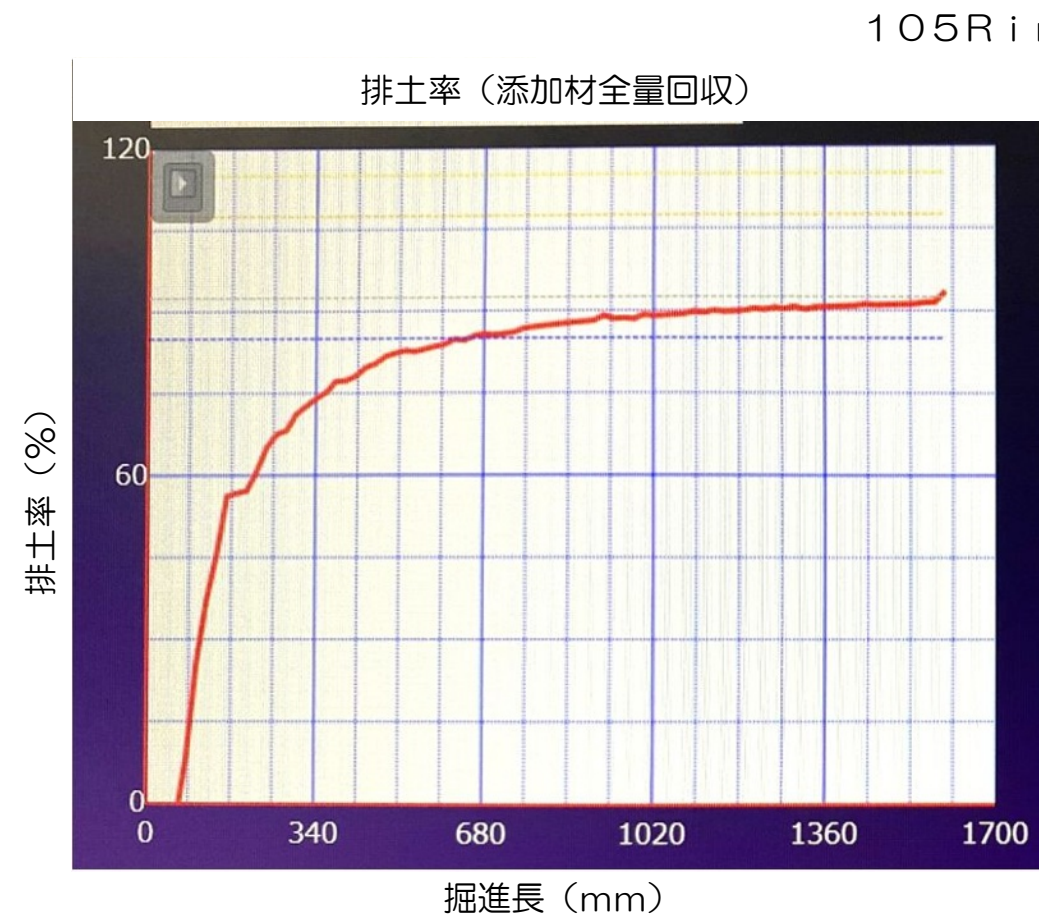


※計測値は掘進開始時の初期値を0で設定し、意図的に排土開始のタイミングを遅らせて所定の切羽圧力を保持している。

また、排土重量を計測するベルトスケールの位置がスクリーコンベアの後ろになるため初期の計測値が遅れて記録される。最終値はマシン停止後にもベルトスケール上を通過するため遅れて記録される。

チャンバー内圧力勾配から推定した単位体積重量

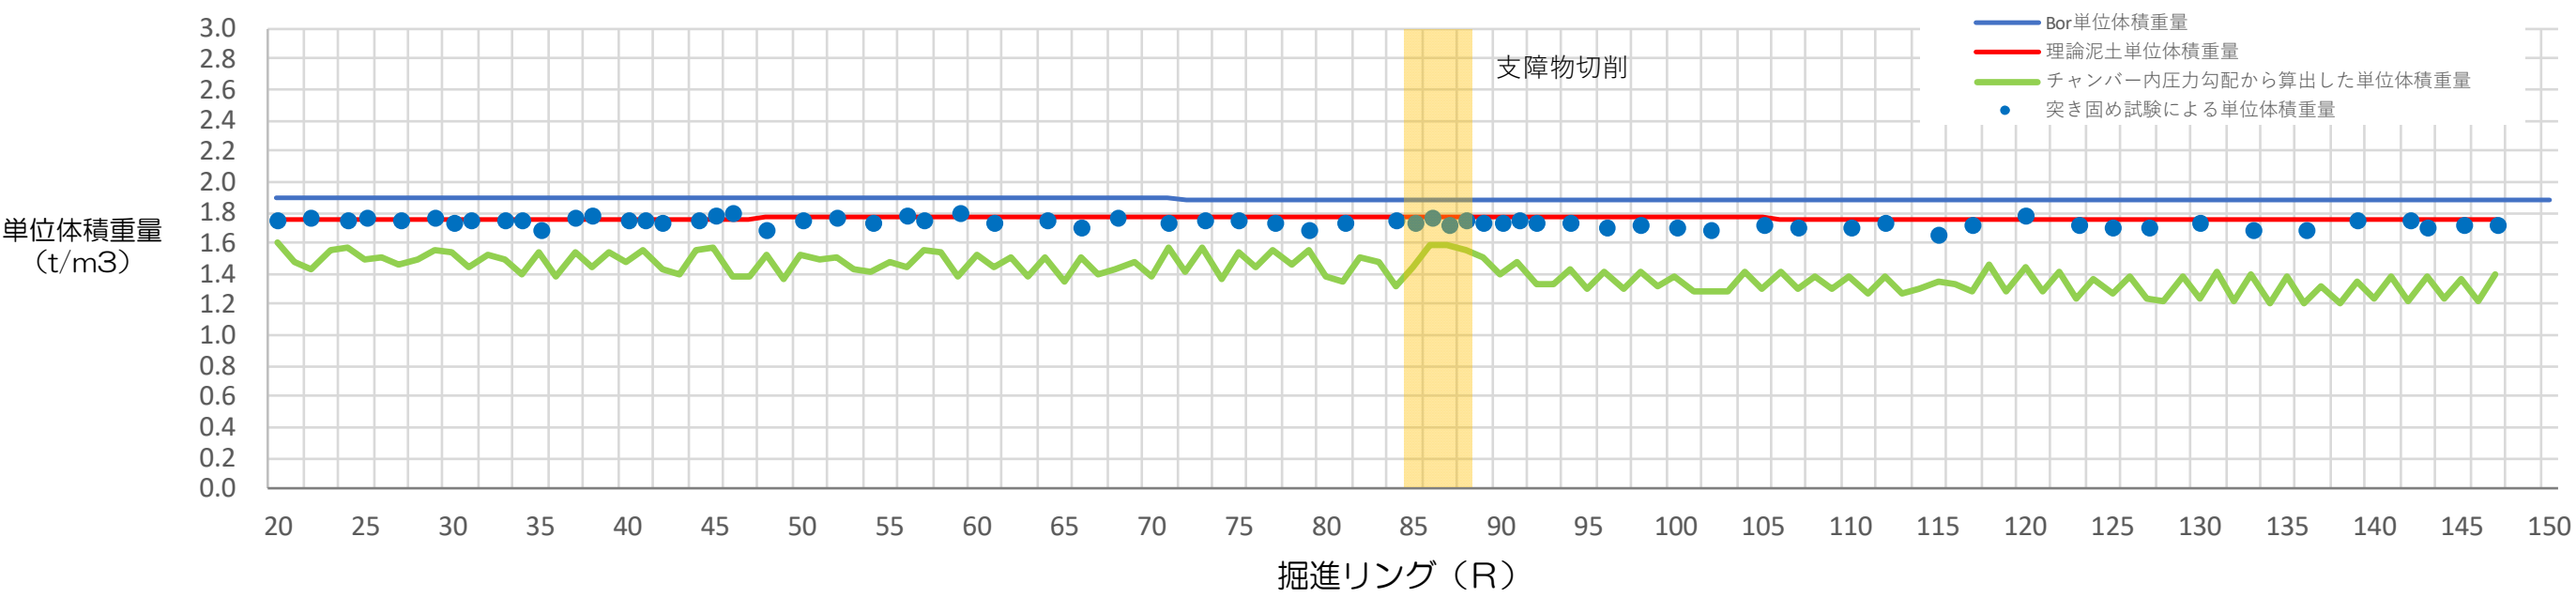

粒度分布試験結果

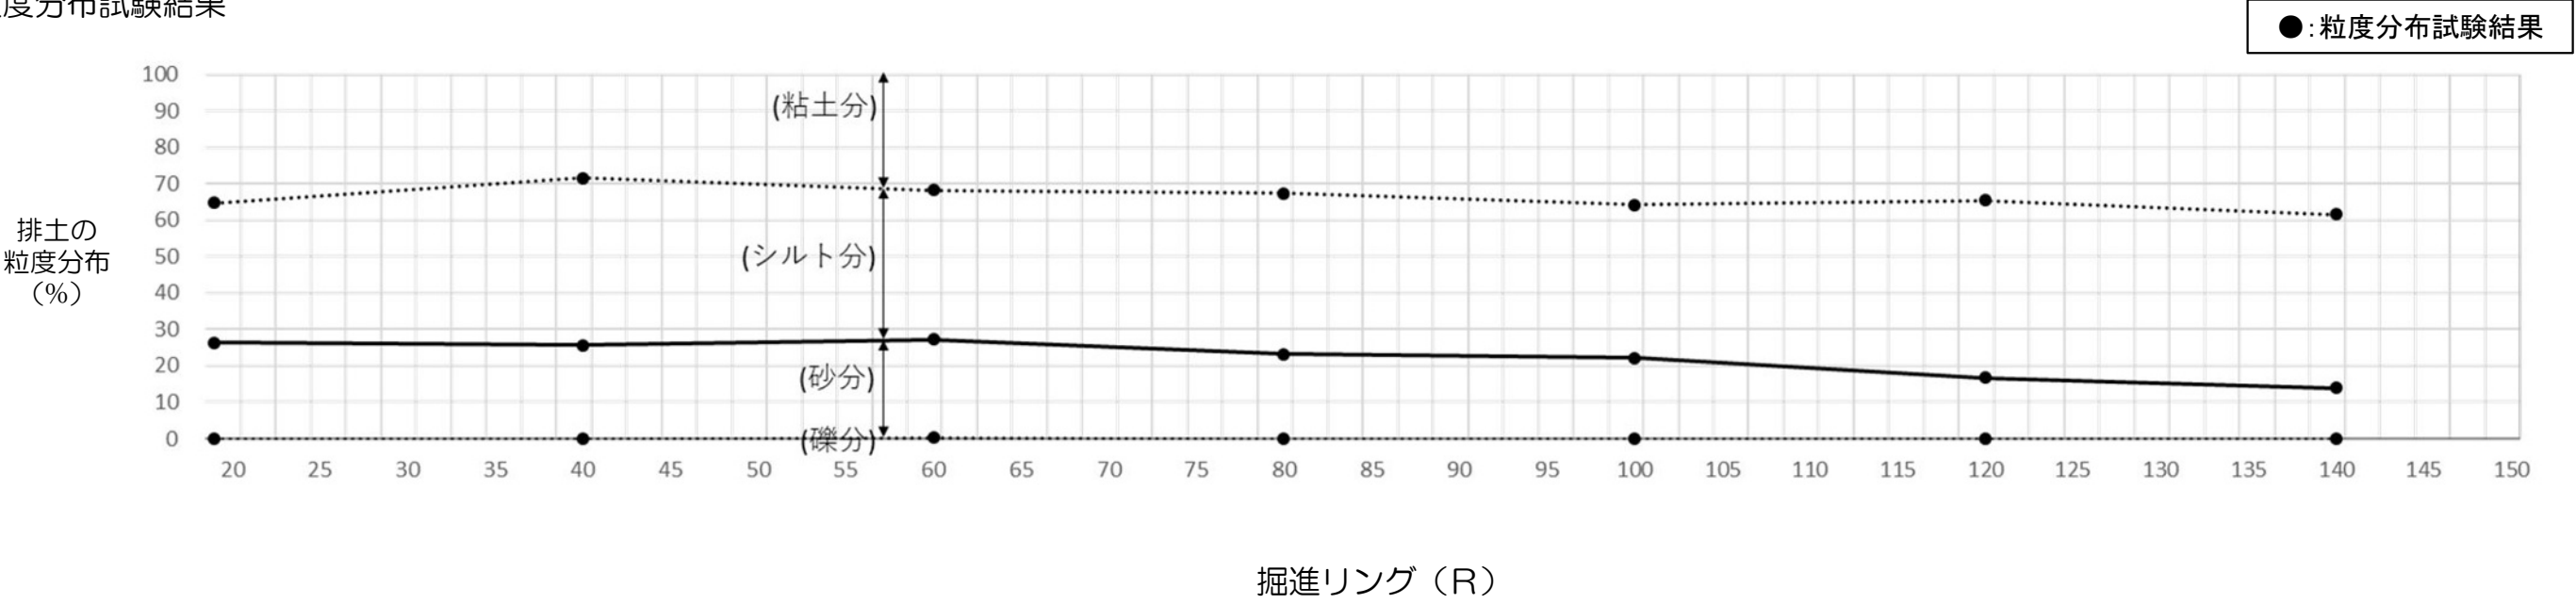

## 2. 4 掘進管理項目および掘進管理基準に関する施工データ


2. 4. 1 第26回東京外環トンネル施工等検討委員会で確認した再発防止対策  
赤枠に示す管理項目の施工データを次ページに示す。

| 管理項目     |              | 監視・測定項目等（旧）これまでの管理                                                                    | （新）今後の管理                                                                                                                           |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カッター     | カッタートルク      | 管理値：装備トルクの 80%以下                                                                      | 変更なし                                                                                                                               |
|          |              | 管理方法：モニターでリアルタイムで管理                                                                   | ※カッターヘッド回転不能（閉塞）時は、掘進を一時停止し、原因究明・対策検討を十分に実施                                                                                        |
|          |              |                                                                                       | 管理方法：モニターでリアルタイムで管理                                                                                                                |
| シールドジャッキ | 推力           | 推力：装備推力の 80%以下<br>管理方法：モニターでリアルタイムで管理                                                 | 変更なし                                                                                                                               |
| 掘進速度     | 掘進速度         | 標準掘進速度：30 mm/min<br>管理方法：モニターでリアルタイムで管理                                               | 変更なし                                                                                                                               |
| マシン方向制御  | 方位           | 一次管理値：設計値±0.2°<br>二次管理値：設計値±0.4°                                                      | 変更なし                                                                                                                               |
|          |              |                                                                                       |                                                                                                                                    |
|          | ピッチング        | 一次管理値：設計値±0.2°<br>二次管理値：設計値±0.4°                                                      | 変更なし                                                                                                                               |
|          |              |                                                                                       |                                                                                                                                    |
|          | ローリング        | 一次管理値：±0.2°<br>二次管理値：±0.35°                                                           | 変更なし                                                                                                                               |
|          |              |                                                                                       |                                                                                                                                    |
|          | 位置計測         | 一次管理値：蛇行量 30 mm<br>二次管理値：蛇行量 40 mm<br>管理値：蛇行量 50 mm                                   | 変更なし                                                                                                                               |
|          |              |                                                                                       |                                                                                                                                    |
|          |              |                                                                                       |                                                                                                                                    |
| 土圧       | チャンバー内土圧     | 管理土圧：主働土圧+水圧+予備圧(0.02MPa)<br>管理方法：切羽圧力計計測結果をリアルタイムで管理                                 | 管理土圧：主働土圧+水圧+予備圧(0.02MPa)<br>チャンバー内圧力値をリアルタイムにて管理（チャンバー内圧力分布から圧力勾配の傾きと直線性を確認、必要に応じて改善を実施）                                          |
|          |              |                                                                                       |                                                                                                                                    |
| 排土管理     | 掘削土量         | 1 次管理値：前 20R 平均掘削土量±10%以内<br>2 次管理値：前 20R 平均掘削土量±20%以内<br>管理方法：ベルトスケールの計量結果をリアルタイムで管理 | 1 次管理値：前 20R 平均掘削土量±7.5%以内<br>2 次管理値：前 20R 平均掘削土量±15%以内<br>管理方法：ベルトスケールの計量結果をリアルタイムで管理                                             |
|          | 排土率          | -<br>-<br>-                                                                           | 1 次管理値：設計掘削土量の排土率±7.5%以内<br>2 次管理値：設計掘削土量の排土率±15%以内<br>添加材の浸透を考慮した排土率も確認 管理値：±7.5%以内                                               |
|          |              |                                                                                       |                                                                                                                                    |
|          | 土砂性状         | 手触、目視により、土砂性状や地山土層の変化を確認<br>-<br>粒度分布試験を実施し、掘削地山の土層を把握（確認頻度：1回/週を基本）                  | 手触、目視により、土砂性状や地山土層の変化を確認<br>ミニスランプ試験値：事前配合試験結果および直近の掘削土の性状と比較<br>粒度分布試験を実施し、掘削地山の土層を把握（確認頻度：20 リングに 1 回を基本とし、塑性流動性のモニタリングに応じて適宜実施） |
|          |              |                                                                                       |                                                                                                                                    |
|          |              |                                                                                       |                                                                                                                                    |
| 裏込注入工    | 注入圧          | 注入圧：切羽圧+0.2Mpa                                                                        | 変更なし                                                                                                                               |
|          | 注入量          | 注入率：100%以上                                                                            |                                                                                                                                    |
|          |              | 管理方法：モニターでリアルタイムで管理。基本的に設定注入圧以上、100%以上の注入率、地山によって注入量は変化する                             |                                                                                                                                    |
| 地表面変位    | 掘進時、掘進停止中、事後 | 管理値：地表面傾斜角 1.0/1000rad 以下                                                             | 変更なし                                                                                                                               |

## 2. 4. 2 掘進管理項目および掘進管理基準に関する施工データ


掘進フローに基づき、掘進推力、チャンバー内圧力について、管理基準値内で掘進できていることを確認した。

裏込注入圧については、小土被り区間であることから、切羽土圧+200kPaで管理をすると地表面への影響が懸念されるため、天端付近の鉛直土水圧を目標圧力と設定し、注入量（裏込注入率）を確認しながら慎重に施工した。また、144R付近で下側テールクリアランスの拡大がみられたため、裏込注入圧の目標値を低下させ掘進を行った。


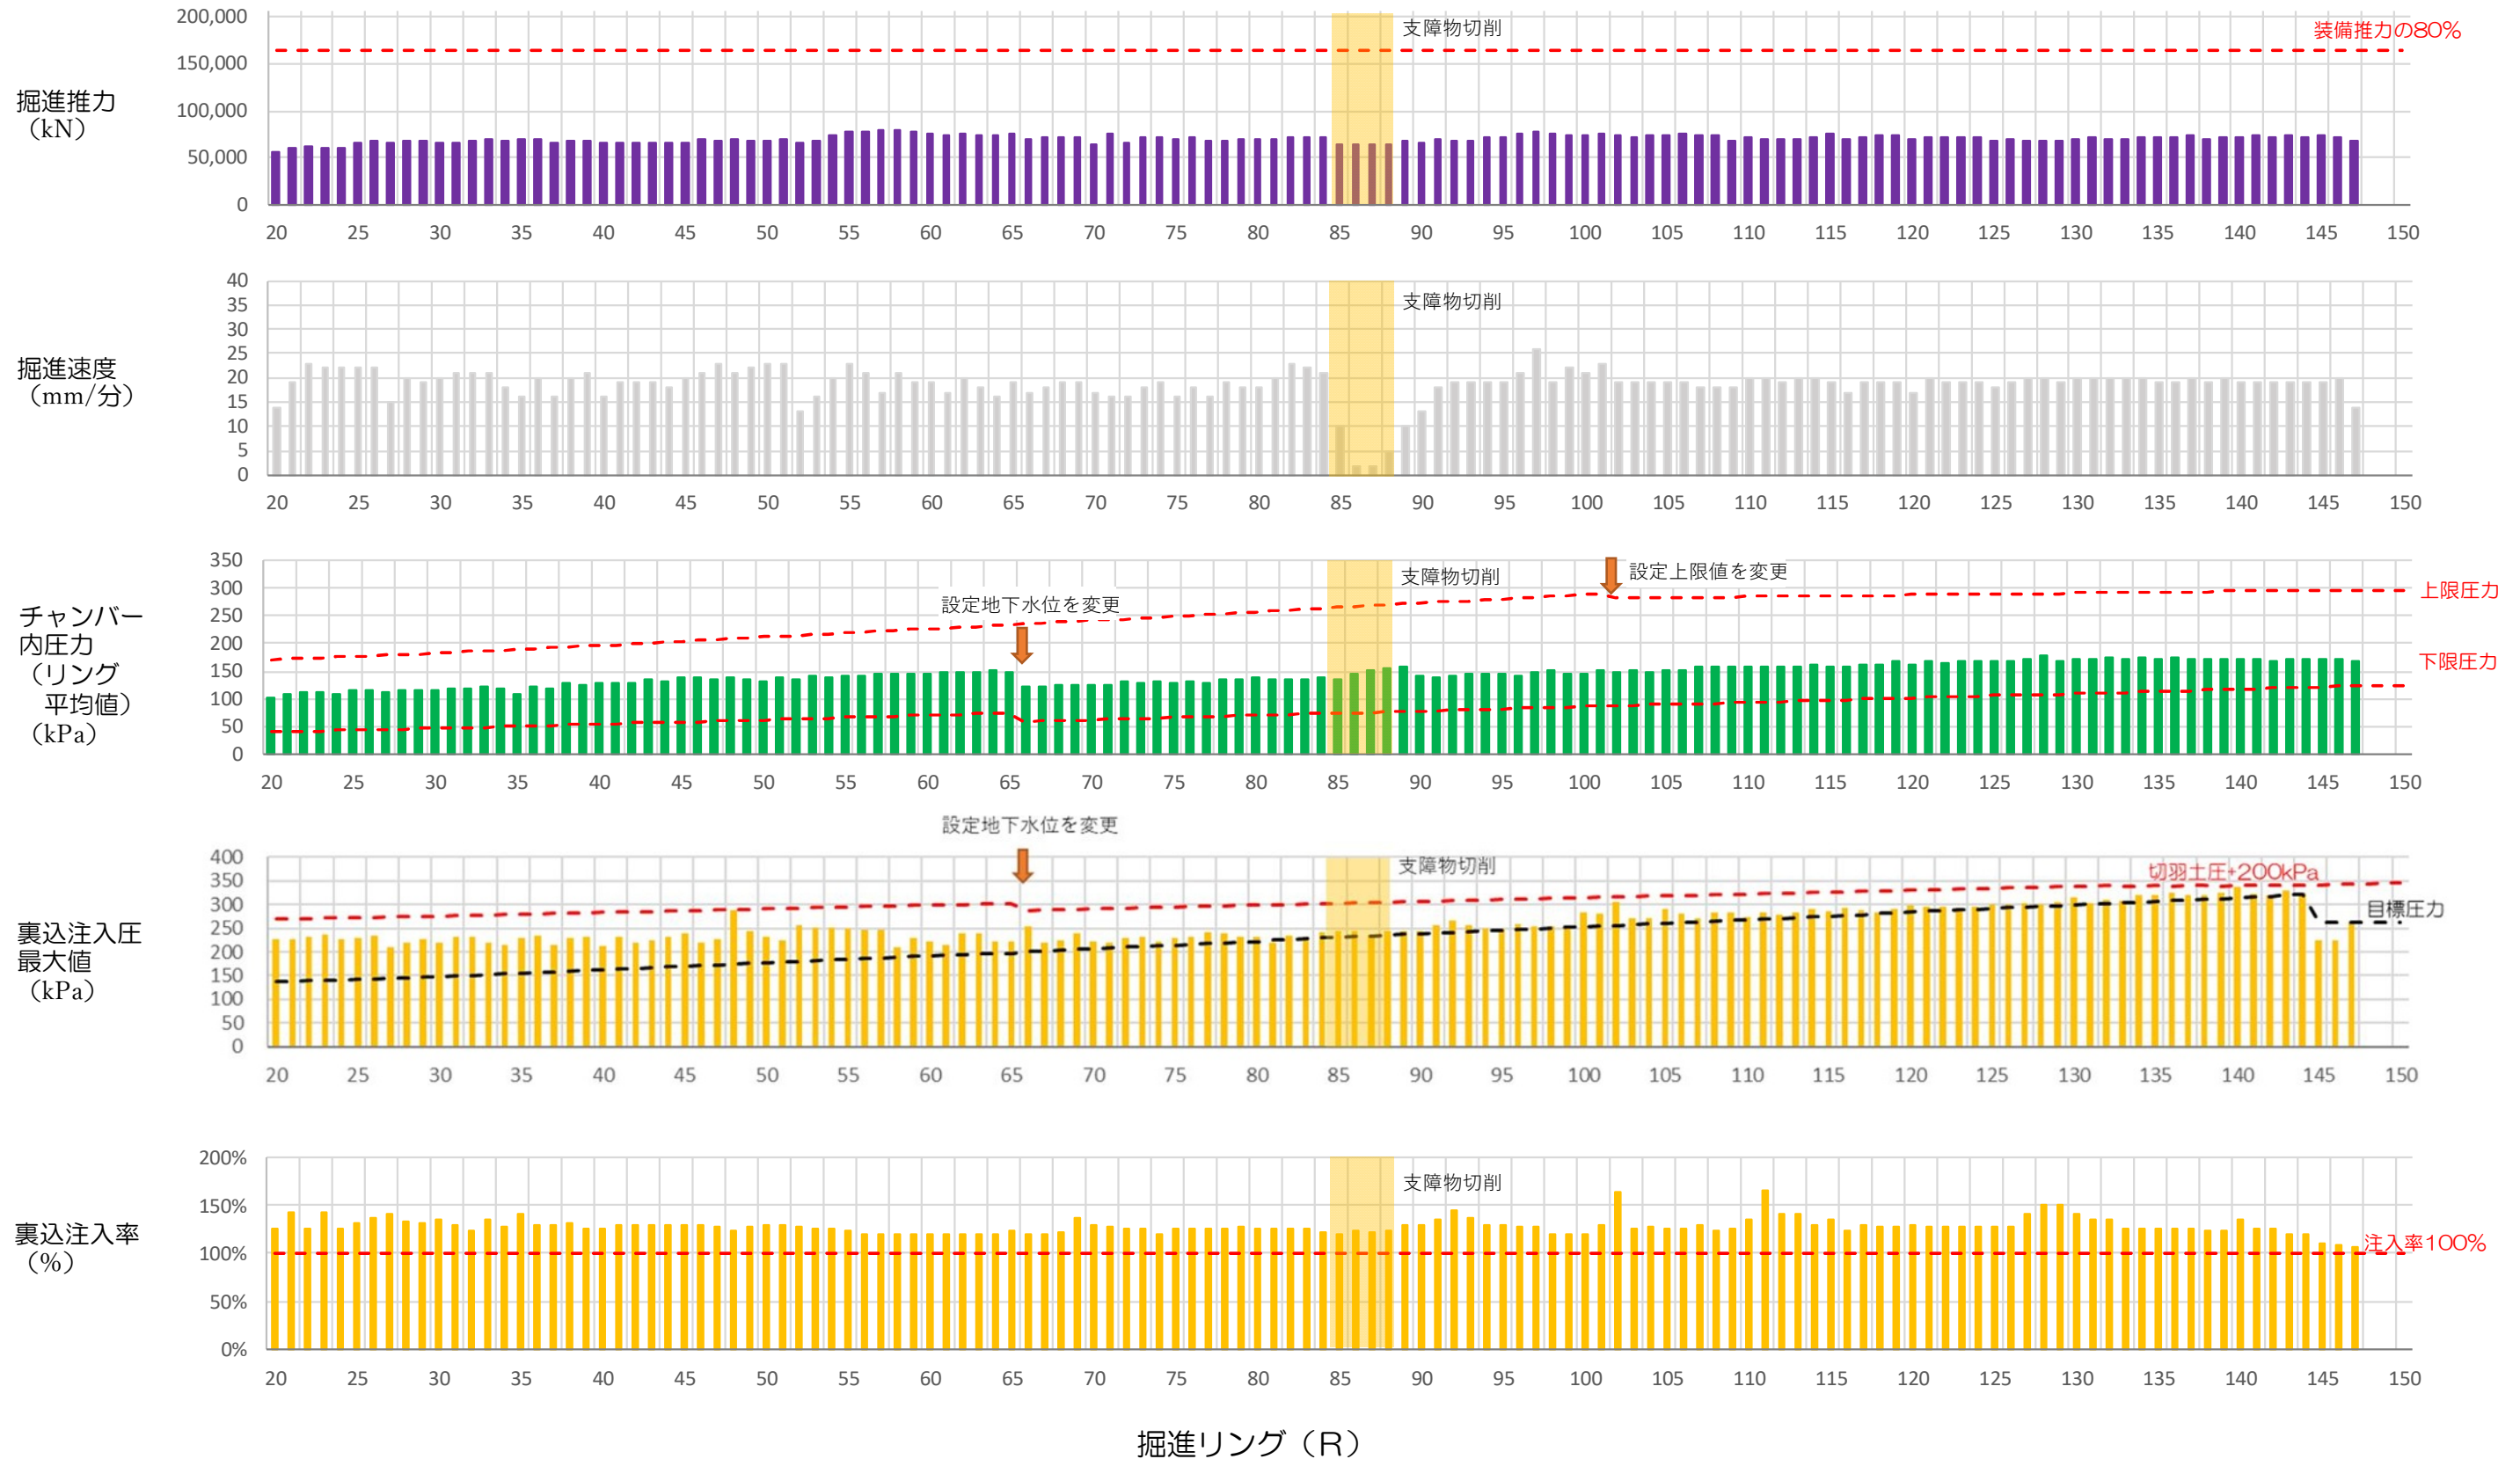


マシン方向制御の掘進管理項目、およびセグメント位置について管理値内で掘進できていることを確認した。なお、線形蛇行量上下について、支障物（下水道管）掘削区間において支障物切削による影響をできるだけ小さくするため、下側の一次管理値付近での掘削となるよう施工したものである。


■マシン方向制御

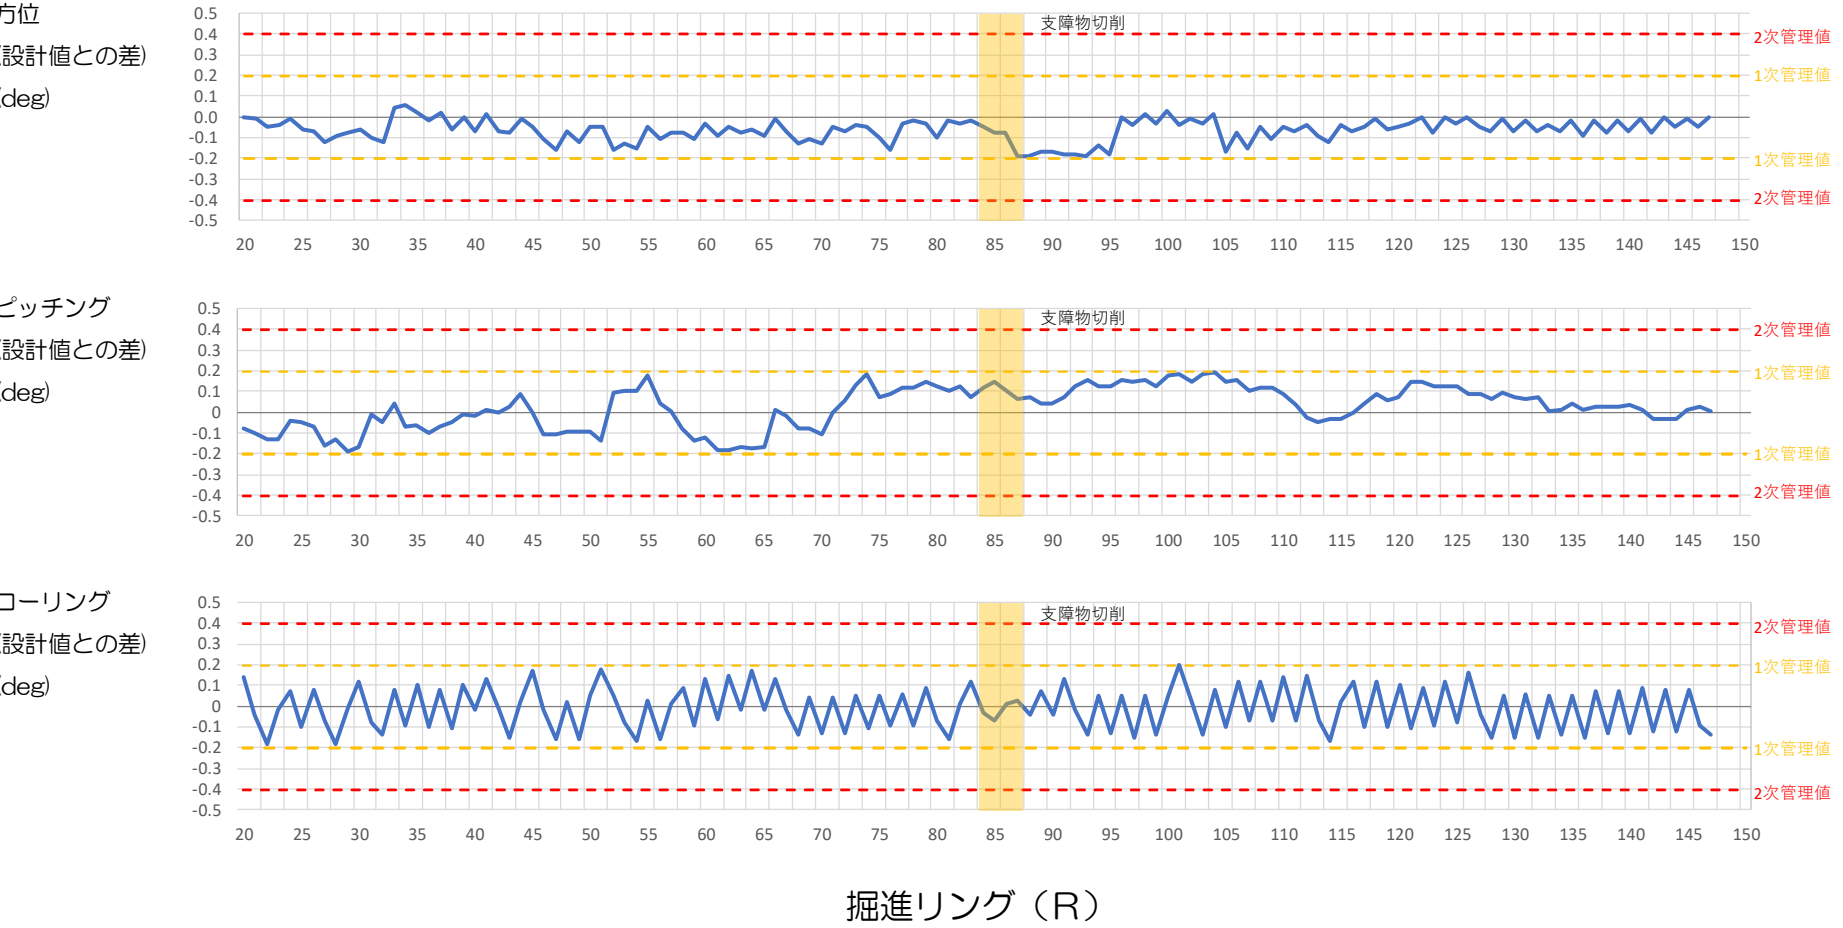

■セグメント位置（蛇行量）

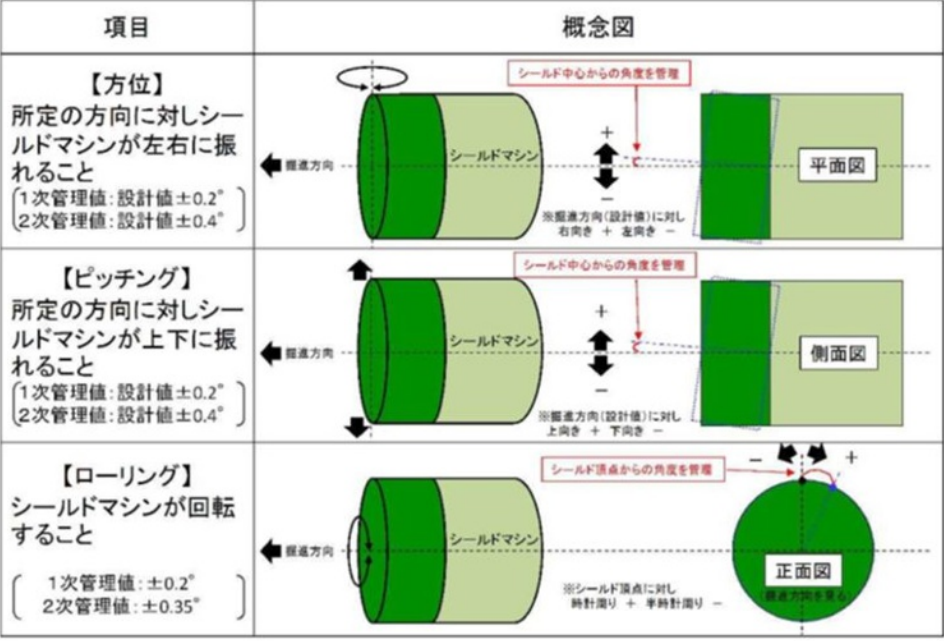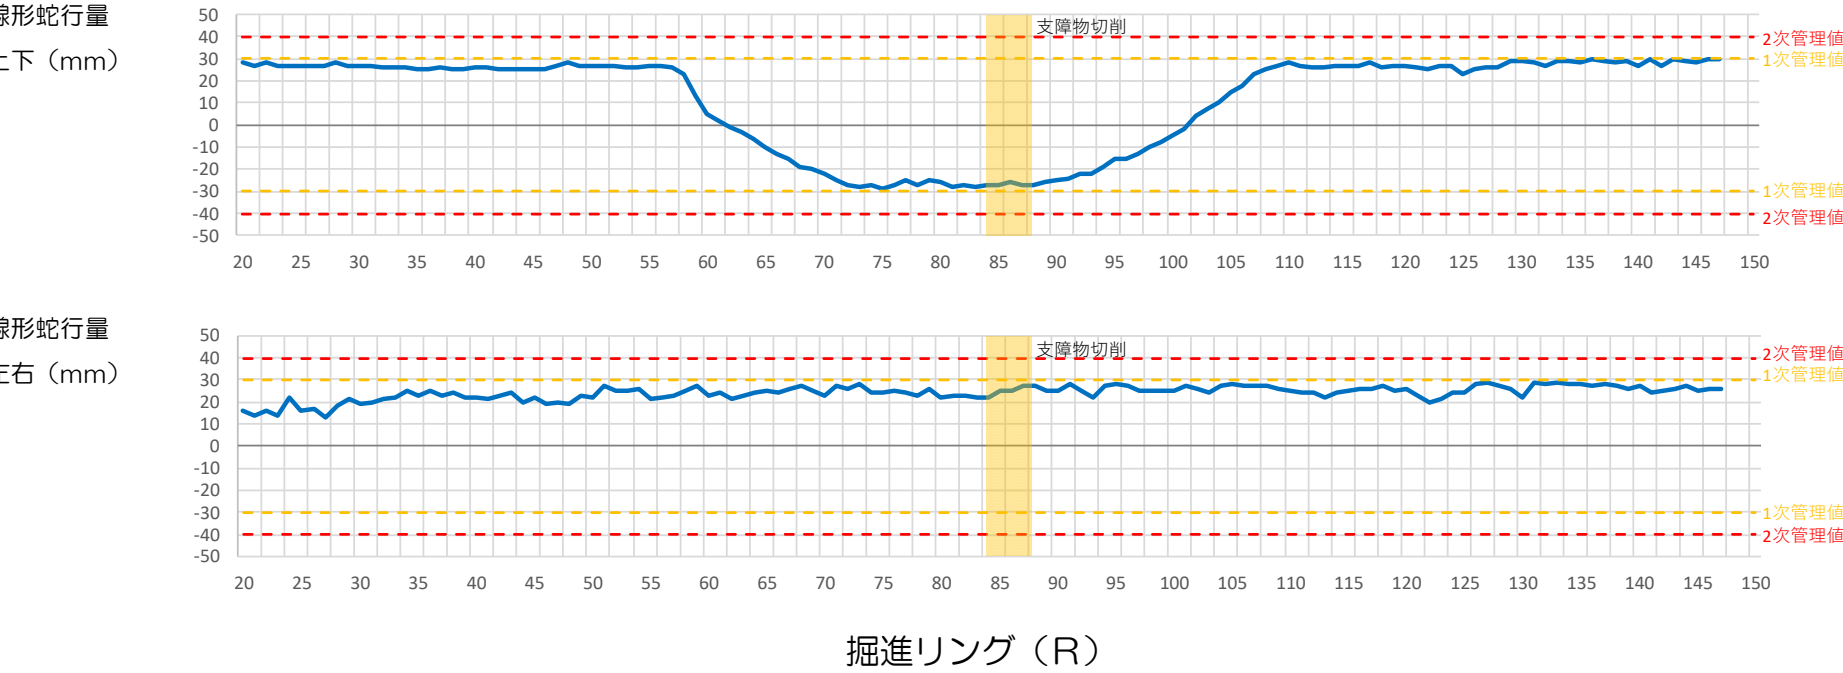

【支障物（下水道管）とシールドトンネルとの位置関係】

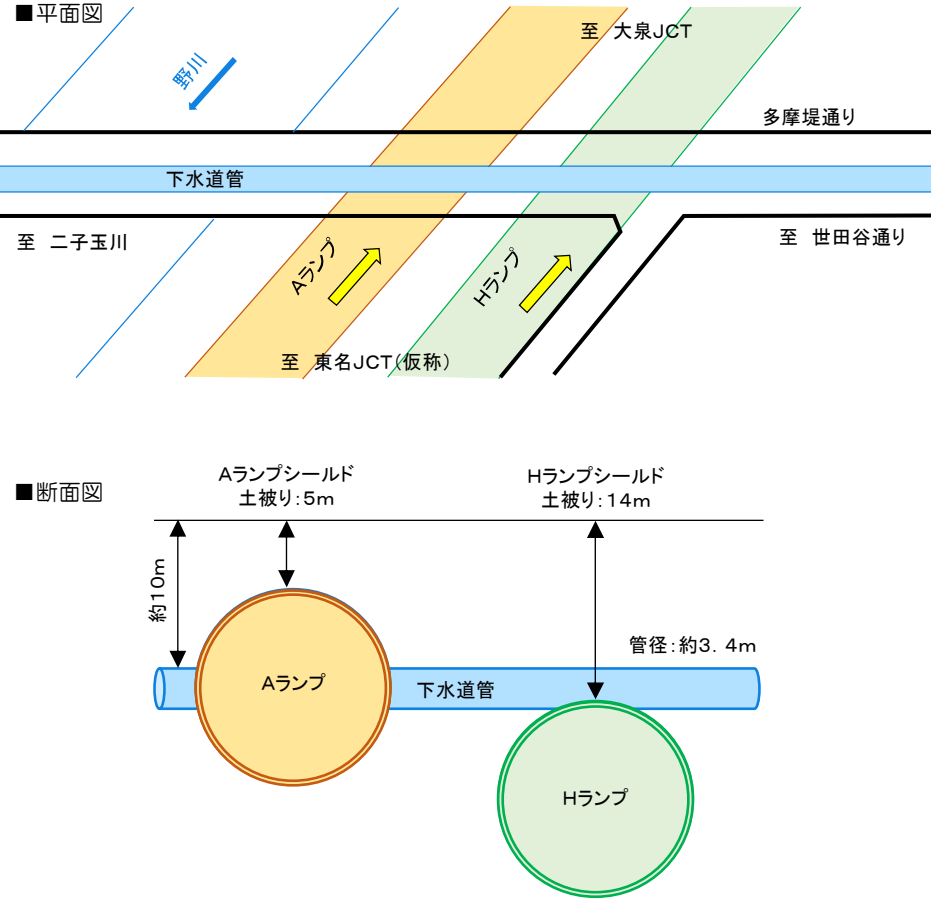



2. 4. 3 テールシールの変状について

(1) テールシールの清掃

143Rの掘進以降、下側テールクリアランスの拡大が確認されたことから、テールシール内の異物の挟まり等を想定し、掘進を一時停止し清掃作業を実施した。

清掃作業の中で、清掃孔よりテールブラシの状況について確認した。切羽側の1段目のテールブラシについて、保護プレートの一部欠損及びブラシの反り返りを目視により確認した。2段目のテールブラシについては、探針棒による確認によりテールブラシが反り返っている可能性を確認した。3段目のテールブラシについては、切羽側の保護プレートを目視により確認しテールブラシが通常の状態であることを確認した。また、テールシール内に異物等の混入は確認されなかった。


なお、セグメントで構築されたトンネルやシールドマシンの設備については安全上問題はなく、地表面の安全性を損なう事象ではないと考えられる。
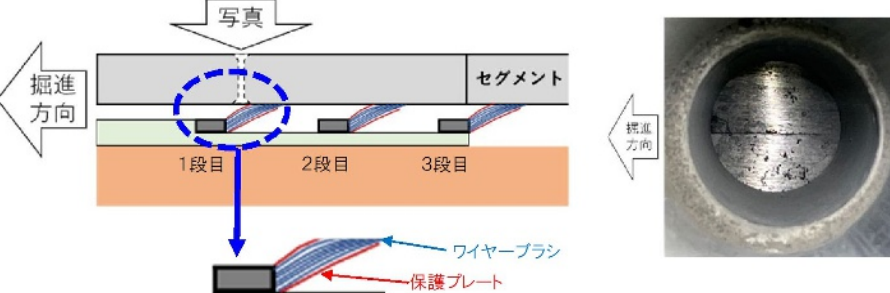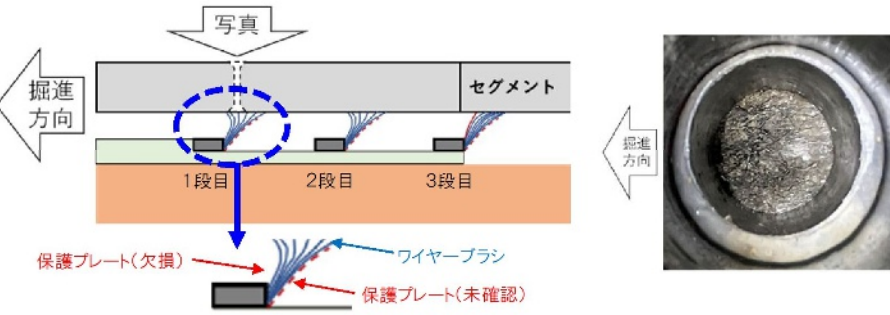
| テールシール(ブラシ)の状態 |                                                                                     |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 通常の状態          |   | ワイヤーブラシを保護するプレート(鉄板)が見える。                       |
| 今回の状態(推定)      |  | ワイヤーブラシを保護するプレート(鉄板)が欠損しているため、ワイヤーブラシの繊維が直接見える。 |



## （２）テールシールの変状要因

テールシール内に異物等が確認されなかったことから、北多摩層（固結粘性土層）では、裏込材注入時に、裏込材が地山にまわりにくく、組立てたセグメントに浮力などの上向きの力が働き下側テールクリアランスが拡大し、裏込材の注入圧によりテールシールが押し上げ一部に変状が発生したものと考えられる。また、小土被り区間において地表面沈下を考慮した裏込材の注入圧・注入率管理を行っていたこと、小土被りであることから上向きの力が働きやすいことも影響したと考えられる。

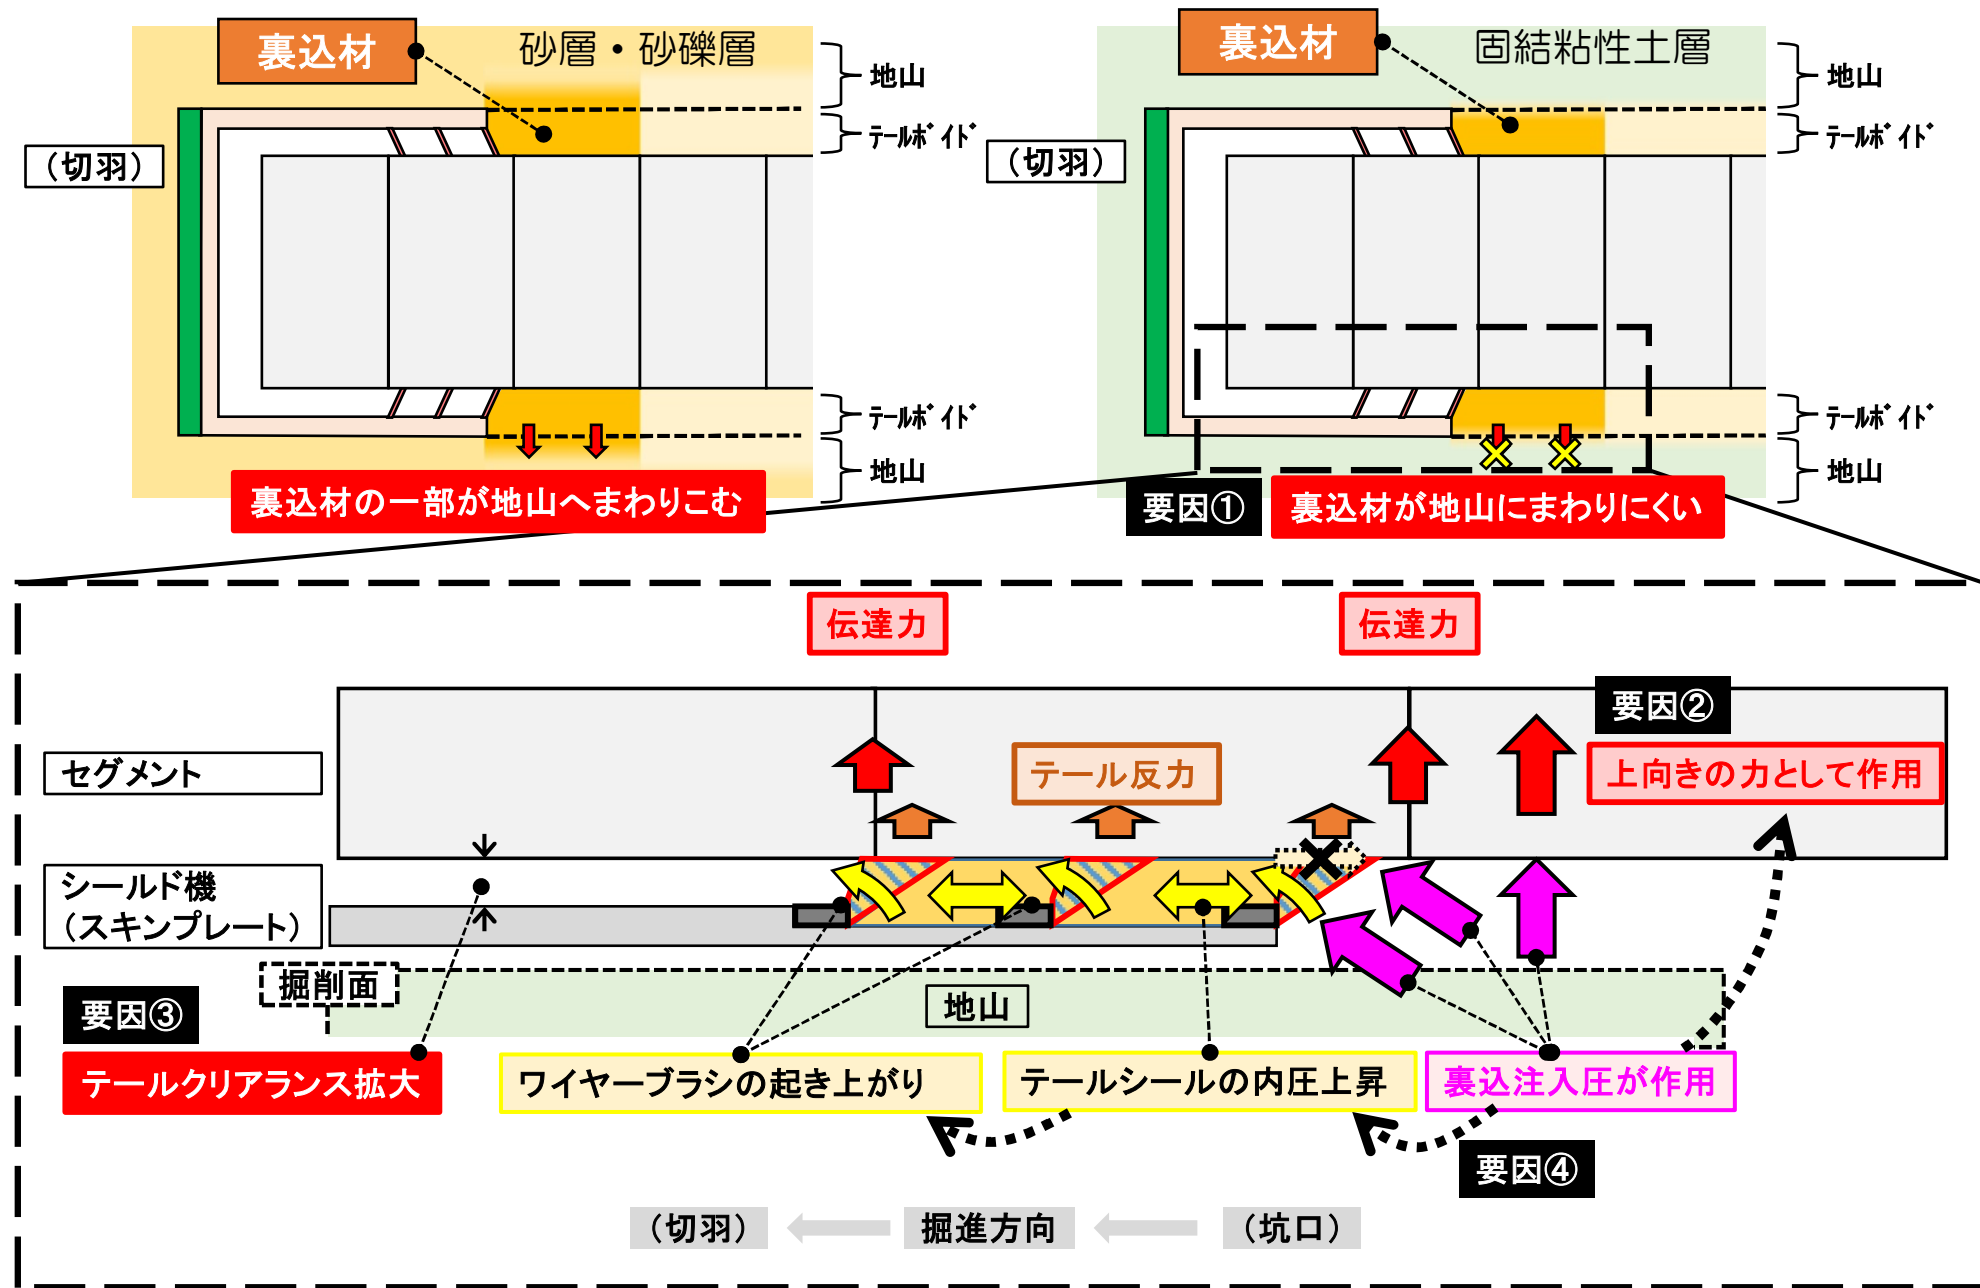

## （３）今後の対応


掘進時にシールド内への漏水等はなく安全に掘進可能であるが、今後の掘進作業を考慮し、変状した部品（テールブラシ）の交換作業を行うこととする。

テールブラシの交換を行うためにセグメントを外す必要があることから接合部のボルトが取り外し可能な鋼製セグメントを組立て交換作業を実施する。鋼製セグメントを外しテールブラシの変状範囲を確認した上で交換作業を実施する。

今後の掘進においては、地表面を監視しつつ、地盤に応じた裏込材の注入圧・注入率で掘進する。特に北多摩層（固結粘性土層）においては裏込材が地山にまわりにくいことに留意し裏込材の注入圧・注入率管理を実施する。

## 2. 5. 1 東名JCT Hランプシールドトンネル工事での対応状況

## ■掘進モニタリング体制



■受発注者間合同安全大会などの状況

受発注者間合同の安全大会



受発注者間合同の安全点検



掘進状況報告会議



掘進管理状況日常点検




3. 地域の安全・安心を高める取り組みの対応状況

第26回東京外環トンネル施工等検討委員会における地域の安全・安心を高める取り組みとして以下を確認した。

3. 地域の安全・安心を高める取り組み

振動・騒音対策や地盤変状の確認、地域住民の方への情報提供、緊急時の運用の見直しについて、シールドトンネル工事に伴う地域の安全・安心を高める取り組みとして、陥没地域で実施した説明会や相談窓口等においていただいたご意見、沿線区市よりいただいた要請書等を参考に次のとおりとりまとめた。引き続き、沿線住民からの問い合わせ等に対し、適切に対応するとともに、不安を取り除くことに努めていく。

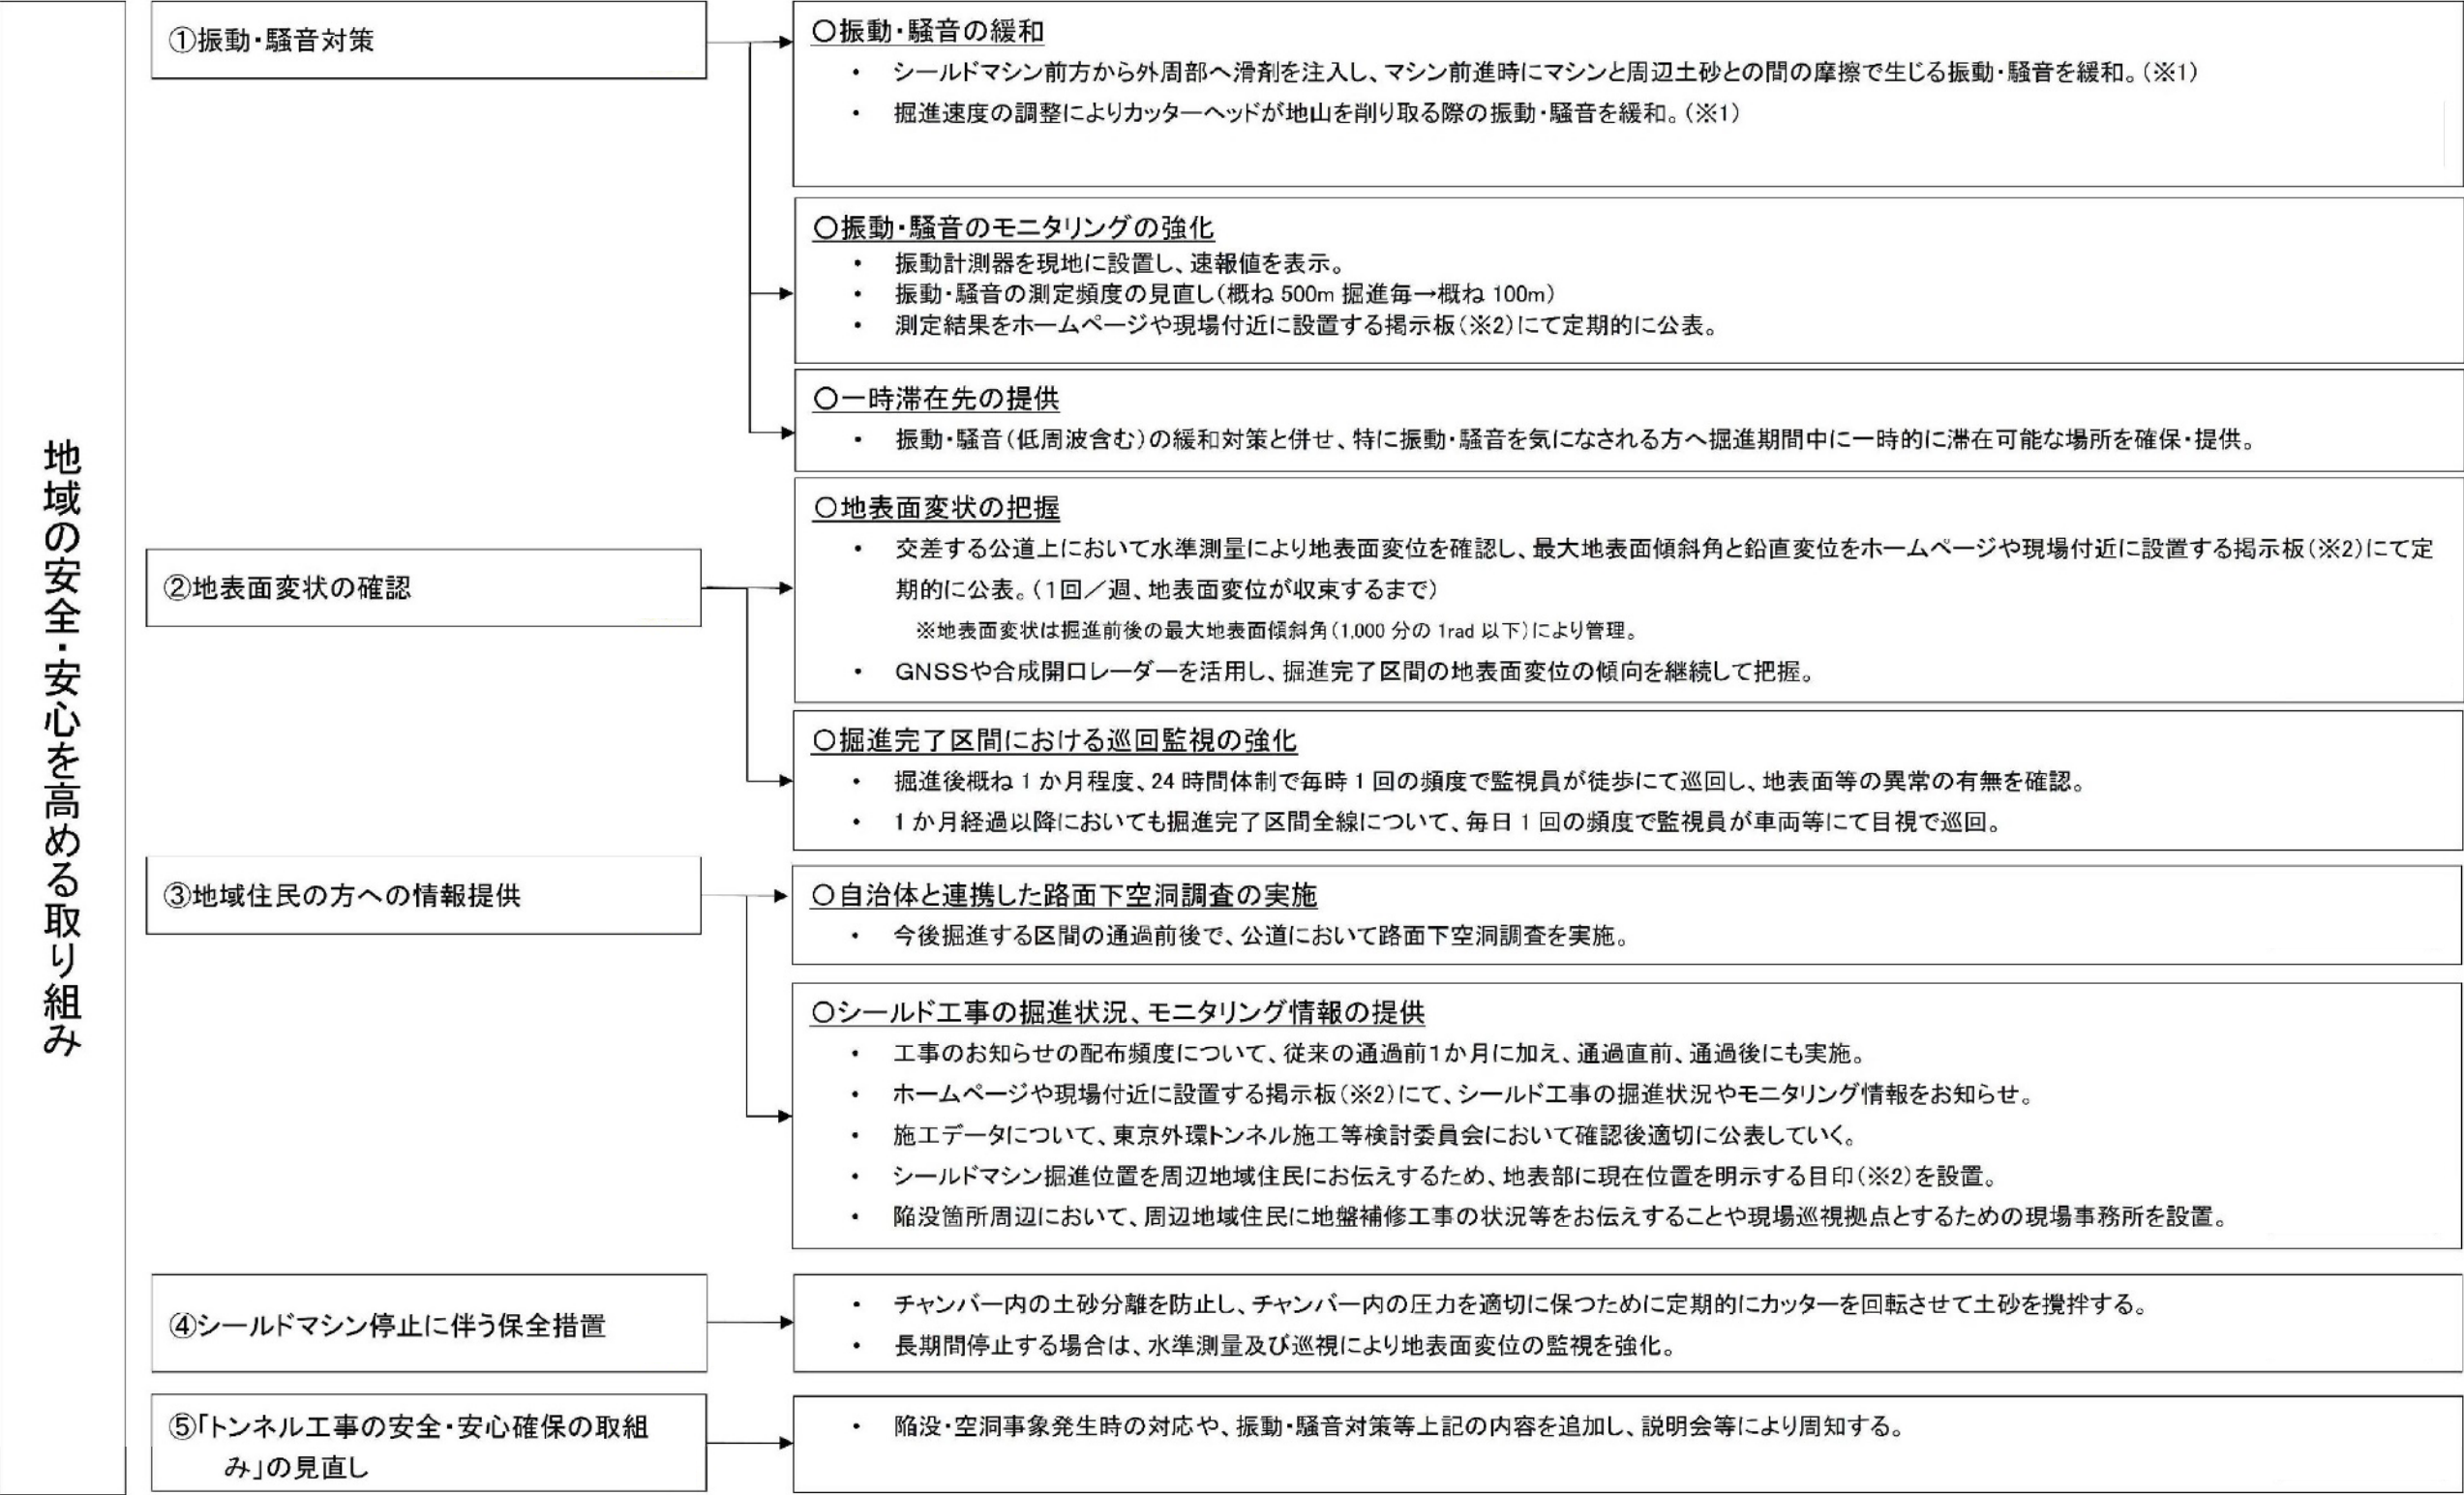

※1:状況に応じて実施  
※2:設置箇所・手法は自治体と調整


3. 1 振動・騒音のモニタリングの強化

公共用地においてトンネル縦断方向に概ね100m間隔で振動・騒音測定を実施することとしており、下図に示す箇所で測定を行った。結果については掲示板やホームページで公表している。また、シールド直上付近の位置で簡易計測器を用いた振動・騒音測定を実施し、電光掲示板で測定値を表示している。

令和5年5月1日から令和5年11月30日において、シールド掘進に関する振動・騒音のお問い合わせは寄せられていない。

【振動・騒音測定】

|      |                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定内容 | 振動レベル(鉛直Z方向)、騒音レベル、低周波レベル                                                                                       |
| 測定頻度 | トンネル縦断方向に概ね100m間隔                                                                                               |
| 測定時間 | 昼間掘進中、夜間停止中                                                                                                     |
| 測定位置 | マシン直上と影響範囲端部付近の公共用地3測点<br>低周波は直上のみ1測点                                                                           |
| 公表値  | (速報値)<br>振動レベルL10(シールドマシン直上付近の1点)<br>騒音レベルLA5(シールドマシン直上付近の1点)<br>(確定値)<br>振動レベルL10<br>騒音レベルLA5<br>低周波レベルL50、LG5 |
| 掲示方法 | (速報値)<br>現地付近の掲示板等に掲示<br>(確定値)<br>ホームページと現地付近の掲示板等に掲示                                                           |

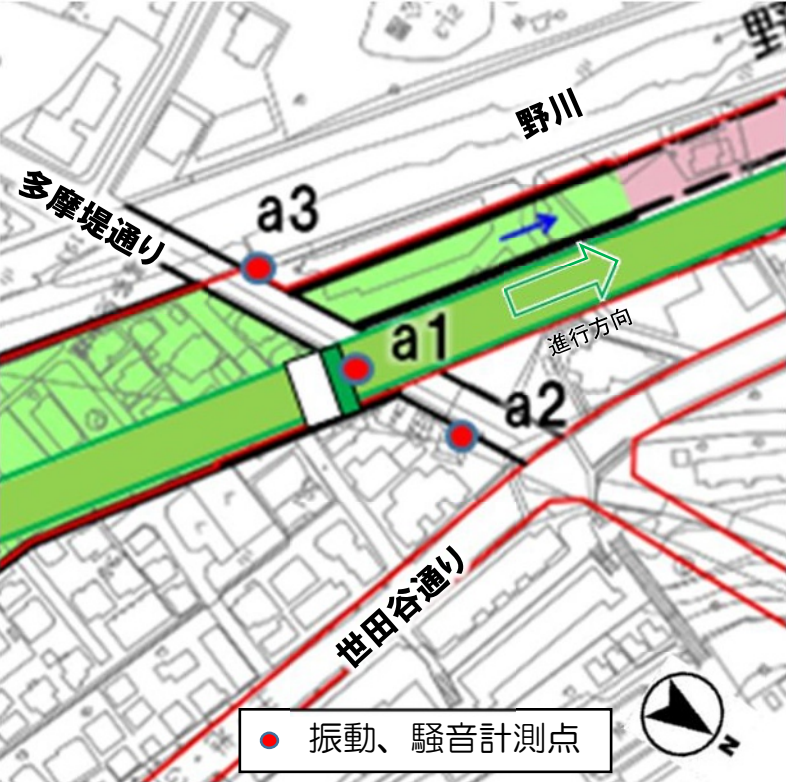


測定位置（測定日：令和5年9月14日）



測定状況

【簡易測定】

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 測定内容 | 振動レベル(鉛直Z方向)、騒音レベル        |
| 測定頻度 | 事業用地内：毎日 事業用地外：掘進稼働日      |
| 測定時間 | 事業用地内：終日 事業用地外：9時～20時     |
| 測定位置 | シールドマシン直上付近の公共用地1箇所       |
| 公表値  | Z軸方向振動レベル(瞬間値)、騒音レベル(瞬間値) |
| 掲示方法 | 電光掲示板で自動掲示                |

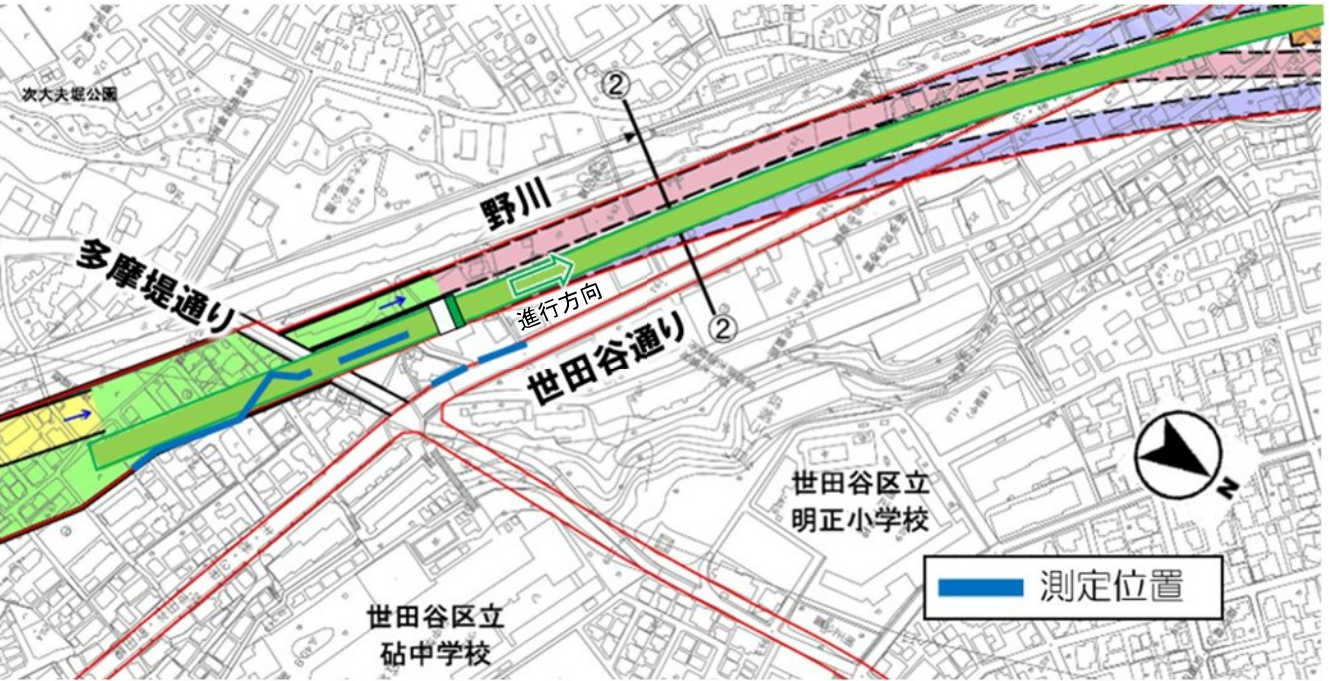


測定状況

9月14日（木） 12：40～21：00 振動・騒音計測結果

- 振動
- :
- シールド工事の停止中と掘進中で明確な差違は確認されなかった。
- 騒音
- :
- シールド工事の停止中と掘進中で明確な差違は確認されなかった。
- 低周波音
- :
- シールド工事の停止中と掘進中で明確な差違は確認されなかった。

【シールドマシン位置図】

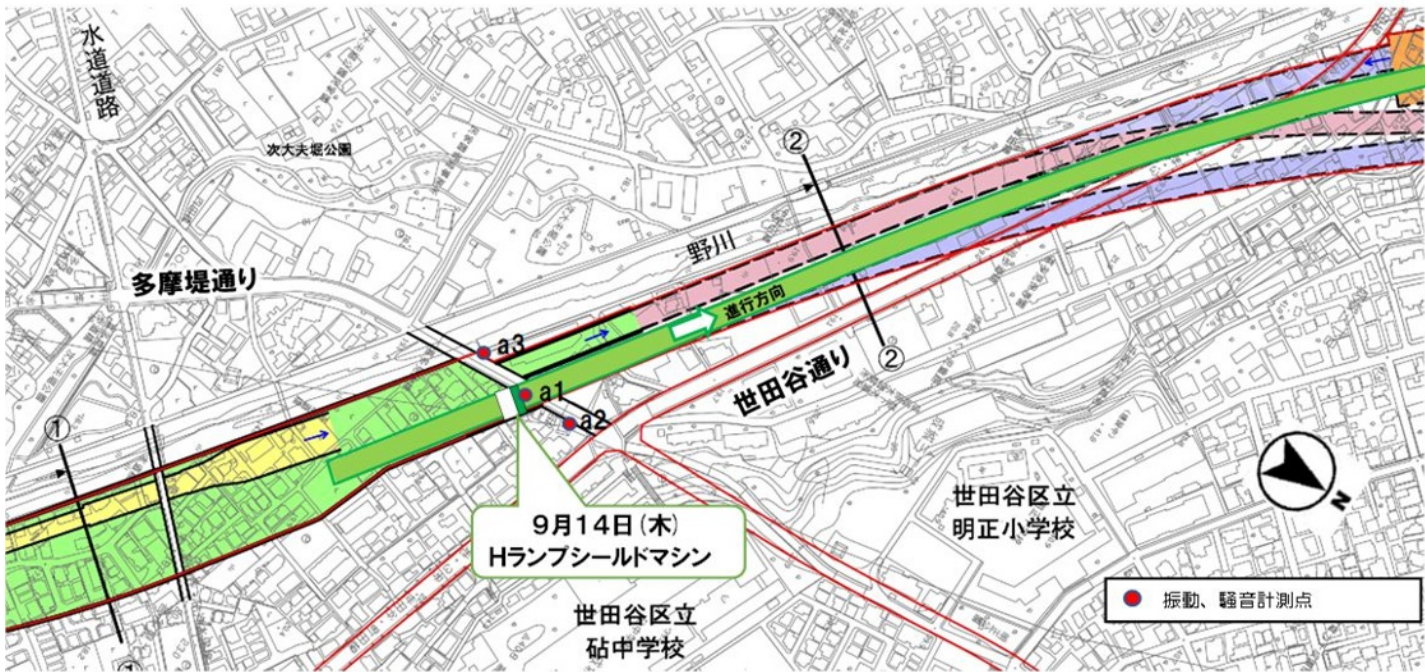

【9月14日（木） 12：40～21：00 振動・騒音計測結果（確定値）】

|                                | a1        |           | a2        |           | a3        |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                | 停止中<br>最大 | 掘進中<br>最大 | 停止中<br>最大 | 掘進中<br>最大 | 停止中<br>最大 | 掘進中<br>最大 |
| 振動レベル<br>L <sub>10</sub> (dB)  | 49        | 49        | 40        | 41        | 47        | 49        |
| 騒音レベル<br>L <sub>A5</sub> (dB)  | 72        | 75        | 71        | 73        | 66        | 68        |
| 低周波レベル<br>L <sub>50</sub> (dB) | 80        | 83        |           |           |           |           |
| 低周波レベル<br>L <sub>G5</sub> (dB) | 85        | 89        |           |           |           |           |

＊振動レベル、騒音レベル、低周波レベルの測定はシールドマシン通過時にその直上付近で実施しています。計測点はシールドマシン中心および影響範囲端部を基本とし、事業用地や公道などで実施しています。

＊上表は、特異値（例：大型車両通過に伴う振動、緊急車両サイレンなど）を除外した数値を示しています。

【振動レベルL10】 振動レベルをある時間測定したとき、全測定値の大きい方から10%目の値をL10と表します。

【騒音レベルLA5】 騒音レベルをある時間測定したとき、全測定値の大きい方から5%目の値をLA5と表します。

【低周波レベルL50】 1～80Hzの周波数範囲内をある時間測定したとき、全測定値の中央値をL50と表します。

【低周波レベルLG5】 1～20Hzの周波数範囲内をある時間測定したとき、全測定値の大きい方から5%目の値をLG5と表します。


### 3. 2 地表面変状の確認

#### ①地表面計測

交差する公道上において水準測量により地表面変位をシールド通過まで1回／日、通過後1回／月の頻度で変位が収束するまで計測を実施する計画である。

測量結果については、地表面最大傾斜角、鉛直変位をホームページや現場付近に設置している掲示板にて1回／週の頻度で定期的に公表している。

今回の掘進区間における掘進前後の地表面最大傾斜角は1 0 0 0分の1 r a d以下であることを確認した。

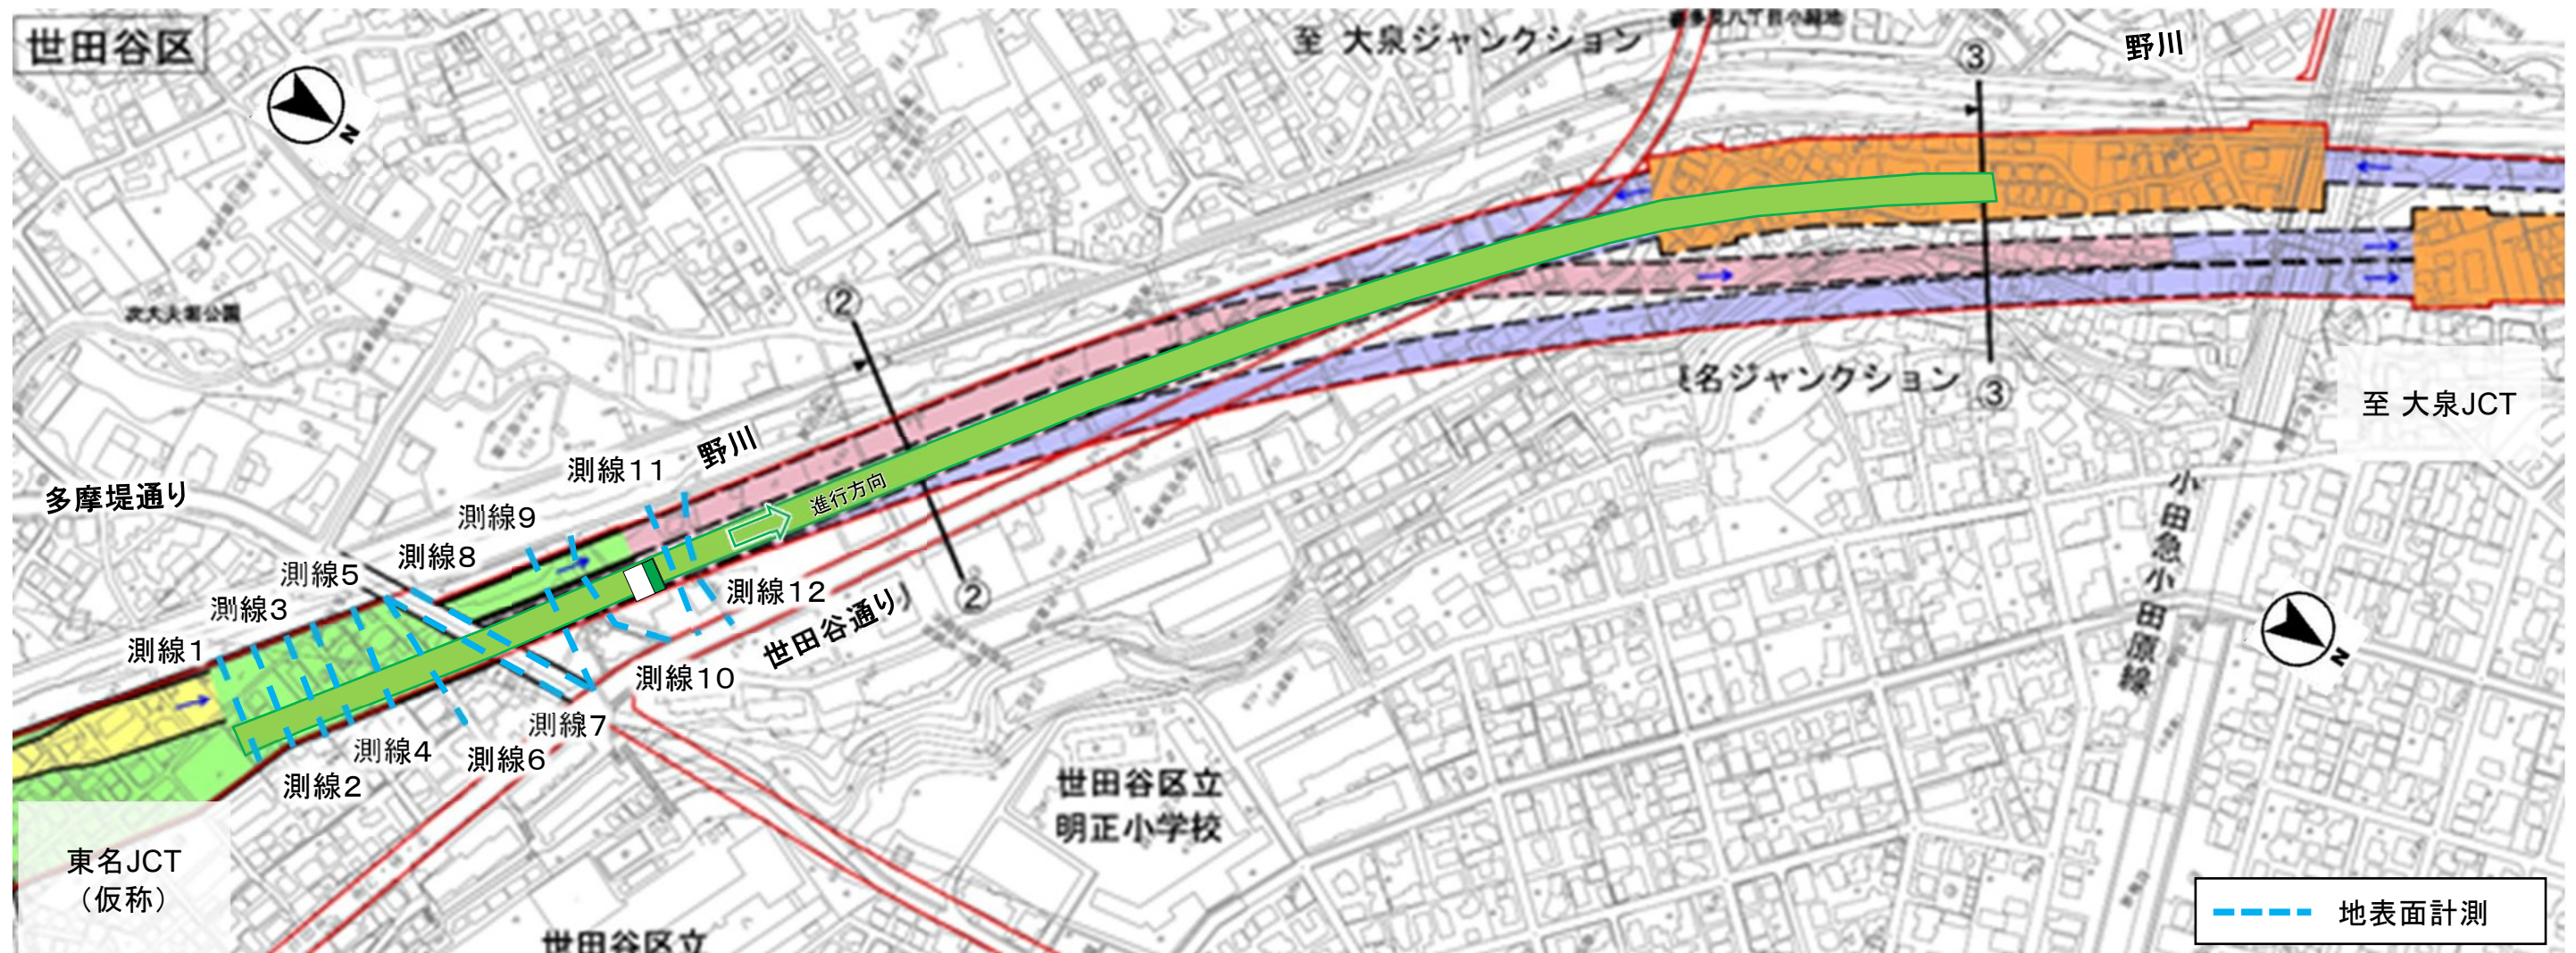

【地表面計測結果】

| 測線 | 基準値<br>計測日     | 最大傾斜角 (rad) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 収束<br>確認日 | 収束<br>確認      |                |          |  |
|----|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|----------------|----------|--|
|    |                | 5月5日        | 5月12日    | 5月19日    | 5月26日    | 6月2日     | 6月9日     | 6月16日    | 6月23日    | 6月30日    | 7月7日     | 7月14日    | 7月21日    | 7月28日    | 8月4日     | 8月11日    | 8月18日    | 8月25日    | 9月1日     | 9月8日     | 9月15日    | 9月22日    | 9月29日    | 10月6日    | 10月13日   | 10月20日   | 10月27日   | 11月3日    | 11月10日    | 11月17日        | 11月24日         |          |  |
| 1  | 令和5年<br>1月16日  | 0.0/1000    | 0.0/1000 | 0.0/1000 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           | 令和5年<br>6月19日 | 0.0/1000       |          |  |
| 2  | 令和5年<br>2月17日  | 0.0/1000    | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           | 令和5年<br>7月3日  | 0.0/1000       |          |  |
| 3  | 令和5年<br>3月29日  | 0.0/1000    | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           | 令和5年<br>7月31日 | 0.0/1000       |          |  |
| 4  | 令和5年<br>5月12日  |             |          | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.1/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.1/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 |          |          |          |          |          |          |          |          |           |               | 令和5年<br>10月16日 | 0.0/1000 |  |
| 5  | 令和5年<br>6月1日   |             |          |          |          |          | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.1/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.1/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 |          |          |          |          |          |          |          |          |           |               | 令和5年<br>10月23日 | 0.0/1000 |  |
| 6  | 令和5年<br>6月12日  |             |          |          |          |          |          |          | 0.3/1000 | 0.3/1000 | 0.3/1000 | 0.1/1000 | 0.2/1000 | 0.2/1000 | 0.2/1000 | 0.2/1000 | 0.4/1000 | 0.2/1000 | 0.4/1000 | 0.2/1000 | 0.1/1000 | 0.2/1000 | 0.2/1000 | 0.1/1000 | 0.1/1000 |          |          |          |           |               | 令和5年<br>11月13日 | 0.2/1000 |  |
| 7  | 令和5年<br>8月18日  |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.2/1000 | 0.1/1000 | 0.2/1000 | 0.1/1000 | 0.2/1000 | 0.2/1000 | 0.2/1000 | 0.3/1000 | 0.2/1000 | 0.2/1000 |          |           |               |                |          |  |
| 8  | 令和5年<br>8月24日  |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.4/1000 | 0.4/1000 | 0.4/1000 | 0.2/1000 | 0.4/1000 | 0.2/1000 | 0.4/1000 | 0.3/1000 | 0.2/1000 | 0.4/1000 |           |               |                |          |  |
| 9  | 令和5年<br>9月29日  |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000 |           |               |                |          |  |
| 10 | 令和5年<br>10月6日  |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.2/1000 | 0.1/1000 | 0.3/1000 | 0.3/1000 | 0.4/1000  | 0.1/1000      | 0.2/1000       |          |  |
| 11 | 令和5年<br>10月19日 |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0/1000 | 0.0/1000 | 0.0/1000  | 0.0/1000      | 0.0/1000       |          |  |
| 12 | 令和5年<br>11月1日  |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.3/1000  | 0.5/1000      | 0.4/1000       |          |  |

| 測線 | 基準値<br>計測日     | 最大鉛直変位 (mm) |       |       |       |      |      |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |        |        |        |       |        | 収束確認   |               |                |               |                |       |  |
|----|----------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------|--|
|    |                | 5月5日        | 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 7月7日 | 7月14日 | 7月21日 | 7月28日 | 8月4日 | 8月11日 | 8月18日 | 8月25日 | 9月1日 | 9月8日 | 9月15日 | 9月22日 | 9月29日 | 10月6日 | 10月13日 | 10月20日 | 10月27日 | 11月3日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月24日        | 前回計測日          | 前回計測値         | 収束確認日          | 収束確認値 |  |
| 1  | 令和5年<br>1月16日  | +1          | +1    | +1    |       |      |      |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |        |        |        |       |        |        | 令和5年<br>5月22日 | ±0             | 令和5年<br>6月19日 | ±0             |       |  |
| 2  | 令和5年<br>2月17日  | ±0          | +1    | +1    | −1    | ±0   | ±0   |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |        |        |        |       |        |        | 令和5年<br>6月14日 | ±0             | 令和5年<br>7月3日  | −1             |       |  |
| 3  | 令和5年<br>3月29日  | −1          | −1    | −1    | −1    | −1   | −2   | −1    | −1    |       |      |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |        |        |        |       |        |        | 令和5年<br>6月29日 | −2             | 令和5年<br>7月31日 | −1             |       |  |
| 4  | 令和5年<br>5月12日  |             |       | −1    | ±0    | ±0   | −1   | +1    | +1    | +2    | ±0   | −2    | +1    | −1    | +1   | −1    | +2    | +2    | +2   | +2   |       |       |       |       |        |        |        |       |        |        |               | 令和5年<br>9月11日  | +1            | 令和5年<br>10月16日 | +1    |  |
| 5  | 令和5年<br>6月1日   |             |       |       |       |      | ±0   | −1    | ±0    | −2    | −1   | −1    | −1    | −2    | −1   | −1    | −1    | +2    | +3   | +2   | +2    |       |       |       |        |        |        |       |        |        |               | 令和5年<br>9月19日  | +2            | 令和5年<br>10月23日 | +1    |  |
| 6  | 令和5年<br>6月12日  |             |       |       |       |      |      |       | +2    | +3    | +2   | +2    | +2    | +2    | −1   | −2    | −2    | +2    | −2   | +2   | +2    | +3    | +3    | +3    | +3     |        |        |       |        |        |               | 令和5年<br>10月13日 | +3            | 令和5年<br>11月13日 | +3    |  |
| 7  | 令和5年<br>8月18日  |             |       |       |       |      |      |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       | +1    | +2   | +2   | +2    | −1    | +2    | +2    | +3     | +4     | +3     |       |        |        |               |                |               |                |       |  |
| 8  | 令和5年<br>8月24日  |             |       |       |       |      |      |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |       | −1   | −1   | +2    | +1    | +2    | −1    | +2     | +2     | +2     | −2    |        |        |               |                |               |                |       |  |
| 9  | 令和5年<br>9月29日  |             |       |       |       |      |      |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       | ±0    | +1     | +1     | +1     | +1    |        |        |               |                |               |                |       |  |
| 10 | 令和5年<br>10月6日  |             |       |       |       |      |      |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       | −2     | −1     | −2     | −1    | −1     | −1     | −1            |                |               |                |       |  |
| 11 | 令和5年<br>10月19日 |             |       |       |       |      |      |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |        |        | +1     | +1    | −1     | −1     | +1            |                |               |                |       |  |
| 12 | 令和5年<br>11月1日  |             |       |       |       |      |      |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |        |        |        |       | −1     | −2     | +3            |                |               |                |       |  |

※収束確認：通過後1回／月の頻度で計測を実施し、鉛直変位の変化量が前回計測値から±1mm以内

## ②巡回監視の強化

掘進時及び掘進後概ね1ヶ月程度は24時間体制でシールドマシンの掘進工事個所周辺を徒歩等により巡視員が巡回を実施している。

また、1ヶ月経過以降も掘進完了区間については、毎日1回の頻度で車両等または徒歩により巡回を実施している。

これまで掘進工事個所周辺において地表面変状等周辺の生活環境に影響を与える事象は確認されていない。




3. 3 地域住民の方への情報提供

3. 3. 1 シールド工事の掘進状況、モニタリング情報の提供

掘進作業において、地域住民の方への情報提供として、シールド工事の掘進状況及びモニタリング情報の提供を行っている。

具体的には、①工事のお知らせの配布頻度の見直し、②ホームページや現場付近の掲示板を用いたシールド工事の掘進状況や計測結果のお知らせ、③施工データの適切な公表、④シールドマシン直上付近での振動・騒音の値の公表及び掘進位置の目印の設置を実施している。

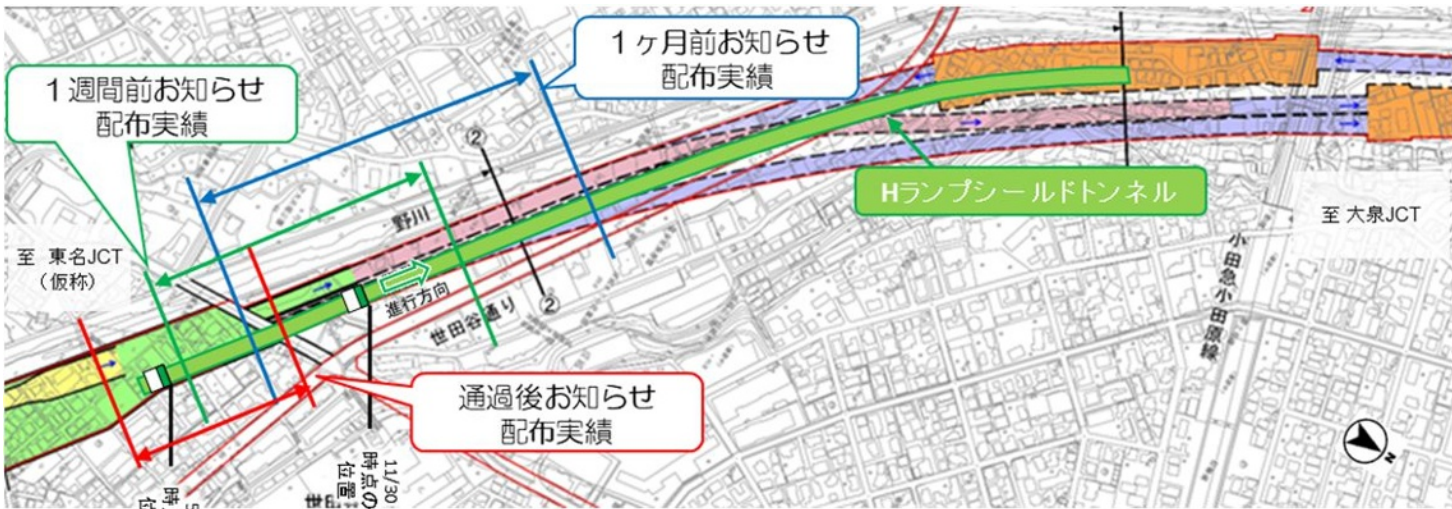

①工事のお知らせの配布頻度の見直し

従来のシールド通過前1ヶ月に加え、通過前1週間、通過後にもお知らせの配布を実施している。

通過1ヶ月前

令和5年11月1日

東京外かく環状道路 東名JCT Hランプシールドトンネル工事のお知らせ(通過1ヶ月前)

皆様には日ごろから、東京外かく環状道路事業にご理解とご協力いただきありがとうございます。


東名JCT(世田谷区喜多見)から発進したHランプトンネルのシールド機は、図中に示す時期に通過を予定しておりますのでお知らせいたします。シールド機通過の際は振動を感じる場合があります。ご迷惑をおかけいたしますがご理解ご協力をお願いいたします。

また、地上部ではシールド機の通過前・中・後に地表面変位を計測するとともに、掘進工事箇所周辺で異常が生じていないか確認するため、警戒車両等で巡回します。振動・騒音に関する調査も行っています。

トンネル工事や測量、巡回等を行う際は安全に十分努め、作業を行いますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

※シールド機通過の概ね一週間前とシールド機通過後にあらためてお知らせいたします。

●シールド機の掘進予定

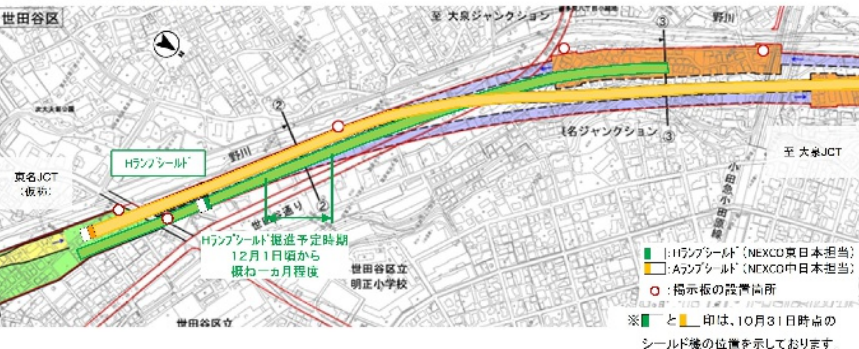

●お問い合わせ先(異常時やその他お問い合わせ)

| お問い合わせ内容                      | お問い合わせ先(代表)                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・今後の掘進予定に関する事<br>・外環事業全般に関する事 | 東日本高速道路株式会社 東京外環工事事務所<br>TEL: 0120-861-305<br>(フリーコール: 平日9:00~17:30) ※12月29日~1月3日は除く<br>e-mail アドレス <a href="mailto:tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp">tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp</a> |
| ・工事に関する事<br>・工事時の振動・騒音などに関する事 | 東名JCTランプシールドトンネル工事担当<br>TEL: 03-5727-8511 (24時間工事情報受付ダイヤル)                                                                                                                     |

(裏面あり)

通過1週間前

令和5年10月25日

東京外かく環状道路 東名JCT Hランプシールドトンネル工事のお知らせ(通過1週間前)

皆様には日ごろから、東京外かく環状道路事業にご理解とご協力いただきありがとうございます。

東名JCT(世田谷区喜多見)から発進したHランプトンネルのシールド機は、図中に示す時期に通過を予定しておりますのでお知らせいたします。シールド機通過の際は振動を感じる場合があります。ご迷惑をおかけいたしますがご理解ご協力をお願いいたします。

また、地上部ではシールド機の通過前・中・後に地表面変位を計測するとともに、掘進工事箇所周辺で異常が生じていないか確認するため、警戒車両等で巡回します。振動・騒音に関する調査も行っています。

トンネル工事や測量、巡回等を行う際は安全に十分努め、作業を行いますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

※シールド機通過後にあらためてお知らせいたします。

●シールド機の掘進予定



●お問い合わせ先(異常時やその他お問い合わせ)

| お問い合わせ内容                      | お問い合わせ先(代表)                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・今後の掘進予定に関する事<br>・外環事業全般に関する事 | 東日本高速道路株式会社 東京外環工事事務所<br>TEL: 0120-861-305<br>(フリーコール: 平日9:00~17:30) ※12月29日~1月3日は除く<br>e-mail アドレス <a href="mailto:tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp">tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp</a> |
| ・工事に関する事<br>・工事時の振動・騒音などに関する事 | 東名JCTランプシールドトンネル工事担当<br>TEL: 03-5727-8511 (24時間工事情報受付ダイヤル)                                                                                                                     |

(裏面あり)

通過後

令和5年12月1日

東京外かく環状道路 東名JCT Hランプシールドトンネル工事のお知らせ(シールド機通過)

皆様には日ごろから、東京外かく環状道路事業にご理解とご協力いただきありがとうございます。


事前にお知らせしておりました東名JCT(世田谷区喜多見)から発進したHランプトンネルのシールド機が下図に示す範囲を通過したことをお知らせいたします。

これまで、地表面変位の計測および徒歩等による巡回を実施しており異常はございませんでした。

引き続き、地表面変位の計測を変位が収束するまで継続し、計測結果について掲示板・HPIにて公表してまいります。併せて警戒車両等での巡回も毎日行っています。

今後トンネル工事や測量、巡回等を行う際は安全に十分努め作業を行いますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

●シールド機通過範囲

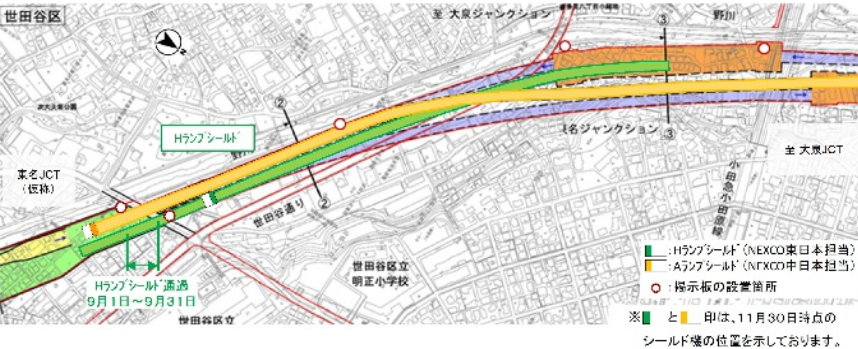


●お問い合わせ先(異常時やその他お問い合わせ)

| お問い合わせ内容                      | お問い合わせ先(代表)                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・今後の掘進予定に関する事<br>・外環事業全般に関する事 | 東日本高速道路株式会社 東京外環工事事務所<br>TEL: 0120-861-305<br>(フリーコール: 平日9:00~17:30) ※12月29日~1月3日は除く<br>e-mail アドレス <a href="mailto:tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp">tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp</a> |
| ・工事に関する事<br>・工事時の振動・騒音などに関する事 | 東名JCTランプシールドトンネル工事担当<br>TEL: 03-5727-8511 (24時間工事情報受付ダイヤル)                                                                                                                     |

(裏面あり)

②ホームページや現場付近の掲示板を用いたシールド工事の掘進状況や計測結果のお知らせ  
東京外環事業のホームページに加え、新たに掲示板を設置するなどして工事の情報提供を行っている。

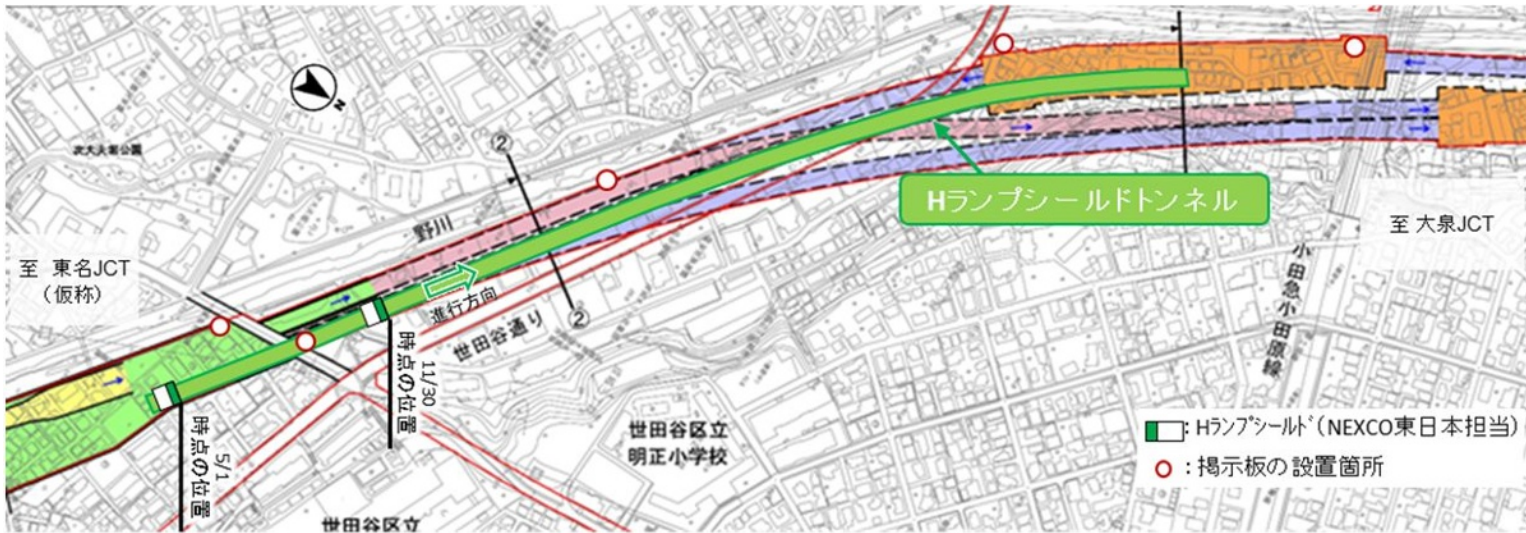

【ホームページ】シールドマシンの位置と振動・騒音等のモニタリング結果の公表

**進捗状況**

● 掘進完了  
● 掘進中

**本線シールドトンネル (大泉立坑発進)**

① **グリルド: 本線トンネル(南行)大泉南工事**

シールドマシンの位置: 東京都練馬区石神井台3丁目  
練馬区石神井台3丁目付近の掘進作業を進めています。  
[グリルドはここにあります。](#)  
[騒音・振動・地表変位モニタリング結果](#)

② **カラッキイー: 本線トンネル(北行)大泉南工事**

シールドマシンの位置: 東京都練馬区石神井台3丁目  
練馬区石神井台3丁目付近の掘進作業を進めています。  
[カラッキイーはここにあります。](#)  
[騒音・振動・地表変位モニタリング結果](#)

**本線シールドトンネル (東名立坑発進)**

③ **みどりんぐ: 本線トンネル(南行)東名北工事**

シールドマシンの位置: 東京都調布市東つつじヶ丘2丁目  
掘進作業を一時中止しております。また、シールド機内の土砂の変動化のため定期的にカッター回転を行います。  
[みどりんぐはここにあります。](#)

④ **がるるん: 本線トンネル(北行)東名北工事**

シールドマシンの位置: 東京都調布市東つつじヶ丘3丁目  
掘進作業を一時中止しております。また、シールド機内の土砂の変動化のため定期的にカッター回転を行います。  
[がるるんはここにあります。](#)

**ランプシールドトンネル**

⑤ **大泉JCT Fランプ: 大泉南工事**

シールドマシンの位置: 東京都練馬区石神井町8丁目  
掘進作業は完了しております。  
[詳細はこちら](#)

⑥ **中央JCT 北側 Aランプ: 北側Aランプシールド工事**

シールドマシンの位置: 東京都三鷹市幸礼1丁目  
掘進作業は完了しております。  
[詳細はこちら](#)

⑦ **中央JCT 北側 Hランプ: 北側Hランプシールド工事**

シールドマシンの位置: 東京都三鷹市北野2丁目  
掘進作業は完了しております。  
[詳細はこちら](#)

⑧ **東名JCT Hランプ: ランプシールドトンネル・地中拡幅(南行)工事**

シールドマシンの位置: 東京都世田谷区西多摩7丁目  
世田谷区西多摩7丁目付近にてシールドマシンの清掃に伴い掘進を一時停止しております。  
[東名JCT Hランプシールドはここにあります。](#)  
[騒音・振動・地表変位モニタリング結果](#)

地域の皆様へ  
東京外かく環状道路 東名JCT Hランプシールドトンネル工事  
地表面変位計測結果のお知らせ  
令和5年12月1日

【11月24日(金) シールドマシン位置図】

【11月24日(金) 地表面変位計測結果】

| 測線   | 基準日        | 最大傾斜角 (rad) | 最大鉛直変位 (mm) |
|------|------------|-------------|-------------|
| 測線10 | 令和5年10月6日  | 0.2/1,000   | +1          |
| 測線11 | 令和5年10月19日 | 0.0/1,000   | +1          |
| 測線12 | 令和5年11月1日  | 0.4/1,000   | +3          |

※最大傾斜角は、計測地点間の傾斜角の最大値を示しています。

【この掲示板に関するお問い合わせ先】  
東名JCTランプシールドトンネル工事担当  
TEL: 03-5727-8511 (24時間工事情報受付ダイヤル)  
東日本高速道路㈱ 関東支社 東京外環工事事務所  
TEL: 0120-861-305 (フリーコール: 平日9:00~17:30)  
E-mail アドレス: [tokyo-gaikan@n-exco.co.jp](mailto:tokyo-gaikan@n-exco.co.jp)

【掲示板への掲示】地表面変位モニタリング結果

③施工データの適切な公表

東京外環トンネル施工等検討委員会において確認した後、適切に公表していく。

④シールドマシン直上付近での振動・騒音の値の公表および掘進位置の目印の設置

シールドマシン直上付近での振動・騒音モニタリングについて、計測場所に電光掲示板を配置し振動・騒音のリアルタイムな値を表示している。

また、シールドマシン掘削位置を周辺地域住民の方へお伝えする目印を現地表示している。

【シールドマシン直上付近での振動・騒音の値（簡易計測値）の表示】



【振動・騒音リアルタイム表示】



【シールドマシン位置の目印表示】



【掘進位置のお知らせ】

