


東京外環 埋蔵文化財調査の状況

H28年2月現在

資料2

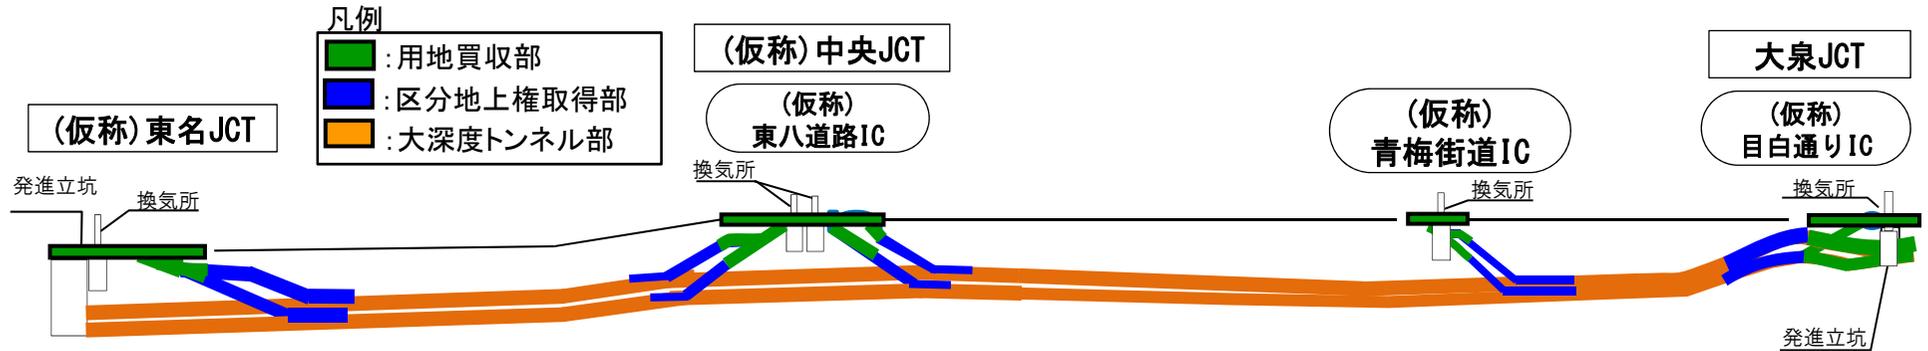

埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合

【H28年2月現在】

	東名JCT	中央JCT	青梅街道IC	大泉JCT	合計
進捗率	59% (+25%)	56% (+5%)	0% (±0%)	66% (+2%)	60% (+18%)

※東京都との調整により調査必要範囲を事前に確定
 ※調査必要範囲について、工事着工前に区市の立ち会いのもと試掘調査(確認調査)を実施し、その結果を踏まえ、必要に応じて東京都にて本掘調査を実施

※()内の数値は、H27年11月比

$$\text{※進捗率} = \frac{\text{調査済み面積}}{\text{調査対象面積}}$$
