

直轄河川緊急復旧工事実施状況

[平成23年東北地方太平洋沖地震による河川被災箇所]



平成23年3月18日

国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所

※今後の工事進捗に伴い、掲載している情報が変更されることがあります。

・霞ヶ浦（西浦）

堤防陥没等 4250m（右岸1.8～6.0km：茨城県稲敷市本新）

[復旧状況 3月16日：盛換工法で復旧着手 工事は50日間で完了予定]

堤防陥没 400m（右岸7.6～8.0km：茨城県稲敷市尾島）

[復旧状況 3月16日：盛換工法で復旧着手 工事は20日間で完了予定]

堤防陥没等 250m（右岸26.3～26.5km：茨城県美浦村余郷入）

[復旧状況 3月16日：盛換工法で復旧着手 工事は15日間で完了予定]

堤防陥没等900m（中岸33.1～34.0km：茨城県石岡市井関）

[復旧状況 3月17日：盛換工法で復旧着手 工事は30日間で完了予定]

堤防陥没等2000m（左岸8.0～10.0km：茨城県行方市小高）

[復旧状況 3月16日：盛換工法で復旧着手 工事は30日間で完了予定]

・霞ヶ浦（外浪逆浦）

護岸崩壊 400m（右岸0.8～1.2km：千葉県香取市一ノ分目）

[復旧状況 3月15日：土嚢等で復旧着手 工事は15日間で完了予定]

・常陸川

樋管上下流堤防陥没（左岸10.8～11.0km：茨城県神栖市息栖）

[復旧状況 3月15日：土嚢等で復旧着手 工事は10日間で完了予定]

堤防陥没 2500m（右岸2.5～5.0km：茨城県神栖市日川）

[復旧状況 3月16日：盛換工法で復旧着手 工事は30日間で完了予定]

堤防陥没等 500m（左岸1.0～1.5km：茨城県神栖市横瀬）

[復旧状況 3月16日：盛換工法で復旧着手 工事は25日間で完了予定]

堤防亀裂 100m（左岸8.0～8.1km：茨城県神栖市高浜）

[復旧状況 3月16日：盛換工法で復旧着手 工事は15日間で完了予定]

・横利根川

堤防陥没等 100m（左岸4.5～4.6km：千葉県香取市八筋川）

[復旧状況 3月16日：盛換工法で復旧着手 工事は20日間で完了予定]


護岸崩壊 100m（左岸2.7～2.8km：千葉県香取市筭島）

[復旧状況 3月16日：盛換工法で復旧着手 工事は15日間で完了予定]

東北地方太平洋沖地震 関東地方整備局 直轄河川緊急復旧工事实施状況(速報版)

水系名	河川名	箇所数
利根川	利根川下流	9
	利根川上流	1
	江戸川	2
	小貝川	5
	霞ヶ浦(常陸利根川)	12
那珂川	那珂川	5
久慈川	久慈川	4
合計	3水系7河川	38

平成23年 3月17日 17時現在

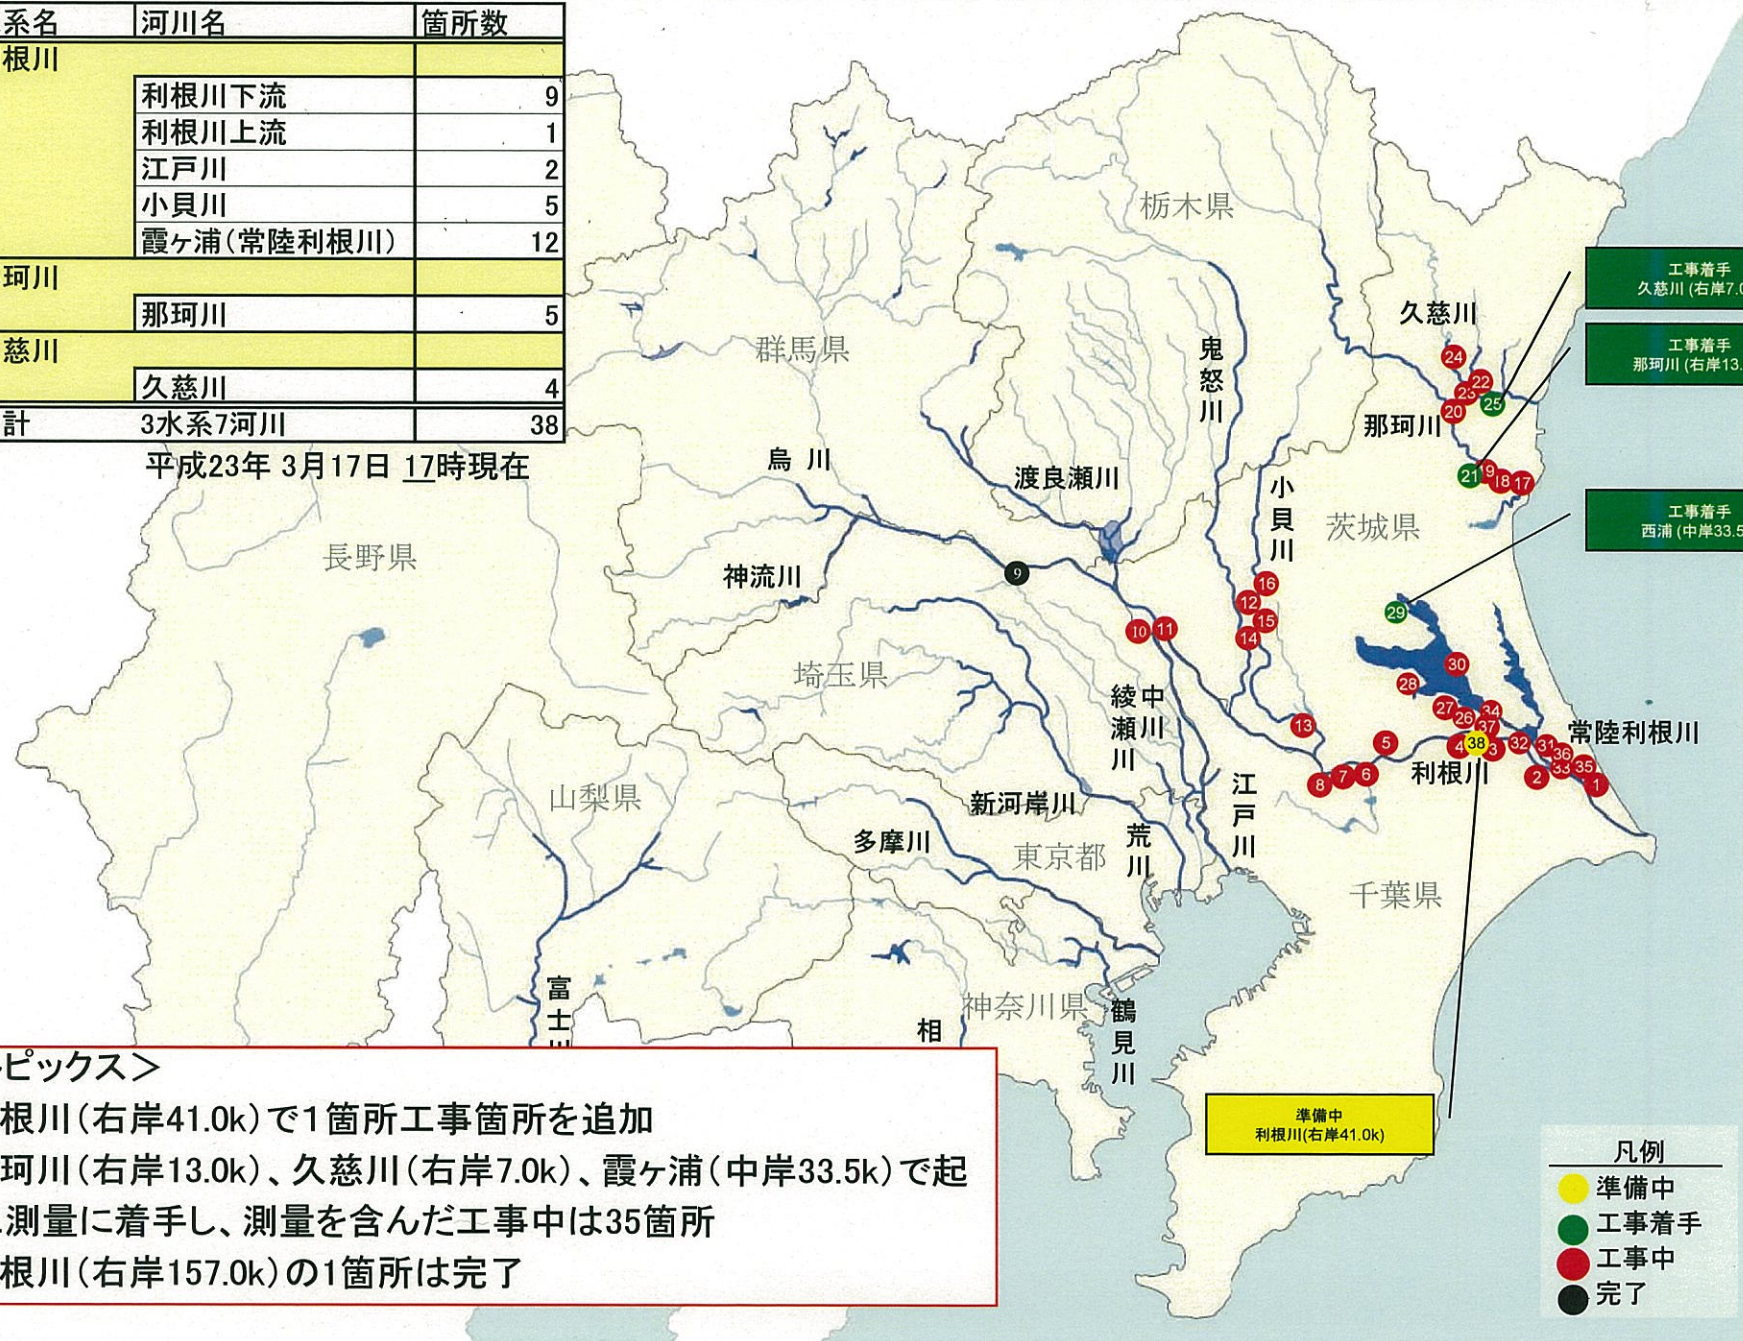

<トピックス>

- ・利根川(右岸41.0k)で1箇所工事箇所を追加
- ・那珂川(右岸13.0k)、久慈川(右岸7.0k)、霞ヶ浦(中岸33.5k)で起工測量に着手し、測量を含んだ工事中は35箇所
- ・利根川(右岸157.0k)の1箇所は完了

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

26

地先名: 茨城県稲敷市本新地先
河川名: 常陸利根川 西浦(右岸1.8k~6.0k)

平成23年 3月17日 17:00現在



- ・被災内容: 堤防沈下・クラック L=4,250m
- ・復旧工法: 盛換工法 約26,000m³
- ・着手日: 平成23年3月16日
- ・工事期間: 50日間程度
- ・現在の状況: 起工測量完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

27

地先名: 茨城県稲敷市尾島地先
河川名: 常陸利根川 西浦(右岸7.6k~8.0k)

平成23年 3月17日17:00現在



被災状況

- ・被災内容: 堤防沈下(液状化) L=400m
- ・復旧工法: 盛換工法 約8,000m³
- ・着手日: 平成23年3月16日
- ・工事期間: 20日間程度
- ・現在の状況: 起工測量完了



被災状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

28

地先名: 茨城県稲敷郡美浦村余郷入地先

河川名: 常陸利根川 西浦(右岸26.3k~26.5k)

平成23年 3月17日 17:00現在



- ・被災内容: 堤防沈下・亀裂 L=250m
- ・復旧工法: 盛換工法 約3,000m³
- ・着手日: 平成23年3月16日
- ・工事期間: 15日間程度
- ・現在の状況: 起工測量完了




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

29

地先名:茨城県石岡市井関地先

河川名:常陸利根川 西浦(中岸33.1k~34.0k)

平成23年 3月17日 17:00現在

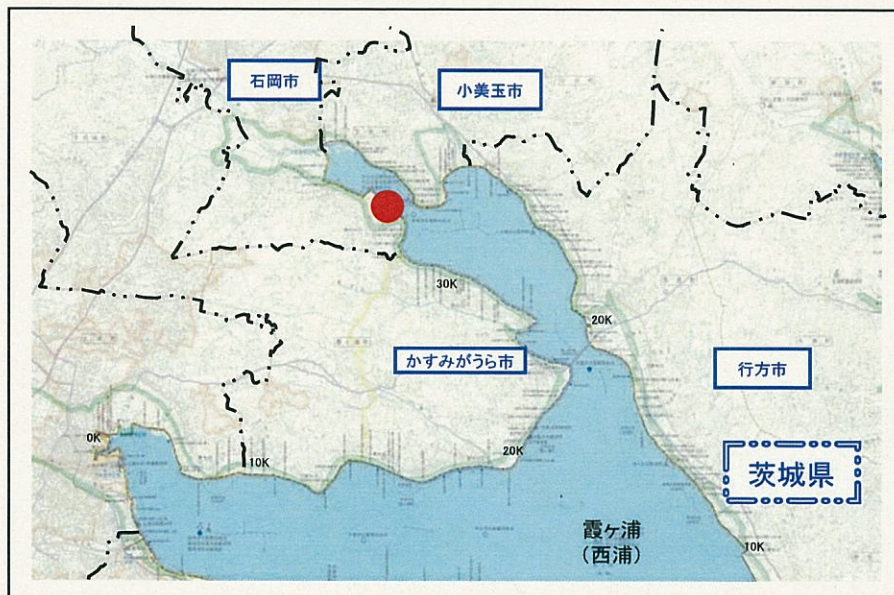

- ・被災内容:堤防沈下・亀裂 L=900m
- ・復旧工法:盛換工法 約10,000m³
- ・着手日:平成23年3月17日
- ・工事期間:30日間程度
- ・現在の状況:起工測量中



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

30 地先名: 茨城県行方市小高地先
河川名: 常陸利根川 西浦(左岸8.0k~10.0k)

平成23年 3月17日 17:00現在



被災状況

- ・被災内容: 堤防沈下・クラック L=2,000m
- ・復旧工法: 盛換工法 約8,000m³
- ・着手日: 平成23年3月16日
- ・工事期間: 30日間程度
- ・現在の状況: 起工測量完了



被災状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

31

地先名:茨城県神栖市息栖地先

河川名:常陸利根川 常陸川(左岸10.8k~11.0k)

平成23年3月17日 17:00現在



・被災内容:堤防沈下(樋管上下流)

・復旧工法:シート張り 約60m²
土嚢設置 約60m²

・着手日:平成23年3月15日

・工事期間:10日間程度

・現在の状況:起工測量完了




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

32

地先名:千葉県香取市一ノ分目地先

河川名:常陸利根川 外浪逆浦(右岸0.8k~1.2k)

平成23年 3月17日 17:00現在

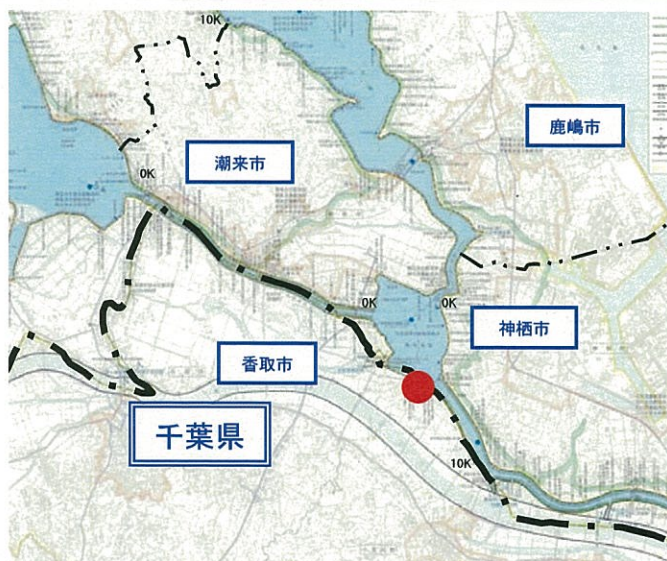

- ・被災内容:護岸破損 L=400m
- ・復旧工法:シート張り 約800m²
土嚢設置 約800m²
- ・着手日:平成23年3月16日
- ・工事期間:15日間程度
- ・現在の状況:起工測量完了




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

33

地先名:茨城県神栖市日川地先

河川名:常陸利根川 常陸川(右岸2.5k~5.0k)

平成23年 3月17日 17:00現在

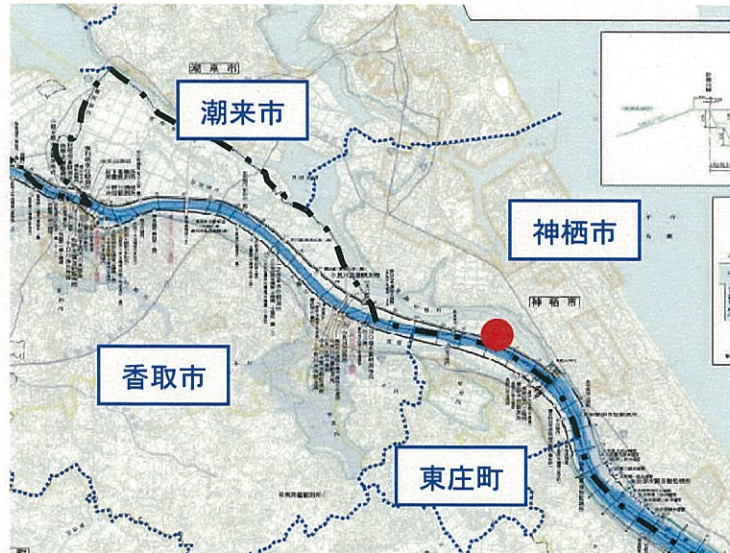

被災状況



- ・被災内容:堤防陥没 L=2,500m
- ・復旧工法:盛換工法 約5,000m³
- ・着手日:平成23年3月16日
- ・工事期間:30日間程度
- ・現在の状況:起工測量完了

被災状況




東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

34

地先名:千葉県香取市安筋川地先

河川名:常陸利根川 横利根川(左岸4.5k~4.6k)

平成23年 3月17日 17:00現在

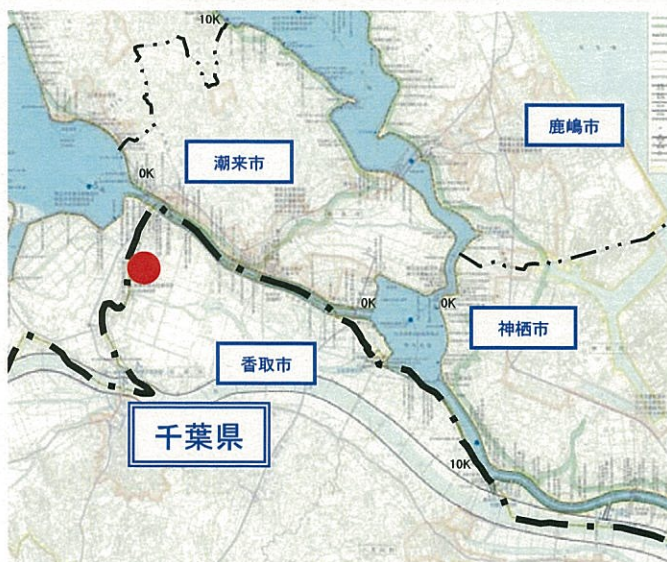

- ・被災内容:堤防沈下・陥没 L=100m
- ・復旧工法:盛換工法 約400m³
- ・着手日:平成23年3月16日
- ・工事期間:20日間程度
- ・現在の状況:起工測量完了



東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

35

地先名: 茨城県神栖市横瀬地先

河川名: 常陸利根川 常陸川(左岸1.0k~1.5k)

平成23年 3月17日 17:00現在



被災状況

- ・被災内容: 堤防陥没・クラックL=500m
- ・復旧工法: 盛換工法 約3,000m³
- ・着手日: 平成23年3月16日
- ・工事期間: 25日間程度
- ・現在の状況: 起工測量完了



被災状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

36

地先名:茨城県神栖市高浜地先

河川名:常陸利根川 常陸川(左岸8.0k~8.1k)

平成23年 3月17日 17:00現在



被災状況

- ・被災内容:堤防川表法面亀裂L=100m
- ・復旧工法:盛換工法 約300m³
- ・着手日:平成23年3月15日
- ・工事期間:15日間程度
- ・現在の状況:起工測量完了



被災状況

東北地方太平洋沖地震 直轄河川緊急復旧工事実施状況(速報版)

37

地先名:千葉県香取市筭島地先

河川名:常陸利根川 横利根川(左岸2.7k~2.8k)

平成23年 3月17日 17:00現在



- ・被災内容:護岸崩壊L=100m
- ・復旧工法:盛換工法 約200m³
- ・着手日:平成23年3月16日
- ・工事期間:15日間程度
- ・現在の状況:起工測量完了

