

第5回 稲戸井調節池整備・活用検討懇談会

稲戸井調節池 事業の進捗状況について

平成21年2月25日

国土交通省 利根川上流河川事務所

## ■ 稲戸井調節池 事業の進捗状況について

### 1. 事業の種類

利根川の治水能力向上を目的とした稲戸井調節池事業

### 2. 事業の実施区域

茨城県守谷市～取手市地先

### 3. 事業の規模

#### (1) 事業全体の概要

全体面積：約 4.48km<sup>2</sup>

現況治水容量：約 1,800 万 m<sup>3</sup>

#### (2) 調節池化事業

越流施設の設置、長浜排水路の付け替え、囲繞堤の締め切り

#### (3) 治水容量の増強

掘削深：現況地盤高 (YP+8.0m) から約 5m 程度

掘削面積：約 2.4km<sup>2</sup>

掘削土量：約 1,200 万 m<sup>3</sup>

### 4. 事業の進捗状況

現在、調節池化工事を実施しており、平成 21 年 5 月に調節池化が完成する予定である。平成 21 年度以降は、稲戸井調節池の掘削計画を踏まえた自然環境への配慮・利活用のあり方等について、「稲戸井調節池整備・活用検討懇談会」で意見をいただきながら、試験掘削工事を行い、その結果を受けて、本掘削工事を実施する予定である。

#### 調節池化事業

- ・長浜排水路付け替え
- ・越流施設の設置、囲繞堤の締め切り部（平成 21 年 5 月完成予定）

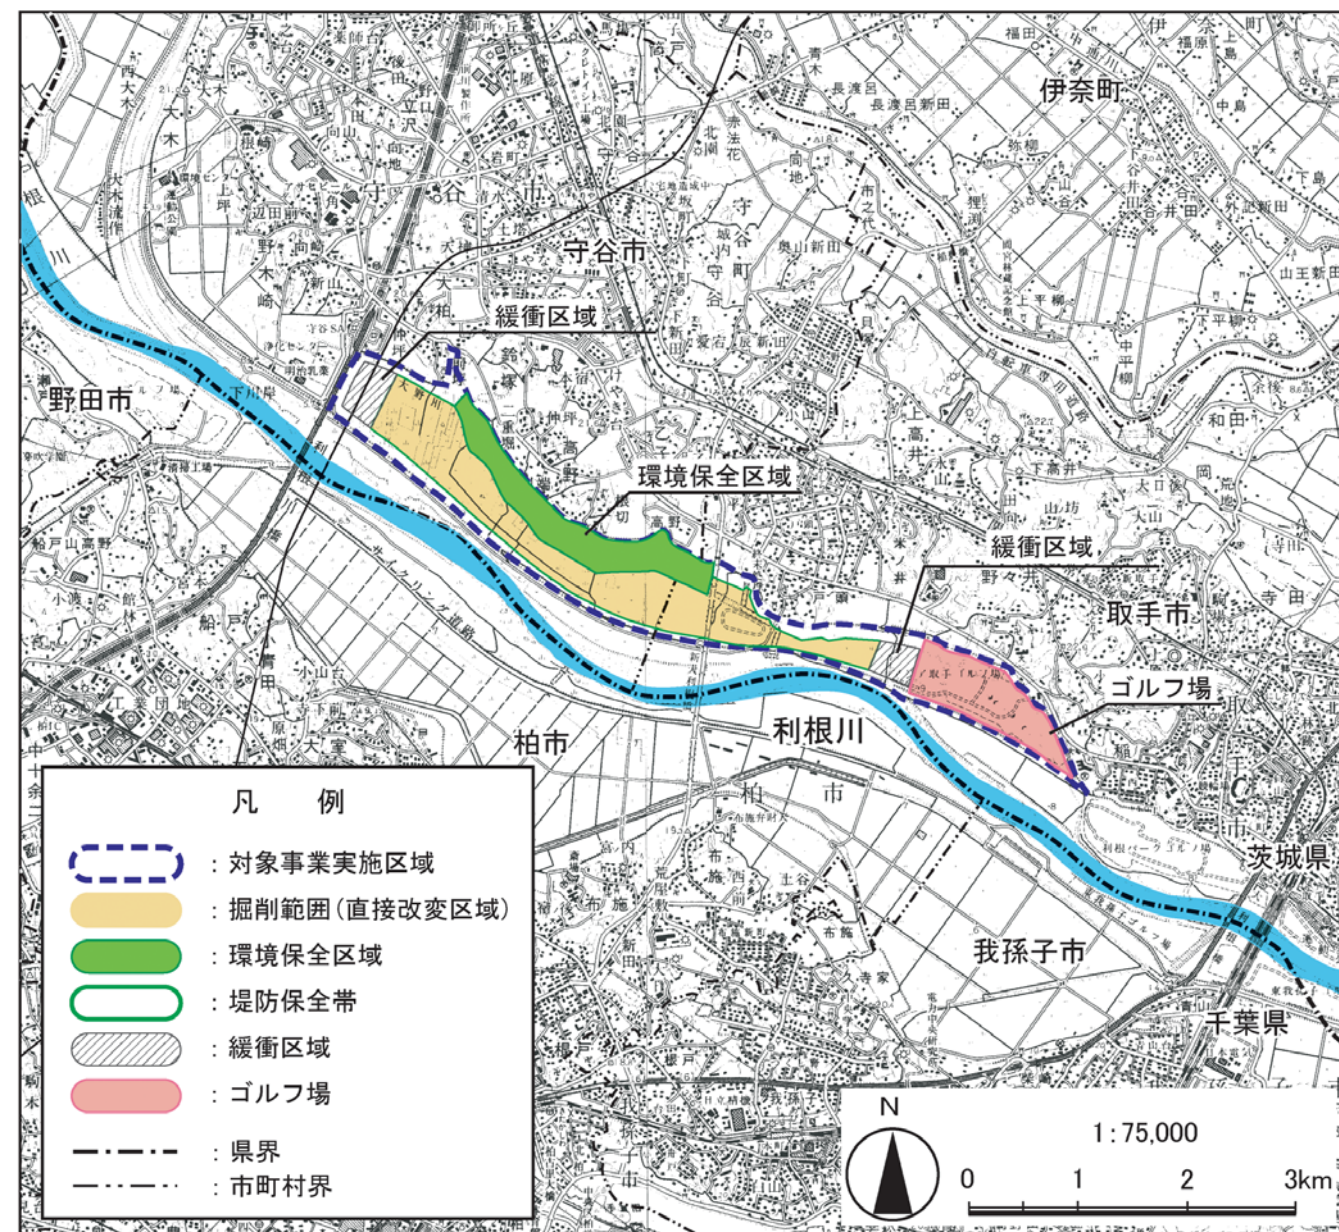


図 1 稲戸井調節池掘削事業計画 概要図

