

応急復旧工事の進捗状況について

平成27年9月12日 16時現在

● 9月11日 22時より根固めブロック等を投入中。(写真参照)


● 引き続き、24時間体制で根固めブロック等を投入予定。

● 進捗率 (9月12日 16時現在)

退避場・作業ヤード造成 完了 (9月10日着手～9月11日完了)

荒締切工 5.0% (9月11日着手)  
※着手より荒締切工までを1週間程度で完了予定

鋼矢板による締切工 0.0% (未着手)  
※荒締切工完了より1週間程度で完了予定

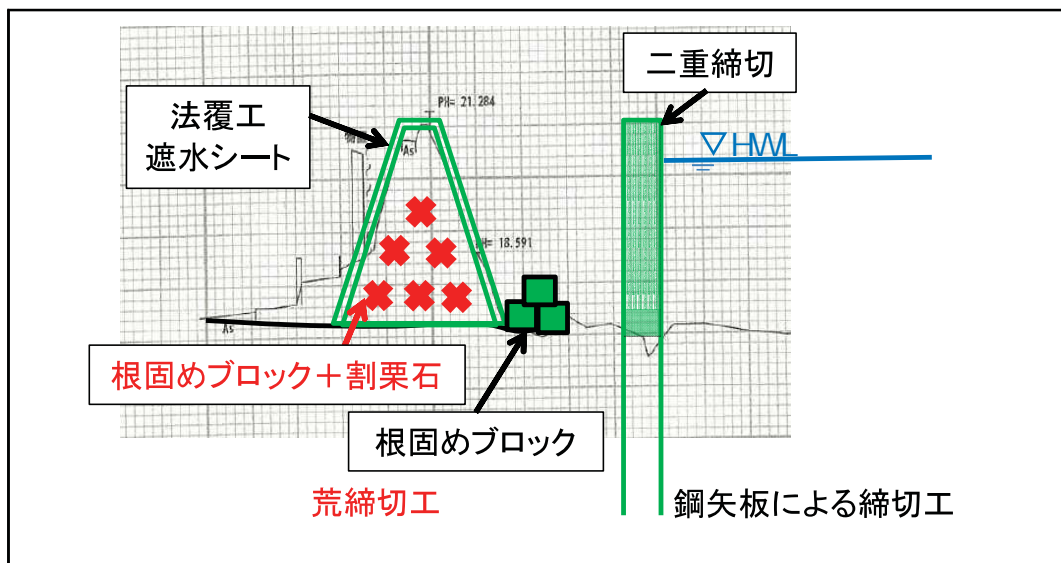

応急復旧工事実施状況（9月12日 3時頃）



応急復旧工事実施状況（9月12日 11時頃）



応急復旧工事実施状況（9月12日 14時30頃）

