

応急復旧工事の進捗状況について

平成27年9月15日 15時現在

● 9月11日22時より荒締切に着手。


● 進捗率（9月15日 15時現在）

退避場・作業ヤード造成 完了（9月10日着手～9月11日完了）

荒締切工 51.4%（9月11日着手）
 ※着手より荒締切工までを1週間程度で完了予定

鋼矢板による締切工 0.0%（未着手）
 ※荒締切工完了より1週間程度で完了予定

概略図

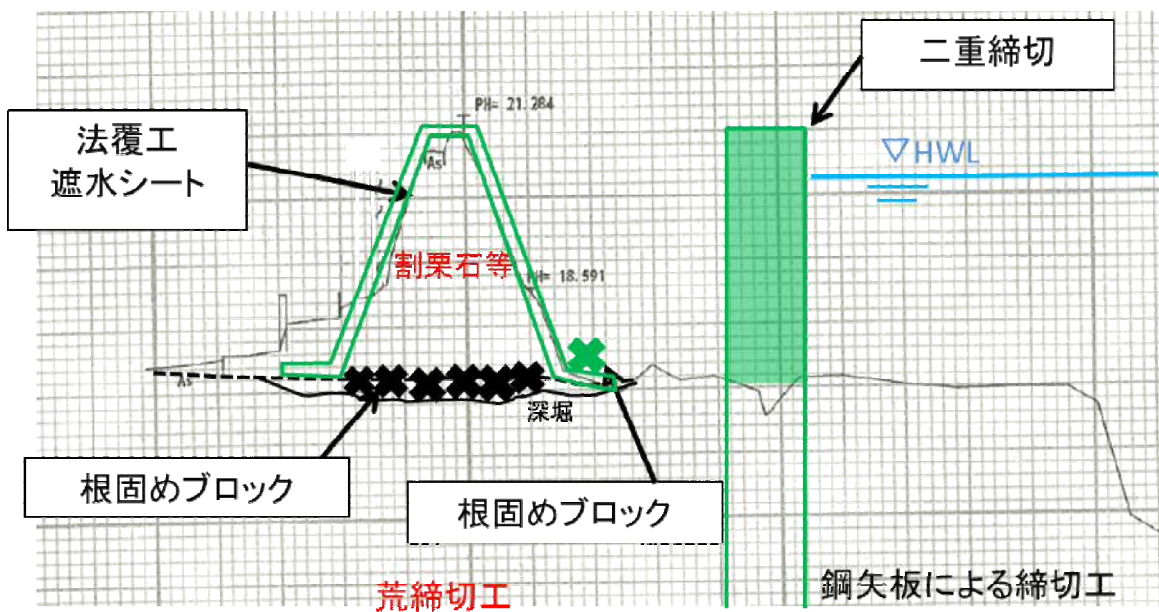

※荒締切については、ある程度水位が高い中での施工を想定して根固めブロックと割栗石等による構造で施工していましたが、河川水位が低下したことなどから、割栗石等による構造に変更しています。

応急復旧工事実施状況（9月15日 15時頃）



下流側

破堤箇所川裏側



下流側

法面整形
