

速報値

平成27年9月関東・東北豪雨による出水状況報告

平成27年9月20日15:00現在

※これは速報値であり、数値等は今後変わることがあります。

1. 浸水被害の状況

(直轄管理)

9月20日15時時点

事務所	河川名		被災箇所数
利根川下流	利根川下流	利根川下流	調査中
利根川上流	利根川上流	利根川上流	2
		南摩川	1
霞ヶ浦	常陸利根川	霞ヶ浦	調査中
江戸川	江戸川		0
	中川		0
	綾瀬川		0
下館河川	鬼怒川	鬼怒川	92
	小貝川	小貝川	17
	田川		7
	大谷川		2
渡良瀬川	渡良瀬川	渡良瀬川	1
		秋山川	2
荒川上流	荒川上流	都幾川	1
荒川下流	荒川下流		0
京浜	多摩川		0
	鶴見川		0
	相模川		0
高崎河川	烏川	碓氷川	1
常陸	那珂川		2
	久慈川		0
合計			128

(都県管理)


県名	水系名	被災箇所数			
		溢水	越水	決壊	法崩れ・護岸崩落
茨城県	利根川	0	27	8	79
	那珂川	0	5	0	25
栃木県	那珂川	0	0	3	1
	利根川	7	1	1	6
埼玉県	利根川	4	0	0	2
	荒川	6	0	0	1
千葉県	村田川	0	0	0	1
	平久里川	0	0	0	1
山梨県	富士川	0	0	0	3
合計		17	33	12	119

応急復旧工事の進捗状況について

平成27年9月20日15時現在

- 決壊した堤防については、24時間体制で応急復旧工事を実施。
16日に、仮堤防が完成。
- 鋼矢板打設を9月18日15時30分より着手。
- 現在、護岸や矢板による補強工事を進めており、来週中に応急復旧を全て完了する予定。
- 進捗率（9月20日 15時現在）
 - 退避場・作業ヤード造成 完了（9月10日着手～9月11日完了）
 - 荒締切工 完了（9月11日着手）
※16日に仮堤防が完成
 - 鋼矢板による締切工 18.0%（9月18日着手）
※着手より鋼矢による締切工までを1週間程度で完了予定

概略図

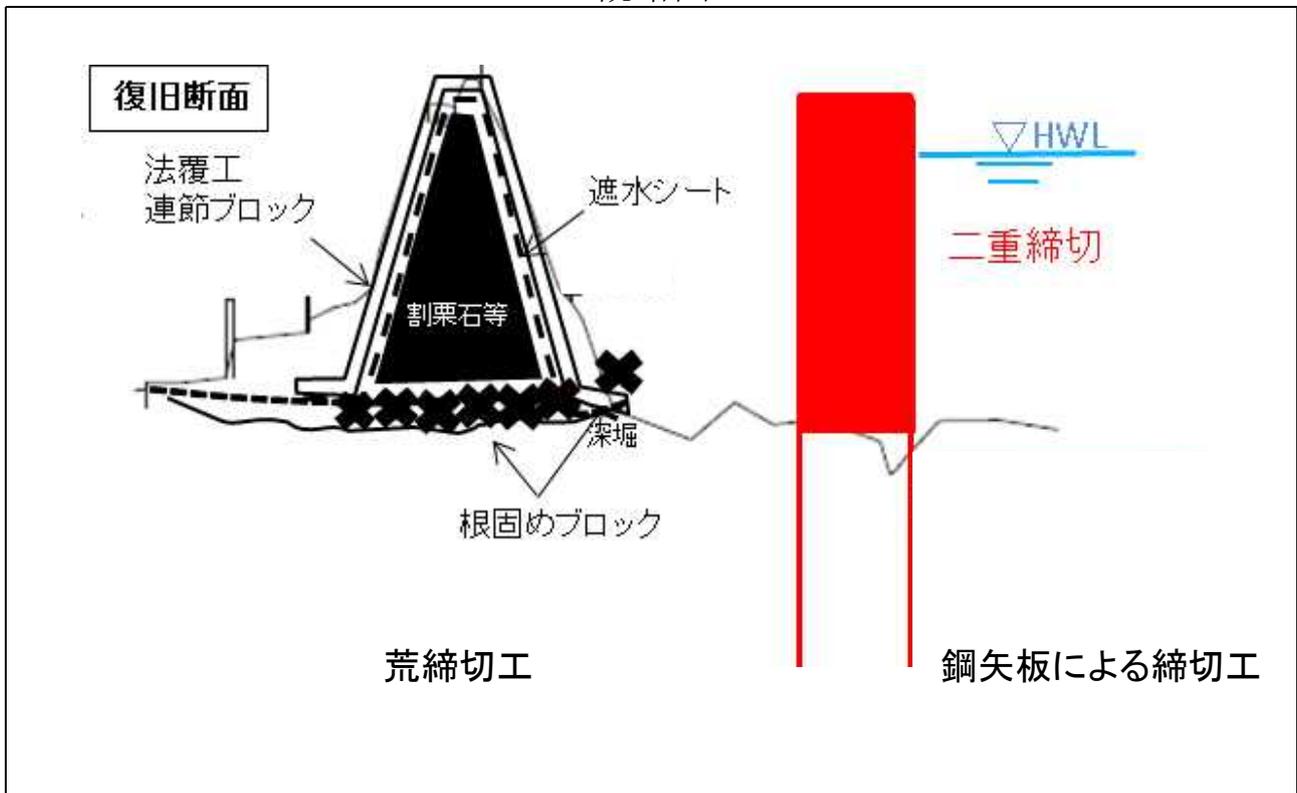

応急復旧工事実施状況（9月20日 14時00分頃）



鋼矢板打設状況(川表より)

応急復旧工事実施状況（9月20日 14時00分頃）



鋼矢板打設状況(川表より上流側をのぞむ)
