


入間川流域緊急治水対策プロジェクト位置図



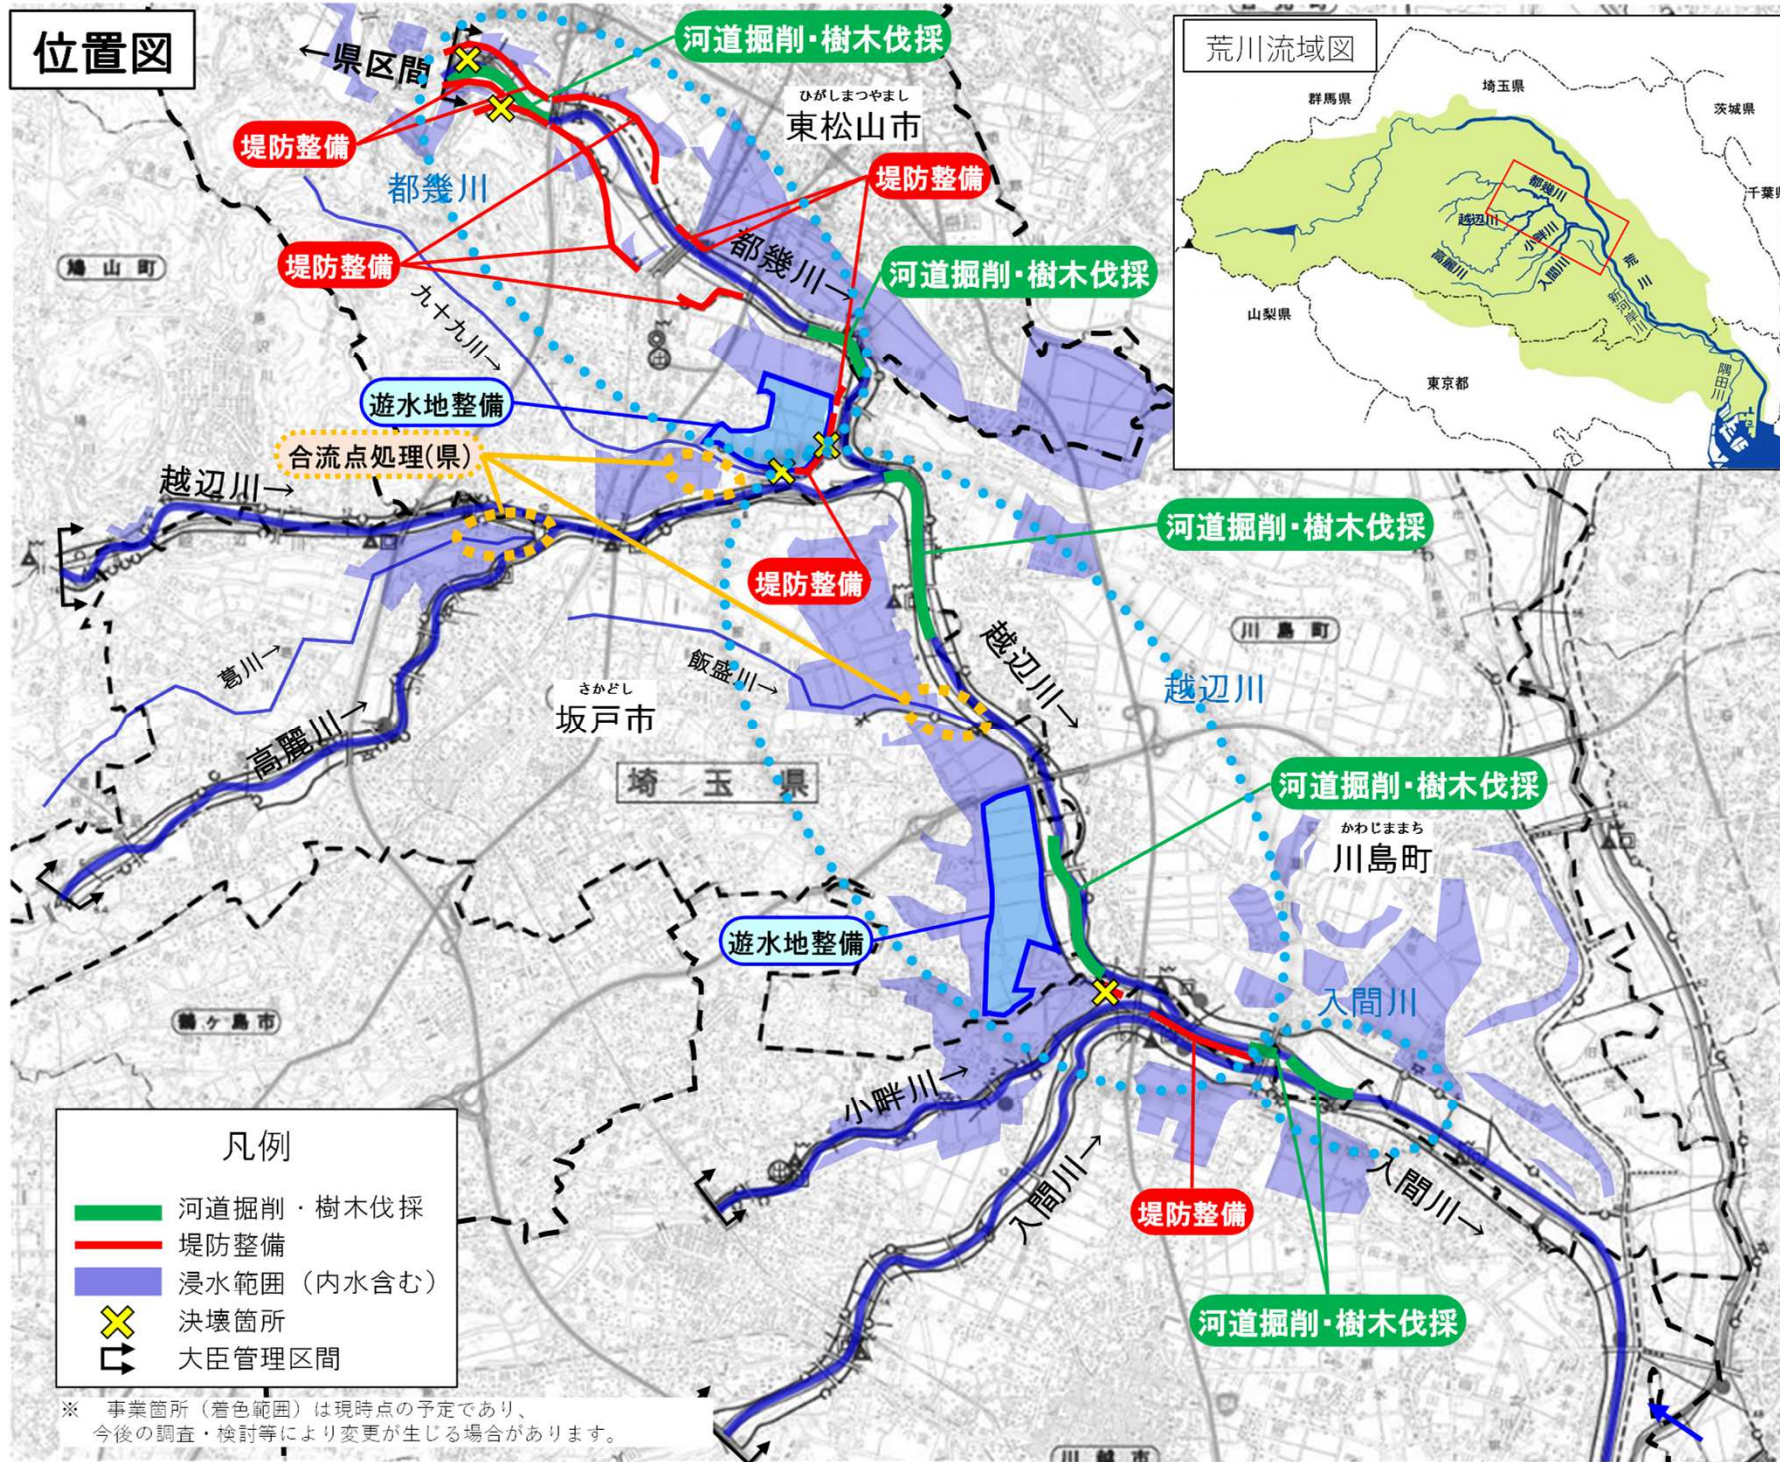

【整備手順の考え方と進捗状況】

河道掘削は上下流バランスを踏まえ、下流入間川区間から実施し、全体的な水位低下を図ります。並行して都幾川区間では堤防整備を先行的に進め、安全に流せる洪水の量を増加させます。


		進捗	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和6年度 以降
入間川	河道掘削・樹木伐採 約39万m ³	68.6%		測量 施工				
	用地取得	70.5%		用地調査・用地取得（河道掘削）				
越辺川	河道掘削・樹木伐採 約60万m ³	5.4%		測量 施工				
	堤防整備 約9万m ³	20.0%		施工				
	遊水地（周囲堤） 約53万m ³	0%	検討		測量 施工			
	用地取得	18.3% 0%		用地調査・用地取得（河道掘削） 用地調査・用地取得（遊水地）				
都幾川	河道掘削・樹木伐採 約12万m ³	0%		測量 施工				
	堤防整備 約54万m ³	6.3%		測量 施工				
	遊水地（周囲堤） 約31万m ³	0%	検討		測量 施工			
	用地取得	14.5% 0%		用地調査・用地取得（河道掘削・築堤） 用地調査・用地取得（遊水地）				

※数量・スケジュールは現時点での予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。

※上記の対策の他、河川管理上必要な対策を行う場合があります。

※国管理区間のみの進捗状況を示しています。

■遊水地整備にともない、用排水路の付け替えや遊水地内に水路を引き込むための樋管の整備、遊水地内へのアクセスのための坂路の設置位置などについては、今後、詳細検討の結果を踏まえ、各管理者と調整し決定していきます。

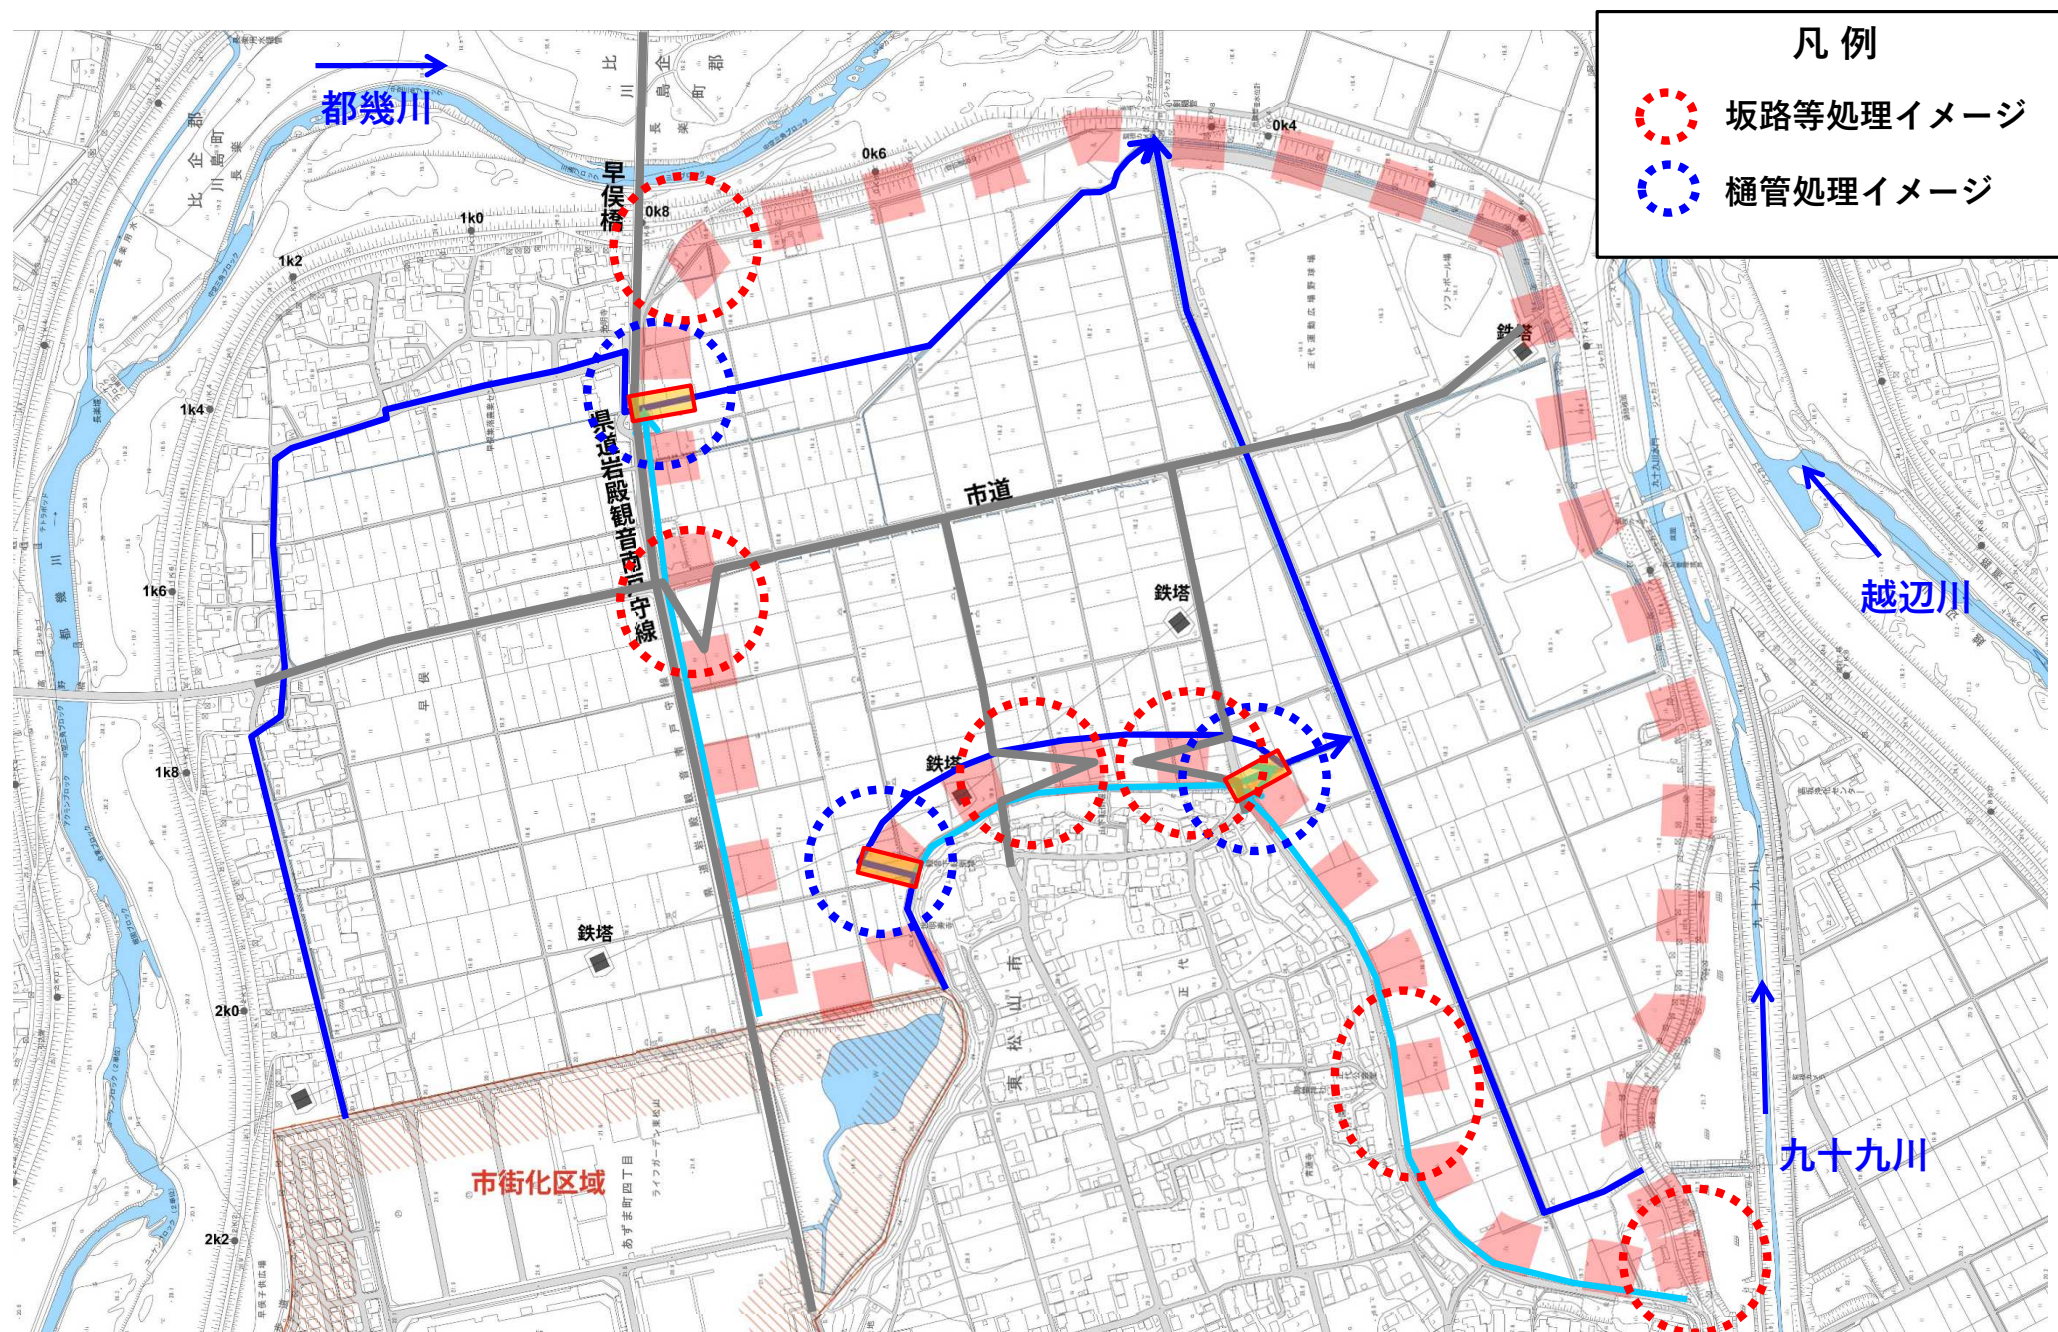

※記載の内容は、R3.12.2時点での検討状況等を素案として整理しているものであり、確定したものではありません。
 引き続き検討を進めつつ見直す場合もあります。
