

上尾市平方地区 基礎地盤崩落復旧状況⑤

 荒川上流河川事務所

令和3年9月21日(火)16時30分ごろ発生した、荒川左岸48.5km付近(埼玉県上尾市平方地先)の小堤工事区域内の基礎地盤崩落箇所の工事状況のお知らせです。

現在の現地状況

施工範囲のブロック等の支障物撤去に時間を要しておりましたが、4月25日より河道内の土砂を撤去するための建設機械の足場確保を目的とした地盤改良を始めました。

建設機械の足場確保した後、6月上旬より河道内の崩落土砂撤去を始めます。

今後は、建設資材や撤去した土砂の運搬に伴う工事車両の通行が多くなります。

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、引き続きご理解ご協力のほど

よろしく申し上げます。



支障物状況

地盤改良工施工状況 令和4年5月17日撮影

今後の予定は裏面に記載


お問い合わせ先

関東地方整備局荒川上流河川事務所 工務課

049-246-6359 (直通)

今後の予定

施工範囲のブロック等の支障物撤去に時間を要したため、地盤改良着手が当初より遅れましたが、引き続き安全に努めながら進めて参ります。

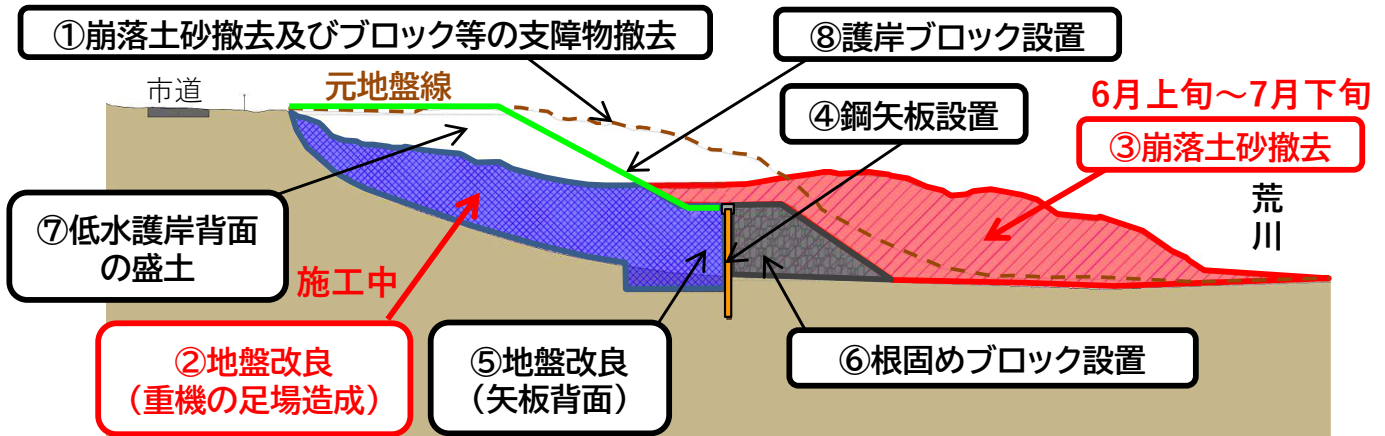

※現地の状況に応じ施工の手順や施工期間が変更になる場合があります。

工事のスケジュール

工事内容	令和4年											令和5年		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
① 崩落土砂撤去及びブロック等の支障物撤去	■													
② 地盤改良(重機の足場造成)		■	■	■										
③ 崩落土砂撤去				■	■	■								
④ 鋼矢板設置(低水護岸)						■	■							
⑤ 地盤改良(矢板背面)							■	■						
⑥ 根固めブロック設置								■	■	■	■			
⑦ 低水護岸背面の盛土											■	■		
⑧ 護岸ブロック設置												■	■	

施工状況写真



施工状況全景

地盤改良工事
(建設機械の足場確保のための改良)

【受注者】お問い合わせ先



戸田建設株式会社 R3入間川右岸古谷樋管改築工事作業所
〒350-0001 埼玉県川越市古谷上5890 リエス川越南古谷3階
TEL : 049-238-4293 FAX : 049-238-4294
現場責任者 齋藤 正昭 (さいとう まさあき) TEL : 080-1039-3485
担当技術者 中山 駿輔 (なかやま しゅんすけ) TEL : 090-8007-9096

【発注者】お問い合わせ先



荒川上流河川事務所 西浦和出張所 (担当者 菅野、伊藤)
TEL : 048-861-9129 FAX : 048-839-4670
