

地域の住民の皆様には、日頃より『那珂川治水対策プロジェクト』へのご理解、ご協力を頂き誠にありがとうございます。

令和7年5月より実施しております、那珂川左岸 三反田地区の堤防整備の工事につきまして、7月より重機での作業を開始しました。8月中には付帯道路工の路盤工まで施工を完了しております。9月の工事予定は主に盛土工・法面整形の施工を進めて行く予定となっております。

工事期間中は、安全に細心の注意を払い、早期に完成するよう努めて参りますので、皆様のご理解、ご協力の程、重ねてお願い申し上げます。

工事概要

- 【工事名】 R6那珂川左岸三反田地区築堤工事
- 【工事場所】 茨城県ひたちなか市三反田地先
- 【施工業者】 樋口土木株式会社
- 【工事期間】 令和7年5月1日～令和8年3月16日

※天候等の影響により、工期が変更になる場合があります。

- 【作業時間】 8時～17時(作業の都合により早朝頃より重機の移動を行う場合があります。)
- ※基本的には、土曜・日曜は休工となりますが、工事の進捗状況に応じて作業を行う場合があります。

- 【工事内容】 1工区：堤脚水路工149m、縁石工220m、付帯道路工210m、築堤工210m
- 2工区：堤脚水路65.0m、築堤工65m

- 【連絡先】 ○国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所水戸出張所
TEL：029-221-2794
- 樋口土木株式会社 TEL：029-842-8134

工事担当職員紹介

担当技術者

(測量・写真・安全管理担当)

高田 瑞樹 (26)

TEL：080-8727-4582



【自己紹介】

令和6年11月、樋口土木(株)に入社し11か月目の新入社員です。現場では主に測量・写真撮影・安全管理等を行っています。早く戦力になれるよう頑張っています。いつも現場にいますので、気軽にお声をかけてください。よろしくお願いします

【工事内容】

1工区

築堤盛土工・法面整形

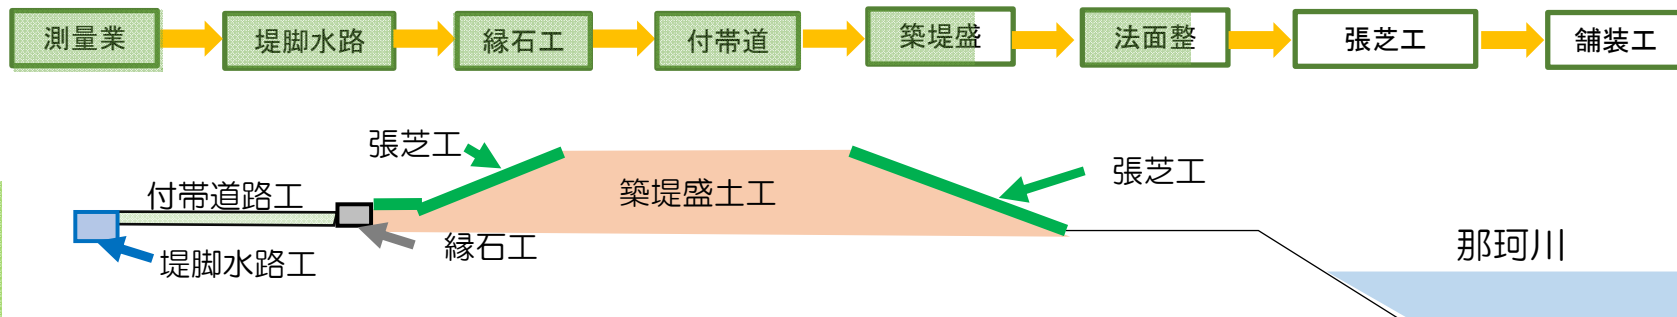

※工事に関係する車両を識別するために、工事車両の前面と後面にステッカーを掲示します。

1工区では、**盛土工・法面整形**の施工と進めていきます。2工区は、側溝工を完了しております。
皆様方にはご不便をおかけしておりますが、安全第一で作業をまいります。なにかお気づきのことがありましたら、
私たち樋口土木職員にお声かけください。



樋口土木株式会社

【1工区における施工状況】



上流部から下流部を望む



下流部から上流部を望む

【2工区における施工状況】



1工区ー盛土状況



2工区ー側溝工完了
