

西湘海岸

R7西湘海岸袋詰玉石製作他工事

■工事箇所

神奈川県二宮町二宮地先 西湘海岸




■工事着手前



■工事について

施工範囲の模式図

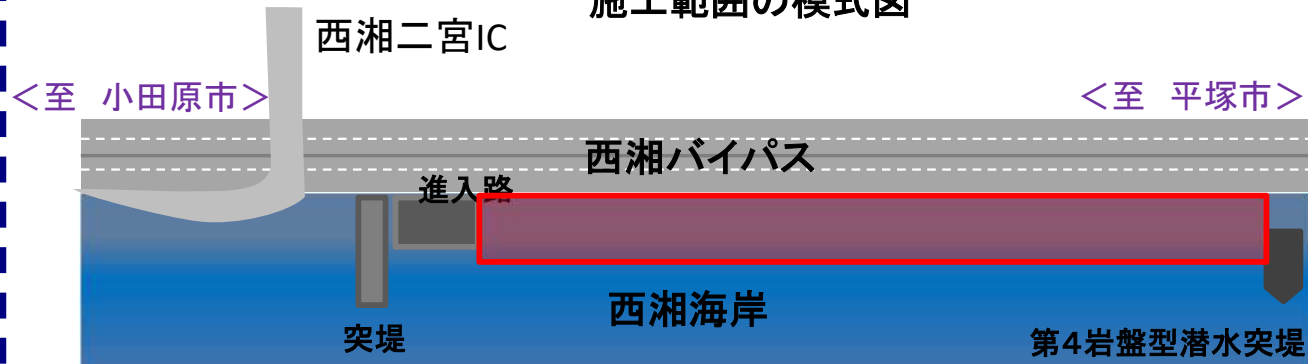

■現在(令和8年5月時点)



工事が完了しました。

工事内容

第2岩盤型潜水突堤進入路を整備するための「袋詰玉石製作」と「養浜」を行う工事です。

工期

令和7年10月1日～令和8年6月30日


この工事に関するお問い合わせは→

京浜河川事務所 相模出張所

神奈川県平塚市中堂246-2 Tel. 0463-21-3713

■工事の内容

令和8年5月時点

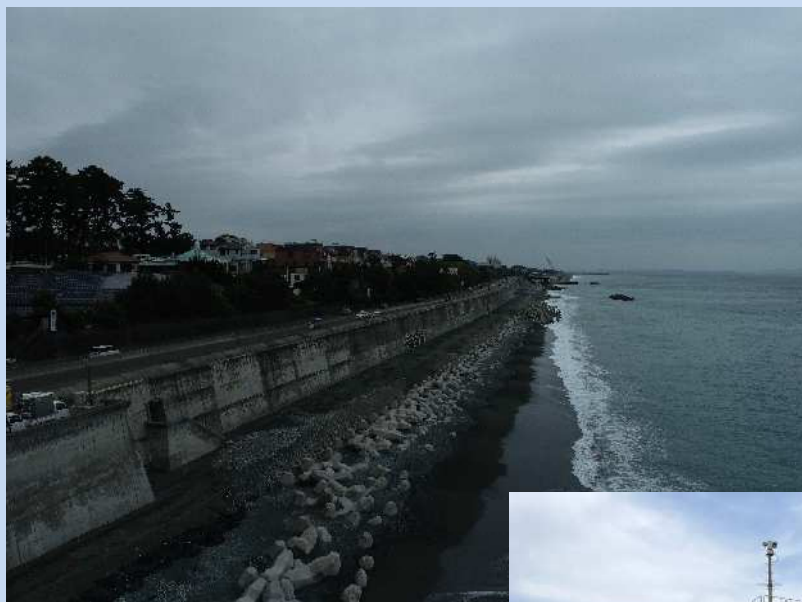

養浜



酒匂川から運搬されてきた砂礫を、
西湘海岸で受入れ養浜しています。

■工事の内容

令和8年4月時点



養浜



三保ダムから運搬されてきた砂礫を、
西湘海岸で受入れ養浜しています。

■工事の内容

令和8年3月時点

袋詰玉石製作



ふるい分けした玉石
を使って1袋4tの袋
詰玉石を製作しまし
た。



工事用道路で使用していた、栈橋の
覆工板を撤去しました。

■工事の内容

令和8年2月時点

袋詰玉石製作



ふるい分けした玉石を使って1袋4tの袋詰玉石を製作しています。



養浜



三保ダムから運搬されてきた砂礫を、西湘海岸で受入れ養浜しています。

■工事の内容

令和8年1月時点


袋詰玉石製作



袋詰玉石を製作するため、スケルトンバケットを付けたバックホウで玉石をふるい分け分別しています。



養浜

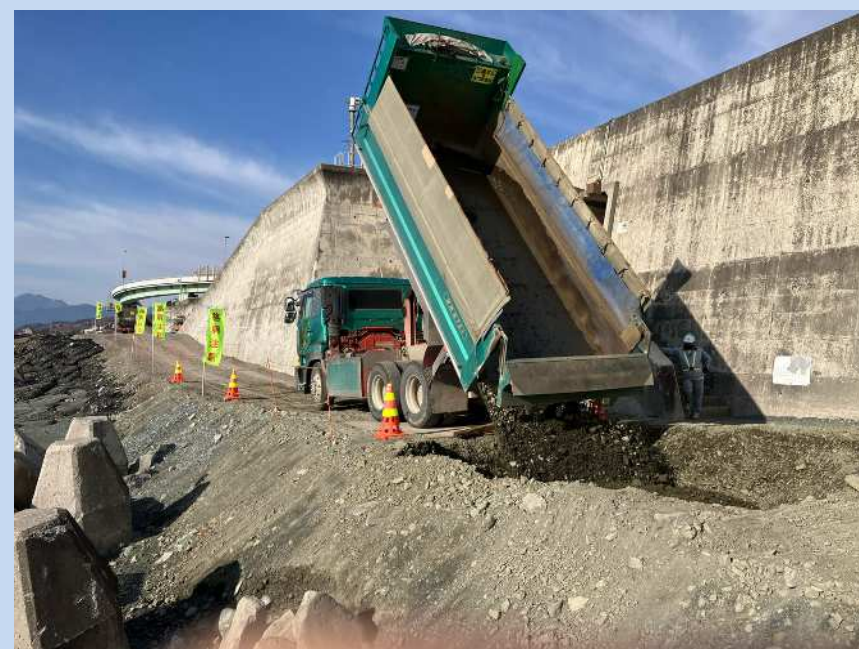

三保ダムから運搬されてきた砂礫を、西湘海岸で受入れています。

■工事の内容

令和7年12月時点

袋詰玉石製作



袋詰玉石を製作するための土砂を採取しています。



養浜



三保ダムから運搬されてきた砂礫を、西湘海岸で敷均しています。

■工事の内容

令和7年11月時点



三保ダムから運搬されてきた土砂を、西湘海岸で敷均しています。

■工事の内容



袋詰玉石(4トン)の製作例です。



流砂系における土砂管理と水循環の概念図



酒匂川上流部の三保ダムに堆積した土砂の掘削状況です。

(写真提供:
神奈川県三保ダム管理事務所)



掘削した土砂のストックヤードの状況です。

(写真提供:
神奈川県三保ダム管理事務所)

三保ダムの掘削土砂を、西湘海岸の養浜に活用します。
