

(再評価)

富士川 総合水系環境整備事業

令和8年9月30日
国土交通省 関東地方整備局

「富士川総合水系(富士川・笛吹川・釜無川)の環境整備事業(水辺整備)」に関するアンケート調査ご協力をお願い

令和8年3月
国土交通省関東地方整備局
甲府河川国道事務所

平素より、河川行政にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所では、「富士川総合水系(富士川・笛吹川・釜無川)の環境整備事業(水辺整備)」を進めるにあたり、皆様の意見を伺いたくアンケート調査を実施することとなりました。

水辺整備とは、河川空間をより良いものとするため、川に親しめる場所の整備を行うことを目的とした事業です。

このアンケートは、事業の成果を金額におきかえて評価することを目的として実施するものです。

お忙しいところ、誠に恐れ入りますが、本アンケート調査の目的をご理解いただき、ご協力下さいますようお願いいたします。

■ご回答にあたって

・ご回答いただいた内容は、全て統計的に処理します。

・また、ご回答いただいた内容は、個人情報保護法に準拠し取り扱ったとしても、本調査の目的以外に使用することはありません。

・このアンケートには、河川環境整備事業による効果をお金の価値に置き換えて評価する(仮想的市場評価法(CVM法)という)、一般にはあまりなじみのない質問形式の設問がありますので、ご了承ください。

・この調査の回答を基に、皆様の世帯から実際に負担金を徴収することは決してありません。

当アンケートの回答者の皆様へお願い

- 「調査についての守秘義務」の徹底をお願いしています。決して第三者に口外しないよう、ご協力お願いします。
- 回答内容は調査依頼元に提供されます。設問とは関係のない情報が入力されていないかご確認ください。
- 回答内容の取扱いには、プライバシーポリシーをご確認ください。

主催:株式会社マクロミル

当アンケートではあなたの
「都道府県以下のご住所の一部(郵便番号・町丁目等)」に関して
お伺いする箇所が含まれております。
趣旨にご同意くださる方は、「同意する」のご回答をお願いいたします。

回答をしたくないと判断された場合は本設問で「同意しない」をご選択いただくか、
回答途中でブラウザを閉じて、アンケートを終了していただくことも可能です。
※「同意しない」を選択した場合、または途中で回答終了された場合、それまでの回答分謝礼は進呈
されません。
予めご了承ください。

Q1 こちらの内容にご同意いただき、本アンケートにご参加いただけますか。
【必須入力】

- ☐ 1. 同意する
☐ 2. 同意しない

富士川総合水系（富士川・笛吹川・釜無川） 環境整備事業（水辺整備）説明資料

事業の目的

- ・ 富士川流域は平地の割合が少ないため、河川空間は地域の貴重なオープンスペースとして重要です。
- ・ この事業では、安全・安心な河川管理用施設を整備し、流域市町村のまちづくりと一体となった賑わいのある水辺空間、川と触れ合い、親しめる空間の創出を支援します。

整備の概要と利用の状況

- ・ 富士川水系では8か所の整備が計画されており、7か所は整備完了、1か所が整備中です。
- ・ 流域自治体の「かわまちづくり」計画と連携し、花火大会やイベント等にも活用できる階段護岸や、水辺に近づける親水護岸、安全に河川敷に近づけ、散策やサイクリングに利用できる通路や散策路等を整備しています。

整備範囲の例

【階段護岸・親水護岸の整備】 : 国整備範囲 : 自治体整備範囲（今回評価対象外）



笛吹三川合流地区



増穂地区



雁・木島・五貫島地区

【散策路・基盤整備】



沼久保地区



増穂地区




鰍沢地区

▼ 画像をクリックして、別画面で表示される画像をご覧ください。▼
※クリック必須



個別箇所の説明を詳しくご覧になりたい方は、下記をクリックしてください。（別画面にて解説が見られます。）

- (1) 万力公園地区[画像を拡大]
- (2) 笛吹三川合流地区[画像を拡大]
- (3) 市川三郷地区[画像を拡大]
- (4) 信玄堤地区[画像を拡大]
- (5) 増穂地区[画像を拡大]
- (6) 鯉沢地区[画像を拡大]
- (7) 沼久保地区[画像を拡大]
- (8) 雁・木島・五貫島地区[画像を拡大]

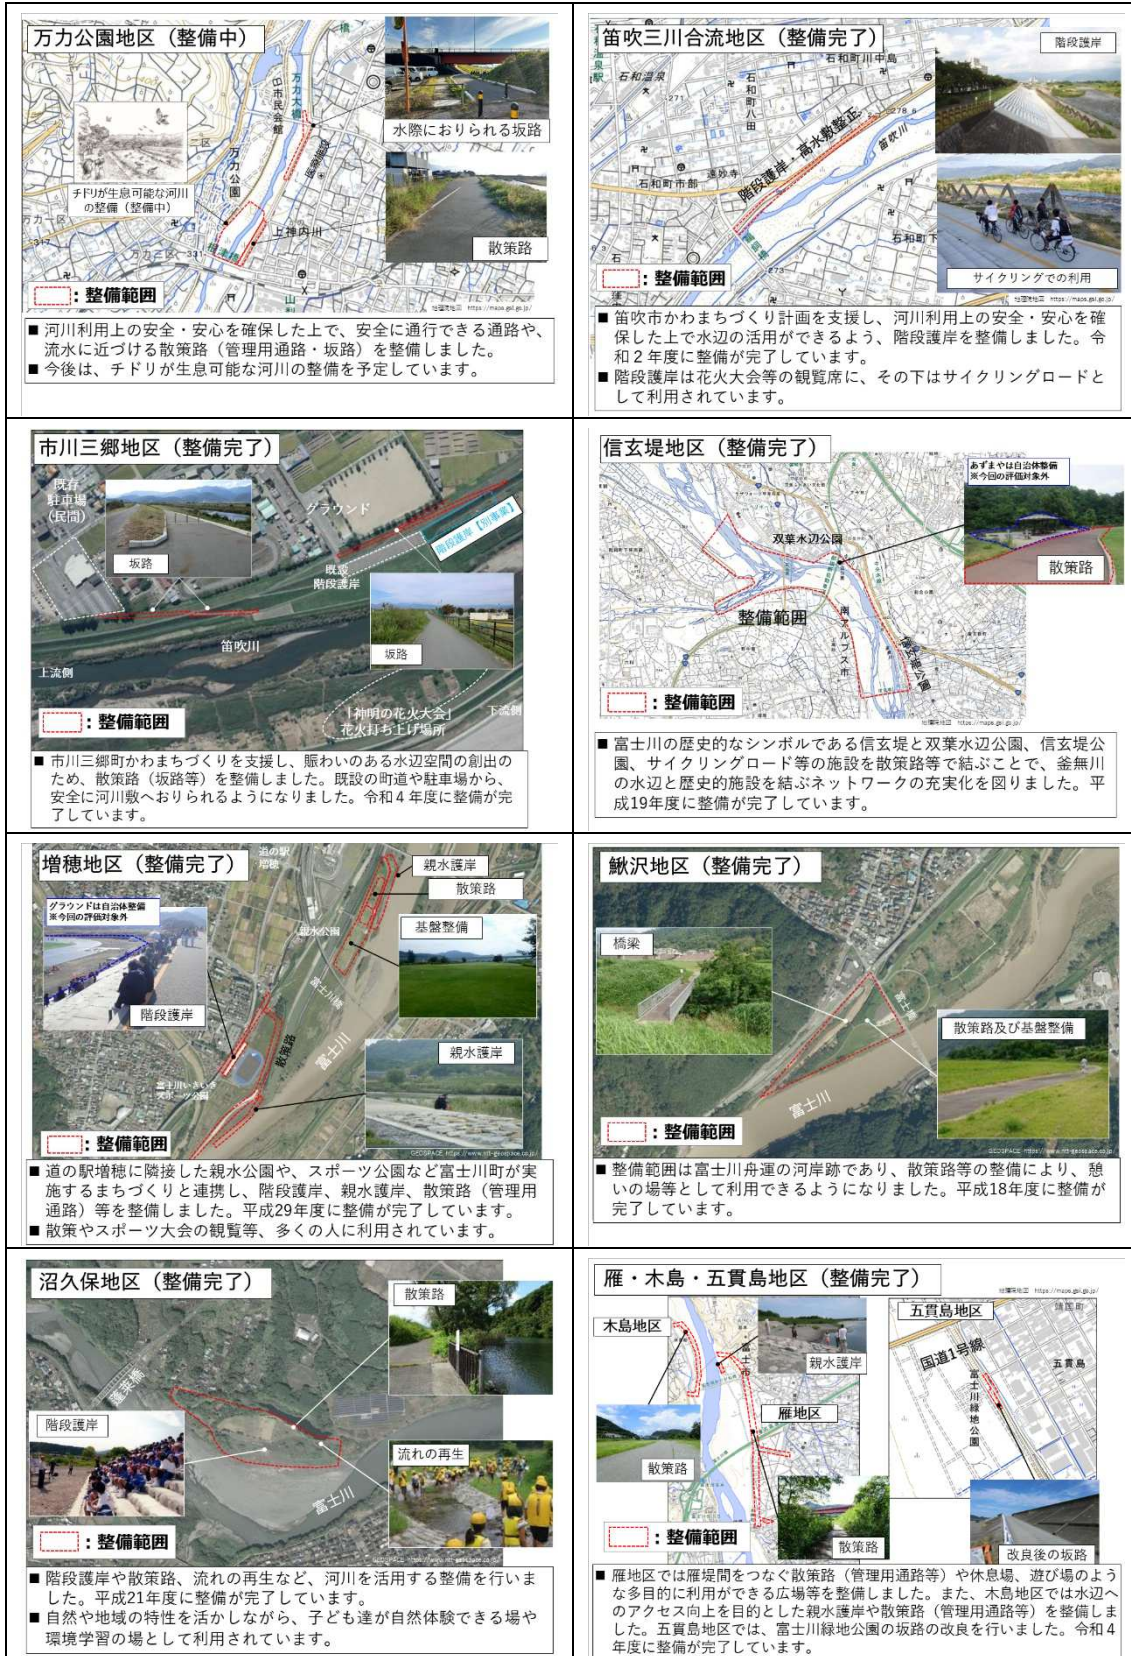

Q2 あなたは、事業説明資料で示した「富士川総合水系(富士川・笛吹川・釜無川)環境整備事業(水辺整備)」が行われていることをご存知でしたか。
あてはまるものを1つだけ選んでください。

【必須入力】

- ☐ 1. 知っていた
☐ 2. 知らなかった

Q3 あなたは、現在、「富士川総合水系(富士川・笛吹川・釜無川)環境整備事業(水辺整備)」の実施範囲にどれくらい訪れていますか。あてはまるものを1つだけ選んでください。
「その他」の場合は、具体的な内容をお書きください。

【必須入力】

- ☐ 1. ほぼ毎日
☐ 2. 週に1回程度
☐ 3. 月に1回程度
☐ 4. 年に数回程度
☐ 5. 年に1回程度
☐ 6. 数年に1回程度
☐ 7. 一度も訪れたことがない
☐ 8. その他()

Q4 「富士川総合水系(富士川・笛吹川・釜無川)環境整備事業(水辺整備)」の実施範囲に訪れたことがある方におたずねします。
訪れた目的はなんですか。主な目的を2つまで選んで下さい。

【必須入力】(2個まで選択)

- ☐ 1. 散歩・ウォーキング
☐ 2. 犬の散歩
☐ 3. 休憩
☐ 4. 通勤・通学
☐ 5. ジョギング・ランニング
☐ 6. サイクリング
☐ 7. その他スポーツ()
☐ 8. 自然観察・環境学習
☐ 9. 水遊び
☐ 10. 釣り
☐ 11. スポーツ観戦(付き添いも含む)
☐ 12. 花火大会
☐ 13. イベント参加(花火大会以外)
☐ 14. その他()

Q5 数年前(5年程度前)と比較して、「富士川総合水系(富士川・笛吹川・釜無川)環境整備事業(水辺整備)」の実施範囲に訪れる回数は変化しましたか。

【必須入力】

- ☐ 1. 変わらない
☐ 2. 増えた
☐ 3. 減った

Q6 訪れる回数が増えた理由は何ですか。

主な理由を1つだけ選んで下さい。

【必須入力】

【増えた理由】

- ☐ 1. イベントに参加するようになった、または参加するイベントが増えたため
- ☐ 2. 自分の行動が変わったため(散歩するようになった、通勤・通学経路が変わった等)
- ☐ 3. 家族の状況が変わったため(家族の付き添いで公園に行くようになった等)
- ☐ 4. 利用する施設等が新しく整備されたため
- ☐ 5. その他()

【減った理由】

- ☐ 6. イベントが減った・なくなったため
- ☐ 7. 自分の行動が変わったため(通勤・通学経路が変わった、出かけられなくなった等)
- ☐ 8. 家族の状況が変わったため(家族の付き添いがなくなった等)
- ☐ 9. その他()

Q7 「富士川総合水系(富士川・笛吹川・釜無川)環境整備事業(水辺整備)」の実施範囲に訪れたことがある方におたずねします。

ご自宅から取組の範囲まで移動する、主な交通手段を1つだけ選んでください。

「5.その他」の場合は、具体的にお書きください。

【必須入力】

- ☐ 1. 徒歩
- ☐ 2. 自転車
- ☐ 3. 自家用車・バイク
- ☐ 4. 電車・バス(公共交通機関)
- ☐ 5. その他()

Q8 あなたは今の「富士川総合水系(富士川・笛吹川・釜無川)環境整備事業(水辺整備)」の実施範囲周辺についてどう思いますか。

以下それぞれについてあてはまるものを1つずつ選択してください。

【必須入力】


	1 とても そう思う	2 そう 思う	3 どちら かやや そう 思 い な い	4 あまり 思 わ な い	5 ま っ た く そ う 思 わ な い
1. 自然が豊かである	☐	☐	☐	☐	☐
2. 水がきれいである	☐	☐	☐	☐	☐
3. 水辺に近づきやすい	☐	☐	☐	☐	☐
4. 景観がよい	☐	☐	☐	☐	☐
5. 河川を利用(自然観察やレクリエーション)しやすい	☐	☐	☐	☐	☐

【重要】ここからは、仮定の質問です。
 【説明資料】をよくお読みになったうえでお答えください。

富士川総合水系(富士川・笛吹川・釜無川)環境整備事業(水辺整備)は、実際には税金によって実施されていますが、ここでは**事業の効果をお金の価値に置き換えて評価するために、仮に「事業が税金ではなく、各世帯から負担金を集めて行われるような仕組みがあったとしたら」という状況を想像してください。**

※これはあくまでも事業の効果の評価するためのこのアンケート上での仮定であり、実際このような仕組みが考えられているわけではありません。また、回答をもとに、実際に負担金を徴収することはありません。

▼ 画像をクリックして、別画面で表示される画像をご覧ください。▼
 ※クリック必須

	状況 A (事業を実施しない場合)	状況 B (事業を実施した場合)
周遊性	<ul style="list-style-type: none"> 草木が繁茂している状況です。 	<ul style="list-style-type: none"> 管理用通路・坂路の整備により、水辺へのアクセスが向上するほか、安全に散策できるようになります。 
	<ul style="list-style-type: none"> 草木が繁茂し、地面に凹凸がある状況です。 	<ul style="list-style-type: none"> 管理用通路の整備により、川沿いを安全に散策できるようになります。 
水辺へのアクセス性	<ul style="list-style-type: none"> 草木が繁茂して地面に凹凸があり、利用されていない河川敷が広がっています。 	<ul style="list-style-type: none"> 親水護岸の整備により、安全に水際へ降りられるようになります。 
	<ul style="list-style-type: none"> 堤防が急斜面となっており、草木が繁茂している状況です。 	<ul style="list-style-type: none"> 親水護岸の整備により、安全に水際に行くことができ、休憩やイベントの観覧席として利用できるようになります。 
河川敷へのアクセス性	<ul style="list-style-type: none"> 河川敷への坂路が狭い状況です。 	<ul style="list-style-type: none"> 坂路の改良により、自転車や大型車両も安全に通行できるようになります。 
利用上の安全性	<ul style="list-style-type: none"> 草木が繁茂し、地面に凹凸がある状況です。 	<ul style="list-style-type: none"> 高水敷の整正により、水辺が安全に利用できるようになります。 

Q9 あなたは、「富士川総合水系(富士川・笛吹川・釜無川)環境整備事業(水辺整備)」の取組に賛成ですか、反対ですか。あてはまるものを1つだけ選んでください。

※上記の[画像]をクリックし、大きな画像をご覧になってからお答えください。

【必須入力】

- ☐ 1. 賛成
☐ 2. どちらでもない
☐ 3. 反対(この取組みに効果がない「0円」と判断した御意見として扱います。)

Q10 次の(1)～(8)に、状況B(取組を行う場合)の負担金の額を具体的に示しますので、あなたはそれぞれについて、状況A(取組を行わない場合)と状況B(取組を行う場合)のどちらが望ましいと思うかを考え、「支払う」または「支払わない」を選んでください。

なお、負担金はこの地域にお住まいの間、負担いただくことと仮定します。

負担金の分だけあなたの世帯で使うことのできるお金が減ることを、十分念頭に置いてお答えください。

また、負担金は説明資料の取組の実施と維持管理のためにのみ使われ、他の目的には一切使われないものとします。

※再度事業の概要、整備内容、整備範囲をご覧になる場合はこちら(「説明資料」)をご確認ください。

※再度状況Aと状況Bをご覧になる場合はこちらをご確認ください。なお、すでに階段護岸等の整備が終了している場所もありますが、この設問の「状況A」は全ての場所が整備されない状態と仮定してお答えください。

【必須入力】

【回答例】

例1:「毎月200円」までは負担金を支払うと考えた場合

⇒(1)～(3)は「2.支払う(状況Bがよい)」を選択してください。

⇒(4)～(8)は「1.支払わない(状況Aがよい)」を選択してください。

例2:「毎月4,000円」までは負担金を支払うと考えた場合

⇒(1)～(8)の全てで「2.支払う(状況Bがよい)」を選択してください。

例3:「負担金を支払いたくない」または「毎月40円未満」であれば負担金を支払うと考えた場合

⇒(1)～(8)の全てで「1.支払わない(状況Aがよい)」を選択してください。

	1 支払わない (状況Aがよい)	2 支払う (状況Bがよい)
状況Bの世帯あたりの負担金		
(1)毎月40円(年間あたり480円)	☐	☐
(2)毎月100円(年間あたり1,200円)	☐	☐
(3)毎月200円(年間あたり2,400円)	☐	☐
(4)毎月300円(年間あたり3,600円)	☐	☐
(5)毎月500円(年間あたり6,000円)	☐	☐
(6)毎月1,000円(年間あたり12,000円)	☐	☐
(7)毎月2,000円(年間あたり24,000円)	☐	☐
(8)毎月4,000円(年間あたり48,000円)	☐	☐

Q11 前問(Q10)で「2.支払う(状況Bがよい)」とお答えになった方におうかがいします。

「2.支払う(状況Bがよい)」とお答えになった理由は何ですか。

あてはまるものをすべて選んでください。

「6.その他」の場合は、具体的にお書きください。(いくつでも)

【必須入力】

- ☐ 1. 散歩やジョギング、サイクリングや休憩などで利用しやすくなるから
- ☐ 2. 河川でのイベント(花火大会、スポーツ大会等)に参加しやすくなるから
- ☐ 3. 河川敷や水辺に近づきやすくなるから
- ☐ 4. 環境学習・体験学習の場として使いやすくなるから
- ☐ 5. 農業等に水をつかえるようになるから
- ☐ 6. 自分の世帯にとって価値はないが、他の世帯も支払うのであれば仕方ないから
- ☐ 7. その他

Q12 前問(Q10)の(1)～(8)で全て「1.支払わない(状況Aがよい)」とお答えになった方におうかがいします。

その理由は何ですか。あてはまるものを1つ選んでください。

「5.その他」の場合は、具体的にお書きください。

【必須入力】

- ☐ 1. この取組は必要だと思うが、毎月40円(年間あたり480円)を支払う価値はないと思うから
- ☐ 2. この取組自体が必要ないと思うから
- ☐ 3. この取組より他の事業を優先した方がよいと思うから
- ☐ 4. これだけの情報では判断できないから
- ☐ 5. その他

ここまでで、仮定の質問は終了となります。

【重要】繰り返しになりますが、Q10～Q12はあくまでも仮定の質問であり、この調査の回答結果をもとにあなたの世帯から実際に負担金が徴収されたり、税金が値上げされたりすることは一切ございません。

Q13 このような方法(CVM)を用いて、取組の効果を評価することについて、あなたはどのように思われますか。あてはまるものを1つ選んでください。

【必須入力】

- ☐ 1. このような方法(CVM)を用いて、取組の効果を評価することに賛成
- ☐ 2. このような方法(CVM)を用いて、取組の効果を評価することに反対
- ☐ 3. わからない

Q14 今回おたずねした富士川総合水系(富士川・笛吹川・釜無川)環境整備事業(水辺整備)や、今後の河川環境の整備のあり方についてのご意見、富士川に関して日頃感じていることや思うところなどがございましたら、ご自由にお書きください。なお、特にご意見がなければ記載の必要はございません。

※500文字以内でご記入ください。

Q15 あなたの性別・年齢をお答えください。
【必須入力】

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 1. 男性10代 | ☐ 9. 女性10代 |
| ☐ 2. 男性20代 | ☐ 10. 女性20代 |
| ☐ 3. 男性30代 | ☐ 11. 女性30代 |
| ☐ 4. 男性40代 | ☐ 12. 女性40代 |
| ☐ 5. 男性50代 | ☐ 13. 女性50代 |
| ☐ 6. 男性60代 | ☐ 14. 女性60代 |
| ☐ 7. 男性70代 | ☐ 15. 女性70代 |
| ☐ 8. 男性80代以上 | ☐ 16. 女性80代以上 |

Q16 現在お住まいの地域の郵便番号を入力してください。
※半角数字の整数でお答えください。
※わからない場合はこちら(<https://www.post.japanpost.jp/zipcode/>)からご確認ください。
※ご回答いただいた内容は、本アンケートの目的にのみ利用します。
※この内容を基に、回答した方を特定したり、広告・販促を実施したりすることは一切ございません。
【必須入力】

【郵便番号】

(半角数字)
各枠1桁ずつ分けて入力ください。

なお、繰り返しになりますが、Q10～Q12はあくまでも仮定の質問であり、この調査の回答結果をもとにあなたの世帯から実際に負担金が徴収されたり、税金が値上げされたりすることは一切ございません。

ご協力ありがとうございました。

アンケートは以上で終わります。ご協力ありがとうございました。
送信ボタンを押してください。

送 信

富士川環境整備事業（富士川水辺整備）事業評価CVM調査結果



1. アンケート集計数

回収数	有効回答数	有効回答率
780	467	59.9%

2. WTP算定結果

提示額	賛成	反対	賛同率※
40円	308	159	66.0%
100円	251	216	53.7%
200円	161	306	34.5%
300円	101	366	21.6%
500円	51	416	10.9%
1,000円	22	445	4.7%
2,000円	16	451	3.4%
4,000円	12	455	2.6%

※賛成率/有効回答数

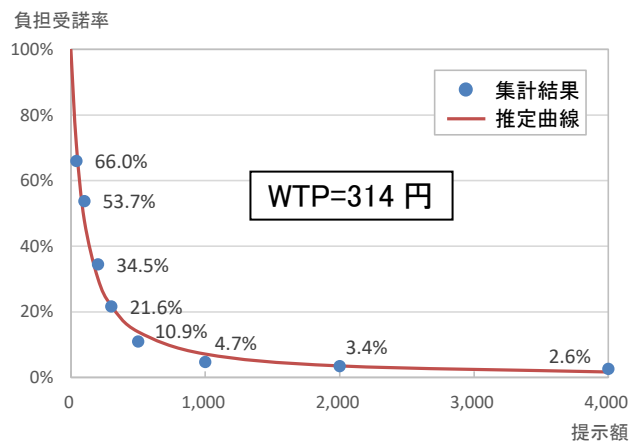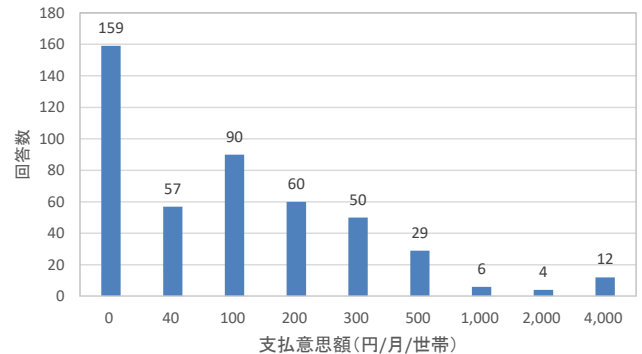

3. B/C算定結果

WTP (円/月)	受益世帯数	B (百万円)※	C (百万円)	B/C
314	392,508	40,632	6,428	6.3 (社会的割引率1%) 10.4 (社会的割引率2%) 8.6

◇Bは残存価値を加算した

$$\begin{aligned}
 \diamond \text{年 便 益} &= \text{WTP} \times 12 \text{ヶ月} \times \text{受益世帯数} \\
 &= 314 \times 12 \times 392,508 \\
 &= 1,479 \text{ (百万円)}
 \end{aligned}$$

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）				費 用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益		残存 価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H 1 5 ～ R 1 1 年）	H 15	-23	2.465	1.420					74	259				74	259		
	H 16	-22	2.370	1.414					141	473				141	473		
	H 17	-21	2.279	1.407					141	452				141	452		
	H 18	-20	2.191	1.391					141	430				141	430		
	H 19	-19	2.107	1.369	78	164			133	384	0.59	1.7	134	386			
	H 20	-18	2.026	1.330	123	249			171	461	1.7	4.6	173	466			
	H 21	-17	1.948	1.373	123	240			236	631	1.7	4.5	238	636			
	H 22	-16	1.873	1.371	197	369			11	28	2.3	5.9	13	34			
	H 23	-15	1.801	1.336	197	355			29	70	2.3	5.5	31	76			
	H 24	-14	1.732	1.338	197	341			124	287	2.3	5.3	126	292			
	H 25	-13	1.665	1.314	197	328			25	55	2.3	5.0	27	60			
	H 26	-12	1.601	1.271	197	315			213	433	2.3	4.7	215	438			
	H 27	-11	1.539	1.267	197	303			224	437	2.3	4.5	226	442			
	H 28	-10	1.480	1.258	197	292			240	447	2.3	4.3	242	451			
	H 29	-9	1.423	1.230	197	280			224	392	2.3	4.0	226	396			
	H 30	-8	1.369	1.189	197	270			213	347	2.3	3.7	215	351			
	R 1	-7	1.316	1.163	197	259			32	49	2.3	3.5	34	53			
	R 2	-6	1.265	1.164	197	249			165	243	2.3	3.4	167	246			
	R 3	-5	1.217	1.129	197	240			38	52	2.3	3.2	40	55			
	R 4	-4	1.170	1.083	920	1,076			105	133	3.5	4.4	109	137			
	R 5	-3	1.125	1.050	920	1,035			50	59	3.5	4.1	54	63			
	R 6	-2	1.082	1.000	1,260	1,363			36	39	3.5	3.8	40	43			
	R 7	-1	1.040	1.000	1,260	1,310			24	25	3.5	3.6	28	29			
	R 8	0	1.000	1.000	1,413	1,413			4.5	4.5	6.6	6.6	11	11			
	R 9	1	0.962	1.000	1,413	1,359			5.5	5.3	6.6	6.3	12	12			
	R 10	2	0.925	1.000	1,413	1,306			5.5	5.1	6.6	6.1	12	11			
	R 11	3	0.889	1.000	1,413	1,256			5.5	4.9	6.6	5.9	12	11			
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.855	1.000	1,479	1,264					6.8	5.8	6.8	5.8			
	R 13	5	0.822	1.000	1,479	1,216					6.8	5.6	6.8	5.6			
	R 14	6	0.790	1.000	1,479	1,169					6.8	5.4	6.8	5.4			
	R 15	7	0.760	1.000	1,479	1,124					6.8	5.2	6.8	5.2			
	R 16	8	0.731	1.000	1,479	1,081					6.8	5.0	6.8	5.0			
	R 17	9	0.703	1.000	1,479	1,039					6.8	4.8	6.8	4.8			
	R 18	10	0.676	1.000	1,479	999					6.8	4.6	6.8	4.6			
	R 19	11	0.650	1.000	1,479	961					6.8	4.4	6.8	4.4			
	R 20	12	0.625	1.000	1,479	924					6.8	4.2	6.8	4.2			
	R 21	13	0.601	1.000	1,479	888					6.8	4.1	6.8	4.1			
	R 22	14	0.577	1.000	1,479	854					6.8	3.9	6.8	3.9			
	R 23	15	0.555	1.000	1,479	821					6.8	3.8	6.8	3.8			
	R 24	16	0.534	1.000	1,479	790					6.8	3.6	6.8	3.6			
	R 25	17	0.513	1.000	1,479	759					6.8	3.5	6.8	3.5			
	R 26	18	0.494	1.000	1,479	730					6.8	3.4	6.8	3.4			
	R 27	19	0.475	1.000	1,479	702					6.8	3.2	6.8	3.2			
	R 28	20	0.456	1.000	1,479	675					6.8	3.1	6.8	3.1			
	R 29	21	0.439	1.000	1,479	649					6.8	3.0	6.8	3.0			
	R 30	22	0.422	1.000	1,479	624					6.8	2.9	6.8	2.9			
	R 31	23	0.406	1.000	1,479	600					6.8	2.8	6.8	2.8			
	R 32	24	0.390	1.000	1,479	577					6.8	2.7	6.8	2.7			
	R 33	25	0.375	1.000	1,479	555					6.8	2.6	6.8	2.6			
	R 34	26	0.361	1.000	1,479	533					6.8	2.5	6.8	2.5			
	R 35	27	0.347	1.000	1,479	513					6.8	2.4	6.8	2.4			
	R 36	28	0.333	1.000	1,479	493					6.8	2.3	6.8	2.3			
	R 37	29	0.321	1.000	1,479	474					6.8	2.2	6.8	2.2			
	R 38	30	0.308	1.000	1,479	456					6.8	2.1	6.8	2.1			
	R 39	31	0.296	1.000	1,401	415					6.2	1.8	6.2	1.8			
	R 40	32	0.285	1.000	1,356	387					5.1	1.5	5.1	1.5			
	R 41	33	0.274	1.000	1,356	372					5.1	1.4	5.1	1.4			
	R 42	34	0.264	1.000	1,282	338					4.5	1.2	4.5	1.2			
	R 43	35	0.253	1.000	1,282	325					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 44	36	0.244	1.000	1,282	312					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 45	37	0.234	1.000	1,282	300					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 46	38	0.225	1.000	1,282	289					4.5	1.0	4.5	1.0			
	R 47	39	0.217	1.000	1,282	278					4.5	0.97	4.5	0.97			
	R 48	40	0.208	1.000	1,282	267					4.5	0.94	4.5	0.94			
	R 49	41	0.200	1.000	1,282	257					4.5	0.90	4.5	0.90			
	R 50	42	0.193	1.000	1,282	247					4.5	0.87	4.5	0.87			
	R 51	43	0.185	1.000	1,282	237					4.5	0.83	4.5	0.83			
	R 52	44	0.178	1.000	1,282	228					4.5	0.80	4.5	0.80			
	R 53	45	0.171	1.000	1,282	219					4.5	0.77	4.5	0.77			
	R 54	46	0.165	1.000	559	92					3.3	0.54	3.3	0.54			
	R 55	47	0.158	1.000	559	88					3.3	0.52	3.3	0.52			
	R 56	48	0.152	1.000	219	33					3.3	0.50	3.3	0.50			
	R 57	49	0.146	1.000	219	32					3.3	0.48	3.3	0.48			
	R 58	50	0.141	1.000	66	9.3					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 59	51	0.135	1.000	66	8.9					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 60	52	0.130	1.000	66	8.6					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 61	53	0.125	1.000	66	8.3					0.16	0.02	0.16	0.02			
合 計					73,950	40,593	39	40,632	2,811	6,206	340	222	3,151	6,428	6.3	34,204	18.4%

様式－５

費用対便益（全体事業）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率※ 4%・2%	デフ レー ター	便 益（B）				費 用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益		残存 価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H15～R11年）	H 15	-23	2.325	1.420					74	244				74	244		
	H 16	-22	2.236	1.414					141	446				141	446		
	H 17	-21	2.150	1.407					141	427				141	427		
	H 18	-20	2.067	1.391					141	405				141	405		
	H 19	-19	1.988	1.369	78	155			133	362	0.59	1.6	134	364			
	H 20	-18	1.911	1.330	123	235			171	435	1.7	4.3	173	439			
	H 21	-17	1.838	1.373	123	226			236	595	1.7	4.3	238	599			
	H 22	-16	1.767	1.371	197	348			11	27	2.3	5.6	13	33			
	H 23	-15	1.699	1.336	197	335			29	66	2.3	5.2	31	71			
	H 24	-14	1.634	1.338	197	322			124	271	2.3	5.0	126	276			
	H 25	-13	1.571	1.314	197	309			25	52	2.3	4.7	27	57			
	H 26	-12	1.510	1.271	197	298			213	409	2.3	4.4	215	413			
	H 27	-11	1.452	1.267	197	286			224	412	2.3	4.2	226	416			
	H 28	-10	1.396	1.258	197	275			240	422	2.3	4.0	242	426			
	H 29	-9	1.343	1.230	197	265			224	370	2.3	3.8	226	374			
	H 30	-8	1.291	1.189	197	254			213	327	2.3	3.5	215	331			
	R 1	-7	1.241	1.163	197	245			32	46	2.3	3.3	34	49			
	R 2	-6	1.194	1.164	197	235			165	229	2.3	3.2	167	232			
	R 3	-5	1.148	1.129	197	226			38	49	2.3	3.0	40	52			
	R 4	-4	1.104	1.083	920	1,015			105	125	3.5	4.2	109	129			
	R 5	-3	1.061	1.050	920	976			50	56	3.5	3.9	54	60			
	R 6	-2	1.040	1.000	1,260	1,311			36	37	3.5	3.6	40	41			
	R 7	-1	1.020	1.000	1,260	1,285			24	24	3.5	3.6	28	28			
	R 8	0	1.000	1.000	1,413	1,413			4.5	4.5	6.6	6.6	11	11			
	R 9	1	0.980	1.000	1,413	1,385			5.5	5.4	6.6	6.5	12	12			
	R 10	2	0.961	1.000	1,413	1,358			5.5	5.3	6.6	6.3	12	12			
	R 11	3	0.942	1.000	1,413	1,332			5.5	5.2	6.6	6.2	12	11			
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.924	1.000	1,479	1,366					6.8	6.3	6.8	6.3			
	R 13	5	0.906	1.000	1,479	1,340					6.8	6.2	6.8	6.2			
	R 14	6	0.888	1.000	1,479	1,313					6.8	6.0	6.8	6.0			
	R 15	7	0.871	1.000	1,479	1,288					6.8	5.9	6.8	5.9			
	R 16	8	0.853	1.000	1,479	1,262					6.8	5.8	6.8	5.8			
	R 17	9	0.837	1.000	1,479	1,238					6.8	5.7	6.8	5.7			
	R 18	10	0.820	1.000	1,479	1,213					6.8	5.6	6.8	5.6			
	R 19	11	0.804	1.000	1,479	1,190					6.8	5.5	6.8	5.5			
	R 20	12	0.788	1.000	1,479	1,166					6.8	5.4	6.8	5.4			
	R 21	13	0.773	1.000	1,479	1,143					6.8	5.3	6.8	5.3			
	R 22	14	0.758	1.000	1,479	1,121					6.8	5.2	6.8	5.2			
	R 23	15	0.743	1.000	1,479	1,099					6.8	5.1	6.8	5.1			
	R 24	16	0.728	1.000	1,479	1,077					6.8	5.0	6.8	5.0			
	R 25	17	0.714	1.000	1,479	1,056					6.8	4.9	6.8	4.9			
	R 26	18	0.700	1.000	1,479	1,036					6.8	4.8	6.8	4.8			
	R 27	19	0.686	1.000	1,479	1,015					6.8	4.7	6.8	4.7			
	R 28	20	0.673	1.000	1,479	995					6.8	4.6	6.8	4.6			
	R 29	21	0.660	1.000	1,479	976					6.8	4.5	6.8	4.5			
	R 30	22	0.647	1.000	1,479	957					6.8	4.4	6.8	4.4			
	R 31	23	0.634	1.000	1,479	938					6.8	4.3	6.8	4.3			
	R 32	24	0.622	1.000	1,479	920					6.8	4.2	6.8	4.2			
	R 33	25	0.610	1.000	1,479	901					6.8	4.1	6.8	4.1			
	R 34	26	0.598	1.000	1,479	884					6.8	4.1	6.8	4.1			
	R 35	27	0.586	1.000	1,479	866					6.8	4.0	6.8	4.0			
	R 36	28	0.574	1.000	1,479	849					6.8	3.9	6.8	3.9			
	R 37	29	0.563	1.000	1,479	833					6.8	3.8	6.8	3.8			
	R 38	30	0.552	1.000	1,479	817					6.8	3.8	6.8	3.8			
	R 39	31	0.541	1.000	1,401	758					6.2	3.4	6.2	3.4			
	R 40	32	0.531	1.000	1,356	720					5.1	2.7	5.1	2.7			
	R 41	33	0.520	1.000	1,356	705					5.1	2.7	5.1	2.7			
	R 42	34	0.510	1.000	1,282	654					4.5	2.3	4.5	2.3			
	R 43	35	0.500	1.000	1,282	641					4.5	2.3	4.5	2.3			
	R 44	36	0.490	1.000	1,282	628					4.5	2.2	4.5	2.2			
	R 45	37	0.481	1.000	1,282	616					4.5	2.2	4.5	2.2			
	R 46	38	0.471	1.000	1,282	604					4.5	2.1	4.5	2.1			
	R 47	39	0.462	1.000	1,282	592					4.5	2.1	4.5	2.1			
	R 48	40	0.453	1.000	1,282	581					4.5	2.0	4.5	2.0			
	R 49	41	0.444	1.000	1,282	569					4.5	2.0	4.5	2.0			
	R 50	42	0.435	1.000	1,282	558					4.5	2.0	4.5	2.0			
	R 51	43	0.427	1.000	1,282	547					4.5	1.9	4.5	1.9			
	R 52	44	0.418	1.000	1,282	536					4.5	1.9	4.5	1.9			
	R 53	45	0.410	1.000	1,282	526					4.5	1.8	4.5	1.8			
	R 54	46	0.402	1.000	559	225					3.3	1.3	3.3	1.3			
	R 55	47	0.394	1.000	559	220					3.3	1.3	3.3	1.3			
	R 56	48	0.387	1.000	219	85					3.3	1.3	3.3	1.3			
	R 57	49	0.379	1.000	219	83					3.3	1.3	3.3	1.3			
	R 58	50	0.372	1.000	66	25					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 59	51	0.364	1.000	66	24					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 60	52	0.357	1.000	66	24					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 61	53	0.350	1.000	66	23					0.16	0.06	0.16	0.06			
合 計					73,950	52,892	89	52,981	2,811	5,856	340	273	3,151	6,129	8.6	46,852	18.4%

※令和4年度までは4%、令和5年度以降は2%を適用

様式－５

費用対便益（全体事業）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率※ 4%・1%	デフ レー ター	便 益（B）			費 用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益		残存 価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H15～R11年）	H 15	-23	2.258	1.420				74	237			74	237				
	H 16	-22	2.171	1.414				141	433			141	433				
	H 17	-21	2.087	1.407				141	414			141	414				
	H 18	-20	2.007	1.391				141	394			141	394				
	H 19	-19	1.930	1.369	78	151		133	351	0.59	1.6	134	353				
	H 20	-18	1.856	1.330	123	228		171	422	1.7	4.2	173	426				
	H 21	-17	1.784	1.373	123	219		236	578	1.7	4.2	238	582				
	H 22	-16	1.716	1.371	197	338		11	26	2.3	5.4	13	31				
	H 23	-15	1.650	1.336	197	325		29	64	2.3	5.1	31	69				
	H 24	-14	1.586	1.338	197	312		124	263	2.3	4.9	126	268				
	H 25	-13	1.525	1.314	197	300		25	50	2.3	4.6	27	55				
	H 26	-12	1.466	1.271	197	289		213	397	2.3	4.3	215	401				
	H 27	-11	1.410	1.267	197	278		224	400	2.3	4.1	226	404				
	H 28	-10	1.356	1.258	197	267		240	409	2.3	3.9	242	413				
	H 29	-9	1.304	1.230	197	257		224	359	2.3	3.7	226	363				
	H 30	-8	1.254	1.189	197	247		213	317	2.3	3.4	215	320				
	R 1	-7	1.205	1.163	197	237		32	45	2.3	3.2	34	48				
	R 2	-6	1.159	1.164	197	228		165	223	2.3	3.1	167	226				
	R 3	-5	1.114	1.129	197	220		38	48	2.3	2.9	40	51				
	R 4	-4	1.072	1.083	920	986		105	122	3.5	4.1	109	126				
	R 5	-3	1.030	1.050	920	948		50	54	3.5	3.8	54	58				
	R 6	-2	1.020	1.000	1,260	1,285		36	37	3.5	3.6	40	41				
	R 7	-1	1.010	1.000	1,260	1,273		24	24	3.5	3.5	28	28				
	R 8	0	1.000	1.000	1,413	1,413		4.5	4.5	6.6	6.6	11	11				
	R 9	1	0.990	1.000	1,413	1,399		5.5	5.4	6.6	6.5	12	12				
	R 10	2	0.980	1.000	1,413	1,385		5.5	5.4	6.6	6.5	12	12				
	R 11	3	0.971	1.000	1,413	1,371		5.5	5.3	6.6	6.4	12	12				
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.961	1.000	1,479	1,421				6.8	6.5	6.8	6.5				
	R 13	5	0.951	1.000	1,479	1,407				6.8	6.5	6.8	6.5				
	R 14	6	0.942	1.000	1,479	1,393				6.8	6.4	6.8	6.4				
	R 15	7	0.933	1.000	1,479	1,379				6.8	6.3	6.8	6.3				
	R 16	8	0.923	1.000	1,479	1,366				6.8	6.3	6.8	6.3				
	R 17	9	0.914	1.000	1,479	1,352				6.8	6.2	6.8	6.2				
	R 18	10	0.905	1.000	1,479	1,339				6.8	6.2	6.8	6.2				
	R 19	11	0.896	1.000	1,479	1,326				6.8	6.1	6.8	6.1				
	R 20	12	0.887	1.000	1,479	1,313				6.8	6.0	6.8	6.0				
	R 21	13	0.879	1.000	1,479	1,300				6.8	6.0	6.8	6.0				
	R 22	14	0.870	1.000	1,479	1,287				6.8	5.9	6.8	5.9				
	R 23	15	0.861	1.000	1,479	1,274				6.8	5.9	6.8	5.9				
	R 24	16	0.853	1.000	1,479	1,261				6.8	5.8	6.8	5.8				
	R 25	17	0.844	1.000	1,479	1,249				6.8	5.7	6.8	5.7				
	R 26	18	0.836	1.000	1,479	1,236				6.8	5.7	6.8	5.7				
	R 27	19	0.828	1.000	1,479	1,224				6.8	5.6	6.8	5.6				
	R 28	20	0.820	1.000	1,479	1,212				6.8	5.6	6.8	5.6				
	R 29	21	0.811	1.000	1,479	1,200				6.8	5.5	6.8	5.5				
	R 30	22	0.803	1.000	1,479	1,188				6.8	5.5	6.8	5.5				
	R 31	23	0.795	1.000	1,479	1,176				6.8	5.4	6.8	5.4				
	R 32	24	0.788	1.000	1,479	1,165				6.8	5.4	6.8	5.4				
	R 33	25	0.780	1.000	1,479	1,153				6.8	5.3	6.8	5.3				
	R 34	26	0.772	1.000	1,479	1,142				6.8	5.2	6.8	5.2				
	R 35	27	0.764	1.000	1,479	1,131				6.8	5.2	6.8	5.2				
	R 36	28	0.757	1.000	1,479	1,119				6.8	5.1	6.8	5.1				
	R 37	29	0.749	1.000	1,479	1,108				6.8	5.1	6.8	5.1				
	R 38	30	0.742	1.000	1,479	1,097				6.8	5.0	6.8	5.0				
	R 39	31	0.735	1.000	1,401	1,029				6.2	4.6	6.2	4.6				
	R 40	32	0.727	1.000	1,356	986				5.1	3.7	5.1	3.7				
	R 41	33	0.720	1.000	1,356	976				5.1	3.7	5.1	3.7				
	R 42	34	0.713	1.000	1,282	914				4.5	3.2	4.5	3.2				
	R 43	35	0.706	1.000	1,282	905				4.5	3.2	4.5	3.2				
	R 44	36	0.699	1.000	1,282	896				4.5	3.1	4.5	3.1				
	R 45	37	0.692	1.000	1,282	887				4.5	3.1	4.5	3.1				
	R 46	38	0.685	1.000	1,282	878				4.5	3.1	4.5	3.1				
	R 47	39	0.678	1.000	1,282	870				4.5	3.1	4.5	3.1				
	R 48	40	0.672	1.000	1,282	861				4.5	3.0	4.5	3.0				
	R 49	41	0.665	1.000	1,282	853				4.5	3.0	4.5	3.0				
	R 50	42	0.658	1.000	1,282	844				4.5	3.0	4.5	3.0				
	R 51	43	0.652	1.000	1,282	836				4.5	2.9	4.5	2.9				
	R 52	44	0.645	1.000	1,282	827				4.5	2.9	4.5	2.9				
	R 53	45	0.639	1.000	1,282	819				4.5	2.9	4.5	2.9				
	R 54	46	0.633	1.000	559	354				3.3	2.1	3.3	2.1				
	R 55	47	0.626	1.000	559	350				3.3	2.1	3.3	2.1				
	R 56	48	0.620	1.000	219	136				3.3	2.0	3.3	2.0				
	R 57	49	0.614	1.000	219	134				3.3	2.0	3.3	2.0				
	R 58	50	0.608	1.000	66	40				0.16	0.10	0.16	0.10				
	R 59	51	0.602	1.000	66	40				0.16	0.10	0.16	0.10				
	R 60	52	0.596	1.000	66	39				0.16	0.10	0.16	0.10				
	R 61	53	0.590	1.000	66	39				0.16	0.09	0.16	0.09				
合 計					73,950	62,287	137	62,424	2,811	5,688	340	312	3,151	6,000	10.4	56,424	18.4%

※令和4年度までは4%、令和5年度以降は1%を適用

事業費の内訳書

河川事業

事業名	富士川総合水系環境整備事業	(全体事業費)
-----	---------------	---------

評価年度	R8	再評価
------	----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	2,255	
	本工事費		式	1	2,255	
		富士川水辺整備事業	式	1	2,255	階段護岸・親水護岸、基盤整備 ・高水敷整正、管理用通路・散策 路、水路、坂路 等
用地費及補償費			式	1	0	
	富士川水辺整備事業		式	1	0	
間接経費			式	1	751	
事業費（工事諸費除く） 計			式	1	3,006	
工事諸費			式	1	588	
事業費（工事諸費含む） 計			式	1	3,594	

維持管理費	式	1	374	全事業期間の維持管理費
-------	---	---	-----	-------------

事業費の内訳書

河川事業

事業名	富士川総合水系環境整備事業	(残事業費)
-----	---------------	--------

評価年度	R8	再評価
------	----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	0	
	本工事費		式	1	0	
		富士川水辺整備事業	式	1	0	
用地費及補償費			式	1	0	
	富士川水辺整備事業		式	1	0	
間接経費			式	1	18	
事業費（工事諸費除く） 計			式	1	18	
工事諸費			式	1	4	
事業費（工事諸費含む） 計			式	1	22	

維持管理費	式	1	318	全事業期間の維持管理費
-------	---	---	-----	-------------

事業費の内訳書

河川事業

事業名	富士川水辺整備事業	(全体事業費)
-----	-----------	---------

評価年度	R8	再評価
------	----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	2,255	
	本工事費		式	1	2,255	
		階段護岸・ 親水護岸	m	2,055	1,488	坂路4箇所分の整備を含む
		管理用通路・ 散策路	m	11,407	301	
		基盤整備・ 高水敷整正	m ²	113,215	142	
		水路	m	200	15	
		坂路	箇所	3	45	
		盛土工	m	340	50	
		ワンド	箇所	1	25	
		水制工	m	1	3	
		橋梁	基	2	118	
		その他	式	1	68	案内版13箇所、車止め3箇所、 河岸保護工100m
		用地費及補償費		式	1	0
	用地費	式	1	0		
	補償費	式	1	0		
間接経費		式	1	751		
事業費（工事諸費除く） 計		式	1	3,006		
工事諸費		式	1	588		
事業費（工事諸費含む） 計		式	1	3,594		

維持管理費	式	1	374	全事業期間の維持管理費
-------	---	---	-----	-------------

事業費の内訳書

河川事業

事業名	富士川水辺整備事業	(残事業費)
-----	-----------	--------

評価年度	R8	再評価
------	----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	0	
	本工事費		式	1	0	
用地費及補償費			式	1	0	
	用地費		式	1	0	
	補償費		式	1	0	
間接経費			式	1	18	
事業費（工事諸費除く） 計			式	1	18	
工事諸費			式	1	4	
事業費（工事諸費含む） 計			式	1	22	

維持管理費		式	1	318	全事業期間の維持管理費
-------	--	---	---	-----	-------------

全体事業評価（水系全体）

	便益	残存価値	総便益	総建設費	総維持管理費	総事業費	費用便益費
	①	②	③(①+②)	④	⑤	⑥(④+⑤)	⑦(③/⑥)
基本	40,593	39	40,632	6,206	222	6,428	6.3
残事業費+10%	40,593	39	40,632	6,207	222	6,429	6.3
残事業費-10%	40,593	39	40,632	6,204	222	6,426	6.3
残工期+10%	—	—	—	—	—	—	—
残工期-10%	—	—	—	—	—	—	—
便益+10%	44,660	39	44,699	6,206	222	6,428	7.0
便益-10%	36,530	39	36,569	6,206	222	6,428	5.7

全体事業評価（水辺整備）

	便益	残存価値	総便益	総建設費	総維持管理費	総事業費	費用便益費
	①	②	③(①+②)	④	⑤	⑥(④+⑤)	⑦(③/⑥)
基本	40,593	39	40,632	6,206	222	6,428	6.3
残事業費+10%	40,593	39	40,632	6,207	222	6,429	6.3
残事業費-10%	40,593	39	40,632	6,204	222	6,426	6.3
残工期+10%	—	—	—	—	—	—	—
残工期-10%	—	—	—	—	—	—	—
便益+10%	44,660	39	44,699	6,206	222	6,428	7.0
便益-10%	36,530	39	36,569	6,206	222	6,428	5.7

残事業評価（水系全体）

	便益	残存価値	総便益	総建設費	総維持管理費	総事業費	費用便益費
	①	②	③(①+②)	④	⑤	⑥(④+⑤)	⑦(③/⑥)
基本	166	0.00	166	15	3.1	18	9.2
残事業費+10%	166	0.00	166	17	3.1	20	8.3
残事業費-10%	166	0.00	166	14	3.1	17	9.8
残工期+10%	—	—	—	—	—	—	—
残工期-10%	—	—	—	—	—	—	—
便益+10%	183	0.00	183	15	3.1	18	10.2
便益-10%	149	0.00	149	15	3.1	18	8.3

残事業評価（水辺整備）

	便益	残存価値	総便益	総建設費	総維持管理費	総事業費	費用便益費
	①	②	③(①+②)	④	⑤	⑥(④+⑤)	⑦(③/⑥)
基本	166	0.00	166	15	3.1	18	9.2
残事業費+10%	166	0.00	166	17	3.1	20	8.3
残事業費-10%	166	0.00	166	14	3.1	17	9.8
残工期+10%	—	—	—	—	—	—	—
残工期-10%	—	—	—	—	—	—	—
便益+10%	183	0.00	183	15	3.1	18	10.2
便益-10%	149	0.00	149	15	3.1	18	8.3

注：上記数値は全て現在価値化された金額である。

：令和8年度以降の事業が5年未満であるため残工期±10%変動なし。

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）				費 用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便 益		残存 価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便 益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H 1 5 ～ R 1 1 年）	H 1 5	-23	2.465	1.420					74	259				74	259		
	H 1 6	-22	2.370	1.414					141	473				141	473		
	H 1 7	-21	2.279	1.407					141	452				141	452		
	H 1 8	-20	2.191	1.391					141	430				141	430		
	H 1 9	-19	2.107	1.369	78	164			133	384	0.59	1.7	134	386			
	H 2 0	-18	2.026	1.330	123	249			171	461	1.7	4.6	173	466			
	H 2 1	-17	1.948	1.373	123	240			236	631	1.7	4.5	238	636			
	H 2 2	-16	1.873	1.371	197	369			11	28	2.3	5.9	13	34			
	H 2 3	-15	1.801	1.336	197	355			29	70	2.3	5.5	31	76			
	H 2 4	-14	1.732	1.338	197	341			124	287	2.3	5.3	126	292			
	H 2 5	-13	1.665	1.314	197	328			25	55	2.3	5.0	27	60			
	H 2 6	-12	1.601	1.271	197	315			213	433	2.3	4.7	215	438			
	H 2 7	-11	1.539	1.267	197	303			224	437	2.3	4.5	226	442			
	H 2 8	-10	1.480	1.258	197	292			240	447	2.3	4.3	242	451			
	H 2 9	-9	1.423	1.230	197	280			224	392	2.3	4.0	226	396			
	H 3 0	-8	1.369	1.189	197	270			213	347	2.3	3.7	215	351			
	R 1	-7	1.316	1.163	197	259			32	49	2.3	3.5	34	53			
	R 2	-6	1.265	1.164	197	249			165	243	2.3	3.4	167	246			
	R 3	-5	1.217	1.129	197	240			38	52	2.3	3.2	40	55			
	R 4	-4	1.170	1.083	920	1,076			105	133	3.5	4.4	109	137			
	R 5	-3	1.125	1.050	920	1,035			50	59	3.5	4.1	54	63			
	R 6	-2	1.082	1.000	1,260	1,363			36	39	3.5	3.8	40	43			
	R 7	-1	1.040	1.000	1,260	1,310			24	25	3.5	3.6	28	29			
	R 8	0	1.000	1.000	1,413	1,413			4.5	4.5	6.6	6.6	11	11			
	R 9	1	0.962	1.000	1,413	1,359			5.5	5.3	6.6	6.3	12	12			
	R 10	2	0.925	1.000	1,413	1,306			5.5	5.1	6.6	6.1	12	11			
	R 11	3	0.889	1.000	1,413	1,256			5.5	4.9	6.6	5.9	12	11			
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.855	1.000	1,479	1,264					6.8	5.8	6.8	5.8			
	R 13	5	0.822	1.000	1,479	1,216					6.8	5.6	6.8	5.6			
	R 14	6	0.790	1.000	1,479	1,169					6.8	5.4	6.8	5.4			
	R 15	7	0.760	1.000	1,479	1,124					6.8	5.2	6.8	5.2			
	R 16	8	0.731	1.000	1,479	1,081					6.8	5.0	6.8	5.0			
	R 17	9	0.703	1.000	1,479	1,039					6.8	4.8	6.8	4.8			
	R 18	10	0.676	1.000	1,479	999					6.8	4.6	6.8	4.6			
	R 19	11	0.650	1.000	1,479	961					6.8	4.4	6.8	4.4			
	R 20	12	0.625	1.000	1,479	924					6.8	4.2	6.8	4.2			
	R 21	13	0.601	1.000	1,479	888					6.8	4.1	6.8	4.1			
	R 22	14	0.577	1.000	1,479	854					6.8	3.9	6.8	3.9			
	R 23	15	0.555	1.000	1,479	821					6.8	3.8	6.8	3.8			
	R 24	16	0.534	1.000	1,479	790					6.8	3.6	6.8	3.6			
	R 25	17	0.513	1.000	1,479	759					6.8	3.5	6.8	3.5			
	R 26	18	0.494	1.000	1,479	730					6.8	3.4	6.8	3.4			
	R 27	19	0.475	1.000	1,479	702					6.8	3.2	6.8	3.2			
	R 28	20	0.456	1.000	1,479	675					6.8	3.1	6.8	3.1			
	R 29	21	0.439	1.000	1,479	649					6.8	3.0	6.8	3.0			
	R 30	22	0.422	1.000	1,479	624					6.8	2.9	6.8	2.9			
	R 31	23	0.406	1.000	1,479	600					6.8	2.8	6.8	2.8			
	R 32	24	0.390	1.000	1,479	577					6.8	2.7	6.8	2.7			
	R 33	25	0.375	1.000	1,479	555					6.8	2.6	6.8	2.6			
	R 34	26	0.361	1.000	1,479	533					6.8	2.5	6.8	2.5			
	R 35	27	0.347	1.000	1,479	513					6.8	2.4	6.8	2.4			
	R 36	28	0.333	1.000	1,479	493					6.8	2.3	6.8	2.3			
	R 37	29	0.321	1.000	1,479	474					6.8	2.2	6.8	2.2			
	R 38	30	0.308	1.000	1,479	456					6.8	2.1	6.8	2.1			
	R 39	31	0.296	1.000	1,401	415					6.2	1.8	6.2	1.8			
	R 40	32	0.285	1.000	1,356	387					5.1	1.5	5.1	1.5			
	R 41	33	0.274	1.000	1,356	372					5.1	1.4	5.1	1.4			
	R 42	34	0.264	1.000	1,282	338					4.5	1.2	4.5	1.2			
	R 43	35	0.253	1.000	1,282	325					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 44	36	0.244	1.000	1,282	312					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 45	37	0.234	1.000	1,282	300					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 46	38	0.225	1.000	1,282	289					4.5	1.0	4.5	1.0			
	R 47	39	0.217	1.000	1,282	278					4.5	0.97	4.5	0.97			
	R 48	40	0.208	1.000	1,282	267					4.5	0.94	4.5	0.94			
	R 49	41	0.200	1.000	1,282	257					4.5	0.90	4.5	0.90			
	R 50	42	0.193	1.000	1,282	247					4.5	0.87	4.5	0.87			
	R 51	43	0.185	1.000	1,282	237					4.5	0.83	4.5	0.83			
	R 52	44	0.178	1.000	1,282	228					4.5	0.80	4.5	0.80			
	R 53	45	0.171	1.000	1,282	219					4.5	0.77	4.5	0.77			
	R 54	46	0.165	1.000	559	92					3.3	0.54	3.3	0.54			
	R 55	47	0.158	1.000	559	88					3.3	0.52	3.3	0.52			
	R 56	48	0.152	1.000	219	33					3.3	0.50	3.3	0.50			
	R 57	49	0.146	1.000	219	32					3.3	0.48	3.3	0.48			
	R 58	50	0.141	1.000	66	9.3					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 59	51	0.135	1.000	66	8.9					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 60	52	0.130	1.000	66	8.6					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 61	53	0.125	1.000	66	8.3					0.16	0.02	0.16	0.02			
合 計					73,950	40,593	39	40,632	2,811	6,206	340	222	3,151	6,428	6.3	34,204	18.4%

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益 比 B / C	純現在価値 B - C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H 15～R 11年）	H 15	-23	2.465	1.420					74	259				74	259		
	H 16	-22	2.370	1.414					141	473				141	473		
	H 17	-21	2.279	1.407					141	452				141	452		
	H 18	-20	2.191	1.391					141	430				141	430		
	H 19	-19	2.107	1.369	78	164			133	384	0.59	1.7	134	386			
	H 20	-18	2.026	1.330	123	249			171	461	1.7	4.6	173	466			
	H 21	-17	1.948	1.373	123	240			236	631	1.7	4.5	238	636			
	H 22	-16	1.873	1.371	197	369			11	28	2.3	5.9	13	34			
	H 23	-15	1.801	1.336	197	355			29	70	2.3	5.5	31	76			
	H 24	-14	1.732	1.338	197	341			124	287	2.3	5.3	126	292			
	H 25	-13	1.665	1.314	197	328			25	55	2.3	5.0	27	60			
	H 26	-12	1.601	1.271	197	315			213	433	2.3	4.7	215	438			
	H 27	-11	1.539	1.267	197	303			224	437	2.3	4.5	226	442			
	H 28	-10	1.480	1.258	197	292			240	447	2.3	4.3	242	451			
	H 29	-9	1.423	1.230	197	280			224	392	2.3	4.0	226	396			
	H 30	-8	1.369	1.189	197	270			213	347	2.3	3.7	215	351			
	R 1	-7	1.316	1.163	197	259			32	49	2.3	3.5	34	53			
	R 2	-6	1.265	1.164	197	249			165	243	2.3	3.4	167	246			
	R 3	-5	1.217	1.129	197	240			38	52	2.3	3.2	40	55			
	R 4	-4	1.170	1.083	920	1,076			105	133	3.5	4.4	109	137			
	R 5	-3	1.125	1.050	920	1,035			50	59	3.5	4.1	54	63			
	R 6	-2	1.082	1.000	1,260	1,363			36	39	3.5	3.8	40	43			
	R 7	-1	1.040	1.000	1,260	1,310			24	25	3.5	3.6	28	29			
	R 8	0	1.000	1.000	1,413	1,413			4.5	4.5	6.6	6.6	11	11			
	R 9	1	0.962	1.000	1,413	1,359			6.1	5.9	6.6	6.3	13	12			
	R 10	2	0.925	1.000	1,413	1,306			6.1	5.6	6.6	6.1	13	12			
	R 11	3	0.889	1.000	1,413	1,256			6.1	5.4	6.6	5.9	13	11			
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.855	1.000	1,479	1,264					6.8	5.8	6.8	5.8			
	R 13	5	0.822	1.000	1,479	1,216					6.8	5.6	6.8	5.6			
	R 14	6	0.790	1.000	1,479	1,169					6.8	5.4	6.8	5.4			
	R 15	7	0.760	1.000	1,479	1,124					6.8	5.2	6.8	5.2			
	R 16	8	0.731	1.000	1,479	1,081					6.8	5.0	6.8	5.0			
	R 17	9	0.703	1.000	1,479	1,039					6.8	4.8	6.8	4.8			
	R 18	10	0.676	1.000	1,479	999					6.8	4.6	6.8	4.6			
	R 19	11	0.650	1.000	1,479	961					6.8	4.4	6.8	4.4			
	R 20	12	0.625	1.000	1,479	924					6.8	4.2	6.8	4.2			
	R 21	13	0.601	1.000	1,479	888					6.8	4.1	6.8	4.1			
	R 22	14	0.577	1.000	1,479	854					6.8	3.9	6.8	3.9			
	R 23	15	0.555	1.000	1,479	821					6.8	3.8	6.8	3.8			
	R 24	16	0.534	1.000	1,479	790					6.8	3.6	6.8	3.6			
	R 25	17	0.513	1.000	1,479	759					6.8	3.5	6.8	3.5			
	R 26	18	0.494	1.000	1,479	730					6.8	3.4	6.8	3.4			
	R 27	19	0.475	1.000	1,479	702					6.8	3.2	6.8	3.2			
	R 28	20	0.456	1.000	1,479	675					6.8	3.1	6.8	3.1			
	R 29	21	0.439	1.000	1,479	649					6.8	3.0	6.8	3.0			
	R 30	22	0.422	1.000	1,479	624					6.8	2.9	6.8	2.9			
	R 31	23	0.406	1.000	1,479	600					6.8	2.8	6.8	2.8			
	R 32	24	0.390	1.000	1,479	577					6.8	2.7	6.8	2.7			
	R 33	25	0.375	1.000	1,479	555					6.8	2.6	6.8	2.6			
	R 34	26	0.361	1.000	1,479	533					6.8	2.5	6.8	2.5			
	R 35	27	0.347	1.000	1,479	513					6.8	2.4	6.8	2.4			
	R 36	28	0.333	1.000	1,479	493					6.8	2.3	6.8	2.3			
	R 37	29	0.321	1.000	1,479	474					6.8	2.2	6.8	2.2			
	R 38	30	0.308	1.000	1,479	456					6.8	2.1	6.8	2.1			
	R 39	31	0.296	1.000	1,401	415					6.2	1.8	6.2	1.8			
	R 40	32	0.285	1.000	1,356	387					5.1	1.5	5.1	1.5			
	R 41	33	0.274	1.000	1,356	372					5.1	1.4	5.1	1.4			
	R 42	34	0.264	1.000	1,282	338					4.5	1.2	4.5	1.2			
	R 43	35	0.253	1.000	1,282	325					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 44	36	0.244	1.000	1,282	312					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 45	37	0.234	1.000	1,282	300					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 46	38	0.225	1.000	1,282	289					4.5	1.0	4.5	1.0			
	R 47	39	0.217	1.000	1,282	278					4.5	0.97	4.5	0.97			
	R 48	40	0.208	1.000	1,282	267					4.5	0.94	4.5	0.94			
	R 49	41	0.200	1.000	1,282	257					4.5	0.90	4.5	0.90			
	R 50	42	0.193	1.000	1,282	247					4.5	0.87	4.5	0.87			
	R 51	43	0.185	1.000	1,282	237					4.5	0.83	4.5	0.83			
	R 52	44	0.178	1.000	1,282	228					4.5	0.80	4.5	0.80			
	R 53	45	0.171	1.000	1,282	219					4.5	0.77	4.5	0.77			
	R 54	46	0.165	1.000	559	92					3.3	0.54	3.3	0.54			
	R 55	47	0.158	1.000	559	88					3.3	0.52	3.3	0.52			
	R 56	48	0.152	1.000	219	33					3.3	0.50	3.3	0.50			
	R 57	49	0.146	1.000	219	32					3.3	0.48	3.3	0.48			
	R 58	50	0.141	1.000	66	9.3					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 59	51	0.135	1.000	66	8.9					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 60	52	0.130	1.000	66	8.6					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 61	53	0.125	1.000	66	8.3					0.16	0.02	0.16	0.02			
合 計					73,950	40,593	39	40,632	2,813	6,207	340	222	3,153	6,429	6.3	34,203	18.4%

様式－５

費用対便益（全体事業：残事業費－10%）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）				費 用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便 益		残 存 価 値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便 益	現在価 値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H 15～R 11年）	H 15	-23	2.465	1.420					74	259				74	259		
	H 16	-22	2.370	1.414					141	473				141	473		
	H 17	-21	2.279	1.407					141	452				141	452		
	H 18	-20	2.191	1.391					141	430				141	430		
	H 19	-19	2.107	1.369	78	164			133	384	0.59	1.7	134	386			
	H 20	-18	2.026	1.330	123	249			171	461	1.7	4.6	173	466			
	H 21	-17	1.948	1.373	123	240			236	631	1.7	4.5	238	636			
	H 22	-16	1.873	1.371	197	369			11	28	2.3	5.9	13	34			
	H 23	-15	1.801	1.336	197	355			29	70	2.3	5.5	31	76			
	H 24	-14	1.732	1.338	197	341			124	287	2.3	5.3	126	292			
	H 25	-13	1.665	1.314	197	328			25	55	2.3	5.0	27	60			
	H 26	-12	1.601	1.271	197	315			213	433	2.3	4.7	215	438			
	H 27	-11	1.539	1.267	197	303			224	437	2.3	4.5	226	442			
	H 28	-10	1.480	1.258	197	292			240	447	2.3	4.3	242	451			
	H 29	-9	1.423	1.230	197	280			224	392	2.3	4.0	226	396			
	H 30	-8	1.369	1.189	197	270			213	347	2.3	3.7	215	351			
	R 1	-7	1.316	1.163	197	259			32	49	2.3	3.5	34	53			
	R 2	-6	1.265	1.164	197	249			165	243	2.3	3.4	167	246			
	R 3	-5	1.217	1.129	197	240			38	52	2.3	3.2	40	55			
	R 4	-4	1.170	1.083	920	1,076			105	133	3.5	4.4	109	137			
	R 5	-3	1.125	1.050	920	1,035			50	59	3.5	4.1	54	63			
R 6	-2	1.082	1.000	1,260	1,363			36	39	3.5	3.8	40	43				
R 7	-1	1.040	1.000	1,260	1,310			24	25	3.5	3.6	28	29				
R 8	0	1.000	1.000	1,413	1,413			4.5	4.5	6.6	6.6	11	11				
R 9	1	0.962	1.000	1,413	1,359			5.0	4.8	6.6	6.3	12	11				
R 10	2	0.925	1.000	1,413	1,306			5.0	4.6	6.6	6.1	12	11				
R 11	3	0.889	1.000	1,413	1,256			5.0	4.4	6.6	5.9	12	10				
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.855	1.000	1,479	1,264					6.8	5.8	6.8	5.8			
	R 13	5	0.822	1.000	1,479	1,216					6.8	5.6	6.8	5.6			
	R 14	6	0.790	1.000	1,479	1,169					6.8	5.4	6.8	5.4			
	R 15	7	0.760	1.000	1,479	1,124					6.8	5.2	6.8	5.2			
	R 16	8	0.731	1.000	1,479	1,081					6.8	5.0	6.8	5.0			
	R 17	9	0.703	1.000	1,479	1,039					6.8	4.8	6.8	4.8			
	R 18	10	0.676	1.000	1,479	999					6.8	4.6	6.8	4.6			
	R 19	11	0.650	1.000	1,479	961					6.8	4.4	6.8	4.4			
	R 20	12	0.625	1.000	1,479	924					6.8	4.2	6.8	4.2			
	R 21	13	0.601	1.000	1,479	888					6.8	4.1	6.8	4.1			
	R 22	14	0.577	1.000	1,479	854					6.8	3.9	6.8	3.9			
	R 23	15	0.555	1.000	1,479	821					6.8	3.8	6.8	3.8			
	R 24	16	0.534	1.000	1,479	790					6.8	3.6	6.8	3.6			
	R 25	17	0.513	1.000	1,479	759					6.8	3.5	6.8	3.5			
	R 26	18	0.494	1.000	1,479	730					6.8	3.4	6.8	3.4			
	R 27	19	0.475	1.000	1,479	702					6.8	3.2	6.8	3.2			
	R 28	20	0.456	1.000	1,479	675					6.8	3.1	6.8	3.1			
	R 29	21	0.439	1.000	1,479	649					6.8	3.0	6.8	3.0			
	R 30	22	0.422	1.000	1,479	624					6.8	2.9	6.8	2.9			
	R 31	23	0.406	1.000	1,479	600					6.8	2.8	6.8	2.8			
	R 32	24	0.390	1.000	1,479	577					6.8	2.7	6.8	2.7			
	R 33	25	0.375	1.000	1,479	555					6.8	2.6	6.8	2.6			
	R 34	26	0.361	1.000	1,479	533					6.8	2.5	6.8	2.5			
	R 35	27	0.347	1.000	1,479	513					6.8	2.4	6.8	2.4			
	R 36	28	0.333	1.000	1,479	493					6.8	2.3	6.8	2.3			
	R 37	29	0.321	1.000	1,479	474					6.8	2.2	6.8	2.2			
	R 38	30	0.308	1.000	1,479	456					6.8	2.1	6.8	2.1			
	R 39	31	0.296	1.000	1,401	415					6.2	1.8	6.2	1.8			
	R 40	32	0.285	1.000	1,356	387					5.1	1.5	5.1	1.5			
	R 41	33	0.274	1.000	1,356	372					5.1	1.4	5.1	1.4			
	R 42	34	0.264	1.000	1,282	338					4.5	1.2	4.5	1.2			
	R 43	35	0.253	1.000	1,282	325					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 44	36	0.244	1.000	1,282	312					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 45	37	0.234	1.000	1,282	300					4.5	1.1	4.5	1.1			
	R 46	38	0.225	1.000	1,282	289					4.5	1.0	4.5	1.0			
	R 47	39	0.217	1.000	1,282	278					4.5	0.97	4.5	0.97			
	R 48	40	0.208	1.000	1,282	267					4.5	0.94	4.5	0.94			
	R 49	41	0.200	1.000	1,282	257					4.5	0.90	4.5	0.90			
	R 50	42	0.193	1.000	1,282	247					4.5	0.87	4.5	0.87			
	R 51	43	0.185	1.000	1,282	237					4.5	0.83	4.5	0.83			
R 52	44	0.178	1.000	1,282	228					4.5	0.80	4.5	0.80				
R 53	45	0.171	1.000	1,282	219					4.5	0.77	4.5	0.77				
R 54	46	0.165	1.000	559	92					3.3	0.54	3.3	0.54				
R 55	47	0.158	1.000	559	88					3.3	0.52	3.3	0.52				
R 56	48	0.152	1.000	219	33					3.3	0.50	3.3	0.50				
R 57	49	0.146	1.000	219	32					3.3	0.48	3.3	0.48				
R 58	50	0.141	1.000	66	9.3					0.16	0.02	0.16	0.02				
R 59	51	0.135	1.000	66	8.9					0.16	0.02	0.16	0.02				
R 60	52	0.130	1.000	66	8.6					0.16	0.02	0.16	0.02				
R 61	53	0.125	1.000	66	8.3					0.16	0.02	0.16	0.02				
合 計					73,950	40,593	39	40,632	2,810	6,204	340	222	3,150	6,426	6.3	34,206	18.4%

様式－５

費用対便益（全体事業：資産+10%）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益		残存価 値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価 値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H15～R11年）	H 15	-23	2.465	1.420				74	259				74	259			
	H 16	-22	2.370	1.414				141	473				141	473			
	H 17	-21	2.279	1.407				141	452				141	452			
	H 18	-20	2.191	1.391				141	430				141	430			
	H 19	-19	2.107	1.369	86	181		133	384	0.59	1.7	134	386				
	H 20	-18	2.026	1.330	135	273		171	461	1.7	4.6	173	466				
	H 21	-17	1.948	1.373	135	263		236	631	1.7	4.5	238	636				
	H 22	-16	1.873	1.371	217	406		11	28	2.3	5.9	13	34				
	H 23	-15	1.801	1.336	217	391		29	70	2.3	5.5	31	76				
	H 24	-14	1.732	1.338	217	376		124	287	2.3	5.3	126	292				
	H 25	-13	1.665	1.314	217	361		25	55	2.3	5.0	27	60				
	H 26	-12	1.601	1.271	217	347		213	433	2.3	4.7	215	438				
	H 27	-11	1.539	1.267	217	334		224	437	2.3	4.5	226	442				
	H 28	-10	1.480	1.258	217	321		240	447	2.3	4.3	242	451				
	H 29	-9	1.423	1.230	217	309		224	392	2.3	4.0	226	396				
	H 30	-8	1.369	1.189	217	297		213	347	2.3	3.7	215	351				
	R 1	-7	1.316	1.163	217	286		32	49	2.3	3.5	34	53				
	R 2	-6	1.265	1.164	217	275		165	243	2.3	3.4	167	246				
	R 3	-5	1.217	1.129	217	264		38	52	2.3	3.2	40	55				
	R 4	-4	1.170	1.083	1,012	1,184		105	133	3.5	4.4	109	137				
	R 5	-3	1.125	1.050	1,012	1,138		50	59	3.5	4.1	54	63				
	R 6	-2	1.082	1.000	1,386	1,499		36	39	3.5	3.8	40	43				
	R 7	-1	1.040	1.000	1,386	1,441		24	25	3.5	3.6	28	29				
		R 8	0	1.000	1.000	1,554	1,554		4.5	4.5	6.6	6.6	11	11			
		R 9	1	0.962	1.000	1,554	1,494		5.5	5.3	6.6	6.3	12	12			
		R 10	2	0.925	1.000	1,554	1,437		5.5	5.1	6.6	6.1	12	11			
		R 11	3	0.889	1.000	1,554	1,382		5.5	4.9	6.6	5.9	12	11			
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.855	1.000	1,627	1,391				6.8	5.8	6.8	5.8				
	R 13	5	0.822	1.000	1,627	1,337				6.8	5.6	6.8	5.6				
	R 14	6	0.790	1.000	1,627	1,286				6.8	5.4	6.8	5.4				
	R 15	7	0.760	1.000	1,627	1,236				6.8	5.2	6.8	5.2				
	R 16	8	0.731	1.000	1,627	1,189				6.8	5.0	6.8	5.0				
	R 17	9	0.703	1.000	1,627	1,143				6.8	4.8	6.8	4.8				
	R 18	10	0.676	1.000	1,627	1,099				6.8	4.6	6.8	4.6				
	R 19	11	0.650	1.000	1,627	1,057				6.8	4.4	6.8	4.4				
	R 20	12	0.625	1.000	1,627	1,016				6.8	4.2	6.8	4.2				
	R 21	13	0.601	1.000	1,627	977				6.8	4.1	6.8	4.1				
	R 22	14	0.577	1.000	1,627	940				6.8	3.9	6.8	3.9				
	R 23	15	0.555	1.000	1,627	903				6.8	3.8	6.8	3.8				
	R 24	16	0.534	1.000	1,627	869				6.8	3.6	6.8	3.6				
	R 25	17	0.513	1.000	1,627	835				6.8	3.5	6.8	3.5				
	R 26	18	0.494	1.000	1,627	803				6.8	3.4	6.8	3.4				
	R 27	19	0.475	1.000	1,627	772				6.8	3.2	6.8	3.2				
	R 28	20	0.456	1.000	1,627	743				6.8	3.1	6.8	3.1				
	R 29	21	0.439	1.000	1,627	714				6.8	3.0	6.8	3.0				
	R 30	22	0.422	1.000	1,627	687				6.8	2.9	6.8	2.9				
	R 31	23	0.406	1.000	1,627	660				6.8	2.8	6.8	2.8				
	R 32	24	0.390	1.000	1,627	635				6.8	2.7	6.8	2.7				
	R 33	25	0.375	1.000	1,627	610				6.8	2.6	6.8	2.6				
	R 34	26	0.361	1.000	1,627	587				6.8	2.5	6.8	2.5				
	R 35	27	0.347	1.000	1,627	564				6.8	2.4	6.8	2.4				
	R 36	28	0.333	1.000	1,627	543				6.8	2.3	6.8	2.3				
	R 37	29	0.321	1.000	1,627	522				6.8	2.2	6.8	2.2				
	R 38	30	0.308	1.000	1,627	502				6.8	2.1	6.8	2.1				
	R 39	31	0.296	1.000	1,541	457				6.2	1.8	6.2	1.8				
	R 40	32	0.285	1.000	1,492	425				5.1	1.5	5.1	1.5				
	R 41	33	0.274	1.000	1,492	409				5.1	1.4	5.1	1.4				
	R 42	34	0.264	1.000	1,410	372				4.5	1.2	4.5	1.2				
	R 43	35	0.253	1.000	1,410	357				4.5	1.1	4.5	1.1				
	R 44	36	0.244	1.000	1,410	344				4.5	1.1	4.5	1.1				
	R 45	37	0.234	1.000	1,410	330				4.5	1.1	4.5	1.1				
	R 46	38	0.225	1.000	1,410	318				4.5	1.0	4.5	1.0				
	R 47	39	0.217	1.000	1,410	305				4.5	0.97	4.5	0.97				
	R 48	40	0.208	1.000	1,410	294				4.5	0.94	4.5	0.94				
	R 49	41	0.200	1.000	1,410	282				4.5	0.90	4.5	0.90				
	R 50	42	0.193	1.000	1,410	272				4.5	0.87	4.5	0.87				
	R 51	43	0.185	1.000	1,410	261				4.5	0.83	4.5	0.83				
	R 52	44	0.178	1.000	1,410	251				4.5	0.80	4.5	0.80				
	R 53	45	0.171	1.000	1,410	241				4.5	0.77	4.5	0.77				
	R 54	46	0.165	1.000	615	101				3.3	0.54	3.3	0.54				
	R 55	47	0.158	1.000	615	97				3.3	0.52	3.3	0.52				
	R 56	48	0.152	1.000	241	37				3.3	0.50	3.3	0.50				
	R 57	49	0.146	1.000	241	35				3.3	0.48	3.3	0.48				
	R 58	50	0.141	1.000	73	10				0.16	0.02	0.16	0.02				
	R 59	51	0.135	1.000	73	9.9				0.16	0.02	0.16	0.02				
	R 60	52	0.130	1.000	73	9.5				0.16	0.02	0.16	0.02				
	R 61	53	0.125	1.000	73	9.1				0.16	0.02	0.16	0.02				
合 計					81,350	44,660	39	44,699	2,811	6,206	340	222	3,151	6,428	7.0	38,271	19.5%

様式－５

費用対便益（全体事業：資産-10%）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益		残存価 値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価 値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H15～R11年）	H 15	-23	2.465	1.420				74	259				74	259			
	H 16	-22	2.370	1.414				141	473				141	473			
	H 17	-21	2.279	1.407				141	452				141	452			
	H 18	-20	2.191	1.391				141	430				141	430			
	H 19	-19	2.107	1.369	70	147		133	384	0.59	1.7	134	386				
	H 20	-18	2.026	1.330	111	225		171	461	1.7	4.6	173	466				
	H 21	-17	1.948	1.373	111	216		236	631	1.7	4.5	238	636				
	H 22	-16	1.873	1.371	177	332		11	28	2.3	5.9	13	34				
	H 23	-15	1.801	1.336	177	319		29	70	2.3	5.5	31	76				
	H 24	-14	1.732	1.338	177	307		124	287	2.3	5.3	126	292				
	H 25	-13	1.665	1.314	177	295		25	55	2.3	5.0	27	60				
	H 26	-12	1.601	1.271	177	283		213	433	2.3	4.7	215	438				
	H 27	-11	1.539	1.267	177	272		224	437	2.3	4.5	226	442				
	H 28	-10	1.480	1.258	177	262		240	447	2.3	4.3	242	451				
	H 29	-9	1.423	1.230	177	252		224	392	2.3	4.0	226	396				
	H 30	-8	1.369	1.189	177	242		213	347	2.3	3.7	215	351				
	R 1	-7	1.316	1.163	177	233		32	49	2.3	3.5	34	53				
	R 2	-6	1.265	1.164	177	224		165	243	2.3	3.4	167	246				
	R 3	-5	1.217	1.129	177	215		38	52	2.3	3.2	40	55				
	R 4	-4	1.170	1.083	828	969		105	133	3.5	4.4	109	137				
	R 5	-3	1.125	1.050	828	931		50	59	3.5	4.1	54	63				
	R 6	-2	1.082	1.000	1,134	1,227		36	39	3.5	3.8	40	43				
	R 7	-1	1.040	1.000	1,134	1,179		24	25	3.5	3.6	28	29				
		R 8	0	1.000	1.000	1,272	1,272		4.5	4.5	6.6	6.6	11	11			
	R 9	1	0.962	1.000	1,272	1,223		5.5	5.3	6.6	6.3	12	12				
	R 10	2	0.925	1.000	1,272	1,176		5.5	5.1	6.6	6.1	12	11				
	R 11	3	0.889	1.000	1,272	1,131		5.5	4.9	6.6	5.9	12	11				
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.855	1.000	1,331	1,138				6.8	5.8	6.8	5.8				
	R 13	5	0.822	1.000	1,331	1,094				6.8	5.6	6.8	5.6				
	R 14	6	0.790	1.000	1,331	1,052				6.8	5.4	6.8	5.4				
	R 15	7	0.760	1.000	1,331	1,011				6.8	5.2	6.8	5.2				
	R 16	8	0.731	1.000	1,331	973				6.8	5.0	6.8	5.0				
	R 17	9	0.703	1.000	1,331	935				6.8	4.8	6.8	4.8				
	R 18	10	0.676	1.000	1,331	899				6.8	4.6	6.8	4.6				
	R 19	11	0.650	1.000	1,331	865				6.8	4.4	6.8	4.4				
	R 20	12	0.625	1.000	1,331	831				6.8	4.2	6.8	4.2				
	R 21	13	0.601	1.000	1,331	799				6.8	4.1	6.8	4.1				
	R 22	14	0.577	1.000	1,331	769				6.8	3.9	6.8	3.9				
	R 23	15	0.555	1.000	1,331	739				6.8	3.8	6.8	3.8				
	R 24	16	0.534	1.000	1,331	711				6.8	3.6	6.8	3.6				
	R 25	17	0.513	1.000	1,331	683				6.8	3.5	6.8	3.5				
	R 26	18	0.494	1.000	1,331	657				6.8	3.4	6.8	3.4				
	R 27	19	0.475	1.000	1,331	632				6.8	3.2	6.8	3.2				
	R 28	20	0.456	1.000	1,331	607				6.8	3.1	6.8	3.1				
	R 29	21	0.439	1.000	1,331	584				6.8	3.0	6.8	3.0				
	R 30	22	0.422	1.000	1,331	562				6.8	2.9	6.8	2.9				
	R 31	23	0.406	1.000	1,331	540				6.8	2.8	6.8	2.8				
	R 32	24	0.390	1.000	1,331	519				6.8	2.7	6.8	2.7				
	R 33	25	0.375	1.000	1,331	499				6.8	2.6	6.8	2.6				
	R 34	26	0.361	1.000	1,331	480				6.8	2.5	6.8	2.5				
	R 35	27	0.347	1.000	1,331	462				6.8	2.4	6.8	2.4				
	R 36	28	0.333	1.000	1,331	444				6.8	2.3	6.8	2.3				
	R 37	29	0.321	1.000	1,331	427				6.8	2.2	6.8	2.2				
	R 38	30	0.308	1.000	1,331	410				6.8	2.1	6.8	2.1				
	R 39	31	0.296	1.000	1,261	374				6.2	1.8	6.2	1.8				
	R 40	32	0.285	1.000	1,220	348				5.1	1.5	5.1	1.5				
	R 41	33	0.274	1.000	1,220	334				5.1	1.4	5.1	1.4				
	R 42	34	0.264	1.000	1,154	304				4.5	1.2	4.5	1.2				
	R 43	35	0.253	1.000	1,154	292				4.5	1.1	4.5	1.1				
	R 44	36	0.244	1.000	1,154	281				4.5	1.1	4.5	1.1				
	R 45	37	0.234	1.000	1,154	270				4.5	1.1	4.5	1.1				
	R 46	38	0.225	1.000	1,154	260				4.5	1.0	4.5	1.0				
	R 47	39	0.217	1.000	1,154	250				4.5	0.97	4.5	0.97				
	R 48	40	0.208	1.000	1,154	240				4.5	0.94	4.5	0.94				
	R 49	41	0.200	1.000	1,154	231				4.5	0.90	4.5	0.90				
	R 50	42	0.193	1.000	1,154	222				4.5	0.87	4.5	0.87				
	R 51	43	0.185	1.000	1,154	214				4.5	0.83	4.5	0.83				
R 52	44	0.178	1.000	1,154	205				4.5	0.80	4.5	0.80					
R 53	45	0.171	1.000	1,154	198				4.5	0.77	4.5	0.77					
R 54	46	0.165	1.000	503	83				3.3	0.54	3.3	0.54					
R 55	47	0.158	1.000	503	80				3.3	0.52	3.3	0.52					
R 56	48	0.152	1.000	197	30				3.3	0.50	3.3	0.50					
R 57	49	0.146	1.000	197	29				3.3	0.48	3.3	0.48					
R 58	50	0.141	1.000	59	8.3				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 59	51	0.135	1.000	59	8.0				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 60	52	0.130	1.000	59	7.7				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 61	53	0.125	1.000	59	7.4				0.16	0.02	0.16	0.02					
合 計					66,550	36,530	39	36,569	2,811	6,206	340	222	3,151	6,428	5.7	30,141	17.2%

様式－５

費用対便益（残事業）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	費用対便益（残事業）			費 用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 收益率 EIRR	
					便益		残存価 値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価 値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間 （H15～ R11年）	H 15	-23	2.465	1.420													
	H 16	-22	2.370	1.414													
	H 17	-21	2.279	1.407													
	H 18	-20	2.191	1.391													
	H 19	-19	2.107	1.369													
	H 20	-18	2.026	1.330													
	H 21	-17	1.948	1.373													
	H 22	-16	1.873	1.371													
	H 23	-15	1.801	1.336													
	H 24	-14	1.732	1.338													
	H 25	-13	1.665	1.314													
	H 26	-12	1.601	1.271													
	H 27	-11	1.539	1.267													
	H 28	-10	1.480	1.258													
	H 29	-9	1.423	1.230													
	H 30	-8	1.369	1.189													
	R 1	-7	1.316	1.163													
	R 2	-6	1.265	1.164													
	R 3	-5	1.217	1.129													
	R 4	-4	1.170	1.083													
R 5	-3	1.125	1.050														
R 6	-2	1.082	1.000														
R 7	-1	1.040	1.000														
	R 8	0	1.000	1.000													
	R 9	1	0.962	1.000					5.5	5.3			5.5	5.3			
	R 10	2	0.925	1.000					5.5	5.1			5.5	5.1			
	R 11	3	0.889	1.000					5.5	4.9			5.5	4.9			
施設完成後の 評価期間（50年）	R 12	4	0.855	1.000	8.7	7.4					0.16	0.14	0.16	0.14			
	R 13	5	0.822	1.000	8.7	7.2					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 14	6	0.790	1.000	8.7	6.9					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 15	7	0.760	1.000	8.7	6.6					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 16	8	0.731	1.000	8.7	6.4					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 17	9	0.703	1.000	8.7	6.1					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 18	10	0.676	1.000	8.7	5.9					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 19	11	0.650	1.000	8.7	5.7					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 20	12	0.625	1.000	8.7	5.4					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 21	13	0.601	1.000	8.7	5.2					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 22	14	0.577	1.000	8.7	5.0					0.16	0.09	0.16	0.09			
	R 23	15	0.555	1.000	8.7	4.8					0.16	0.09	0.16	0.09			
	R 24	16	0.534	1.000	8.7	4.6					0.16	0.09	0.16	0.09			
	R 25	17	0.513	1.000	8.7	4.5					0.16	0.08	0.16	0.08			
	R 26	18	0.494	1.000	8.7	4.3					0.16	0.08	0.16	0.08			
	R 27	19	0.475	1.000	8.7	4.1					0.16	0.08	0.16	0.08			
	R 28	20	0.456	1.000	8.7	4.0					0.16	0.07	0.16	0.07			
	R 29	21	0.439	1.000	8.7	3.8					0.16	0.07	0.16	0.07			
	R 30	22	0.422	1.000	8.7	3.7					0.16	0.07	0.16	0.07			
	R 31	23	0.406	1.000	8.7	3.5					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 32	24	0.390	1.000	8.7	3.4					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 33	25	0.375	1.000	8.7	3.3					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 34	26	0.361	1.000	8.7	3.1					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 35	27	0.347	1.000	8.7	3.0					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 36	28	0.333	1.000	8.7	2.9					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 37	29	0.321	1.000	8.7	2.8					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 38	30	0.308	1.000	8.7	2.7					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 39	31	0.296	1.000	8.7	2.6					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 40	32	0.285	1.000	8.7	2.5					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 41	33	0.274	1.000	8.7	2.4					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 42	34	0.264	1.000	8.7	2.3					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 43	35	0.253	1.000	8.7	2.2					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 44	36	0.244	1.000	8.7	2.1					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 45	37	0.234	1.000	8.7	2.0					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 46	38	0.225	1.000	8.7	2.0					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 47	39	0.217	1.000	8.7	1.9					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 48	40	0.208	1.000	8.7	1.8					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 49	41	0.200	1.000	8.7	1.7					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 50	42	0.193	1.000	8.7	1.7					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 51	43	0.185	1.000	8.7	1.6					0.16	0.03	0.16	0.03			
R 52	44	0.178	1.000	8.7	1.5					0.16	0.03	0.16	0.03				
R 53	45	0.171	1.000	8.7	1.5					0.16	0.03	0.16	0.03				
R 54	46	0.165	1.000	8.7	1.4					0.16	0.03	0.16	0.03				
R 55	47	0.158	1.000	8.7	1.4					0.16	0.03	0.16	0.03				
R 56	48	0.152	1.000	8.7	1.3					0.16	0.02	0.16	0.02				
R 57	49	0.146	1.000	8.7	1.3					0.16	0.02	0.16	0.02				
R 58	50	0.141	1.000	8.7	1.2					0.16	0.02	0.16	0.02				
R 59	51	0.135	1.000	8.7	1.2					0.16	0.02	0.16	0.02				
R 60	52	0.130	1.000	8.7	1.1					0.16	0.02	0.16	0.02				
R 61	53	0.125	1.000	8.7	1.1					0.16	0.02	0.16	0.02				
合 計					435	166	0.00	166	17	15	8.0	3.1	25	18	9.2	148	36.7%

様式－５

費用対便益（残事業）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率※ 4%・2%	デフ レー ター	便 益（B）			費 用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益		残存 価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 8	0	1.000	1.000												
整備期間（ R 8～ R 13年）	H 15	-23	2.325	1.420												
	H 16	-22	2.236	1.414												
	H 17	-21	2.150	1.407												
	H 18	-20	2.067	1.391												
	H 19	-19	1.988	1.369												
	H 20	-18	1.911	1.330												
	H 21	-17	1.838	1.373												
	H 22	-16	1.767	1.371												
	H 23	-15	1.699	1.336												
	H 24	-14	1.634	1.338												
	H 25	-13	1.571	1.314												
	H 26	-12	1.510	1.271												
	H 27	-11	1.452	1.267												
	H 28	-10	1.396	1.258												
	H 29	-9	1.343	1.230												
	H 30	-8	1.291	1.189												
	R 1	-7	1.241	1.163												
	R 2	-6	1.194	1.164												
	R 3	-5	1.148	1.129												
	R 4	-4	1.104	1.083												
	R 5	-3	1.061	1.050												
	R 6	-2	1.040	1.000												
	R 7	-1	1.020	1.000												
	R 8	0	1.000	1.000												
	R 9	1	0.980	1.000					5.5	5.4			5.5	5.4		
	R 10	2	0.961	1.000					5.5	5.3			5.5	5.3		
	R 11	3	0.942	1.000					5.5	5.2			5.5	5.2		
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.924	1.000	8.7	8.0					0.16	0.15	0.16	0.15		
	R 13	5	0.906	1.000	8.7	7.9					0.16	0.14	0.16	0.14		
	R 14	6	0.888	1.000	8.7	7.7					0.16	0.14	0.16	0.14		
	R 15	7	0.871	1.000	8.7	7.6					0.16	0.14	0.16	0.14		
	R 16	8	0.853	1.000	8.7	7.4					0.16	0.14	0.16	0.14		
	R 17	9	0.837	1.000	8.7	7.3					0.16	0.13	0.16	0.13		
	R 18	10	0.820	1.000	8.7	7.1					0.16	0.13	0.16	0.13		
	R 19	11	0.804	1.000	8.7	7.0					0.16	0.13	0.16	0.13		
	R 20	12	0.788	1.000	8.7	6.9					0.16	0.13	0.16	0.13		
	R 21	13	0.773	1.000	8.7	6.7					0.16	0.12	0.16	0.12		
	R 22	14	0.758	1.000	8.7	6.6					0.16	0.12	0.16	0.12		
	R 23	15	0.743	1.000	8.7	6.5					0.16	0.12	0.16	0.12		
	R 24	16	0.728	1.000	8.7	6.3					0.16	0.12	0.16	0.12		
	R 25	17	0.714	1.000	8.7	6.2					0.16	0.11	0.16	0.11		
	R 26	18	0.700	1.000	8.7	6.1					0.16	0.11	0.16	0.11		
	R 27	19	0.686	1.000	8.7	6.0					0.16	0.11	0.16	0.11		
	R 28	20	0.673	1.000	8.7	5.9					0.16	0.11	0.16	0.11		
	R 29	21	0.660	1.000	8.7	5.7					0.16	0.11	0.16	0.11		
	R 30	22	0.647	1.000	8.7	5.6					0.16	0.10	0.16	0.10		
	R 31	23	0.634	1.000	8.7	5.5					0.16	0.10	0.16	0.10		
	R 32	24	0.622	1.000	8.7	5.4					0.16	0.10	0.16	0.10		
	R 33	25	0.610	1.000	8.7	5.3					0.16	0.10	0.16	0.10		
	R 34	26	0.598	1.000	8.7	5.2					0.16	0.10	0.16	0.10		
	R 35	27	0.586	1.000	8.7	5.1					0.16	0.09	0.16	0.09		
	R 36	28	0.574	1.000	8.7	5.0					0.16	0.09	0.16	0.09		
	R 37	29	0.563	1.000	8.7	4.9					0.16	0.09	0.16	0.09		
	R 38	30	0.552	1.000	8.7	4.8					0.16	0.09	0.16	0.09		
	R 39	31	0.541	1.000	8.7	4.7					0.16	0.09	0.16	0.09		
	R 40	32	0.531	1.000	8.7	4.6					0.16	0.08	0.16	0.08		
	R 41	33	0.520	1.000	8.7	4.5					0.16	0.08	0.16	0.08		
	R 42	34	0.510	1.000	8.7	4.4					0.16	0.08	0.16	0.08		
	R 43	35	0.500	1.000	8.7	4.4					0.16	0.08	0.16	0.08		
	R 44	36	0.490	1.000	8.7	4.3					0.16	0.08	0.16	0.08		
	R 45	37	0.481	1.000	8.7	4.2					0.16	0.08	0.16	0.08		
	R 46	38	0.471	1.000	8.7	4.1					0.16	0.08	0.16	0.08		
	R 47	39	0.462	1.000	8.7	4.0					0.16	0.07	0.16	0.07		
	R 48	40	0.453	1.000	8.7	3.9					0.16	0.07	0.16	0.07		
	R 49	41	0.444	1.000	8.7	3.9					0.16	0.07	0.16	0.07		
	R 50	42	0.435	1.000	8.7	3.8					0.16	0.07	0.16	0.07		
	R 51	43	0.427	1.000	8.7	3.7					0.16	0.07	0.16	0.07		
	R 52	44	0.418	1.000	8.7	3.6					0.16	0.07	0.16	0.07		
	R 53	45	0.410	1.000	8.7	3.6					0.16	0.07	0.16	0.07		
	R 54	46	0.402	1.000	8.7	3.5					0.16	0.06	0.16	0.06		
	R 55	47	0.394	1.000	8.7	3.4					0.16	0.06	0.16	0.06		
	R 56	48	0.387	1.000	8.7	3.4					0.16	0.06	0.16	0.06		
	R 57	49	0.379	1.000	8.7	3.3					0.16	0.06	0.16	0.06		
	R 58	50	0.372	1.000	8.7	3.2					0.16	0.06	0.16	0.06		
	R 59	51	0.364	1.000	8.7	3.2					0.16	0.06	0.16	0.06		
	R 60	52	0.357	1.000	8.7	3.1					0.16	0.06	0.16	0.06		
	R 61	53	0.350	1.000	8.7	3.0					0.16	0.06	0.16	0.06		
合 計					435	258	0.00	258	17	16	8.0	4.7	25	21	12.3	36.7%

※令和4年度までは4%、令和5年度以降は2%を適用

様式－５

費用対便益（残事業）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率※ 4%・1%	デフ レー ター	便 益（B）				費 用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 收益率 EIRR
					便 益		残存 価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（R 8～R 13年）	H 15	-23	2.258	1.420													
	H 16	-22	2.171	1.414													
	H 17	-21	2.087	1.407													
	H 18	-20	2.007	1.391													
	H 19	-19	1.930	1.369													
	H 20	-18	1.856	1.330													
	H 21	-17	1.784	1.373													
	H 22	-16	1.716	1.371													
	H 23	-15	1.650	1.336													
	H 24	-14	1.586	1.338													
	H 25	-13	1.525	1.314													
	H 26	-12	1.466	1.271													
	H 27	-11	1.410	1.267													
	H 28	-10	1.356	1.258													
	H 29	-9	1.304	1.230													
	H 30	-8	1.254	1.189													
	R 1	-7	1.205	1.163													
	R 2	-6	1.159	1.164													
	R 3	-5	1.114	1.129													
	R 4	-4	1.072	1.083													
	R 5	-3	1.030	1.050													
	R 6	-2	1.020	1.000													
	R 7	-1	1.010	1.000													
	R 8	0	1.000	1.000													
	R 9	1	0.990	1.000					5.5	5.4				5.5	5.4		
	R 10	2	0.980	1.000					5.5	5.4				5.5	5.4		
	R 11	3	0.971	1.000					5.5	5.3				5.5	5.3		
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.961	1.000	8.7	8.4					0.16	0.15	0.16	0.15			
	R 13	5	0.951	1.000	8.7	8.3					0.16	0.15	0.16	0.15			
	R 14	6	0.942	1.000	8.7	8.2					0.16	0.15	0.16	0.15			
	R 15	7	0.933	1.000	8.7	8.1					0.16	0.15	0.16	0.15			
	R 16	8	0.923	1.000	8.7	8.0					0.16	0.15	0.16	0.15			
	R 17	9	0.914	1.000	8.7	8.0					0.16	0.15	0.16	0.15			
	R 18	10	0.905	1.000	8.7	7.9					0.16	0.14	0.16	0.14			
	R 19	11	0.896	1.000	8.7	7.8					0.16	0.14	0.16	0.14			
	R 20	12	0.887	1.000	8.7	7.7					0.16	0.14	0.16	0.14			
	R 21	13	0.879	1.000	8.7	7.6					0.16	0.14	0.16	0.14			
	R 22	14	0.870	1.000	8.7	7.6					0.16	0.14	0.16	0.14			
	R 23	15	0.861	1.000	8.7	7.5					0.16	0.14	0.16	0.14			
	R 24	16	0.853	1.000	8.7	7.4					0.16	0.14	0.16	0.14			
	R 25	17	0.844	1.000	8.7	7.3					0.16	0.14	0.16	0.14			
	R 26	18	0.836	1.000	8.7	7.3					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 27	19	0.828	1.000	8.7	7.2					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 28	20	0.820	1.000	8.7	7.1					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 29	21	0.811	1.000	8.7	7.1					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 30	22	0.803	1.000	8.7	7.0					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 31	23	0.795	1.000	8.7	6.9					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 32	24	0.788	1.000	8.7	6.9					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 33	25	0.780	1.000	8.7	6.8					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 34	26	0.772	1.000	8.7	6.7					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 35	27	0.764	1.000	8.7	6.7					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 36	28	0.757	1.000	8.7	6.6					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 37	29	0.749	1.000	8.7	6.5					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 38	30	0.742	1.000	8.7	6.5					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 39	31	0.735	1.000	8.7	6.4					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 40	32	0.727	1.000	8.7	6.3					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 41	33	0.720	1.000	8.7	6.3					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 42	34	0.713	1.000	8.7	6.2					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 43	35	0.706	1.000	8.7	6.1					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 44	36	0.699	1.000	8.7	6.1					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 45	37	0.692	1.000	8.7	6.0					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 46	38	0.685	1.000	8.7	6.0					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 47	39	0.678	1.000	8.7	5.9					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 48	40	0.672	1.000	8.7	5.8					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 49	41	0.665	1.000	8.7	5.8					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 50	42	0.658	1.000	8.7	5.7					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 51	43	0.652	1.000	8.7	5.7					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 52	44	0.645	1.000	8.7	5.6					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 53	45	0.639	1.000	8.7	5.6					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 54	46	0.633	1.000	8.7	5.5					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 55	47	0.626	1.000	8.7	5.5					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 56	48	0.620	1.000	8.7	5.4					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 57	49	0.614	1.000	8.7	5.3					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 58	50	0.608	1.000	8.7	5.3					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 59	51	0.602	1.000	8.7	5.2					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 60	52	0.596	1.000	8.7	5.2					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 61	53	0.590	1.000	8.7	5.1					0.16	0.09	0.16	0.09			
合 計					435	331	0.00	331	17	16	8.0	6.1	25	22	15.0	309	36.7%

※令和4年度までは4%、令和5年度以降は1%を適用

様式－5

費用対便益（残事業：残事業費+10%）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益		残存価 値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価 値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H 1 5 ～ R 1 4 年）	H 15	-23	2.465	1.420													
	H 16	-22	2.370	1.414													
	H 17	-21	2.279	1.407													
	H 18	-20	2.191	1.391													
	H 19	-19	2.107	1.369													
	H 20	-18	2.026	1.330													
	H 21	-17	1.948	1.373													
	H 22	-16	1.873	1.371													
	H 23	-15	1.801	1.336													
	H 24	-14	1.732	1.338													
	H 25	-13	1.665	1.314													
	H 26	-12	1.601	1.271													
	H 27	-11	1.539	1.267													
	H 28	-10	1.480	1.258													
	H 29	-9	1.423	1.230													
	H 30	-8	1.369	1.189													
	R 1	-7	1.316	1.163													
	R 2	-6	1.265	1.164													
	R 3	-5	1.217	1.129													
	R 4	-4	1.170	1.083													
	R 5	-3	1.125	1.050													
	R 6	-2	1.082	1.000													
	R 7	-1	1.040	1.000													
	R 8	0	1.000	1.000													
R 9	1	0.962	1.000					6.1	5.9			6.1	5.9				
R 10	2	0.925	1.000					6.1	5.6			6.1	5.6				
R 11	3	0.889	1.000					6.1	5.4			6.1	5.4				
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.855	1.000	8.7	7.4				0.16	0.14	0.16	0.14				
	R 13	5	0.822	1.000	8.7	7.2				0.16	0.13	0.16	0.13				
	R 14	6	0.790	1.000	8.7	6.9				0.16	0.13	0.16	0.13				
	R 15	7	0.760	1.000	8.7	6.6				0.16	0.12	0.16	0.12				
	R 16	8	0.731	1.000	8.7	6.4				0.16	0.12	0.16	0.12				
	R 17	9	0.703	1.000	8.7	6.1				0.16	0.11	0.16	0.11				
	R 18	10	0.676	1.000	8.7	5.9				0.16	0.11	0.16	0.11				
	R 19	11	0.650	1.000	8.7	5.7				0.16	0.10	0.16	0.10				
	R 20	12	0.625	1.000	8.7	5.4				0.16	0.10	0.16	0.10				
	R 21	13	0.601	1.000	8.7	5.2				0.16	0.10	0.16	0.10				
	R 22	14	0.577	1.000	8.7	5.0				0.16	0.09	0.16	0.09				
	R 23	15	0.555	1.000	8.7	4.8				0.16	0.09	0.16	0.09				
	R 24	16	0.534	1.000	8.7	4.6				0.16	0.09	0.16	0.09				
	R 25	17	0.513	1.000	8.7	4.5				0.16	0.08	0.16	0.08				
	R 26	18	0.494	1.000	8.7	4.3				0.16	0.08	0.16	0.08				
	R 27	19	0.475	1.000	8.7	4.1				0.16	0.08	0.16	0.08				
	R 28	20	0.456	1.000	8.7	4.0				0.16	0.07	0.16	0.07				
	R 29	21	0.439	1.000	8.7	3.8				0.16	0.07	0.16	0.07				
	R 30	22	0.422	1.000	8.7	3.7				0.16	0.07	0.16	0.07				
	R 31	23	0.406	1.000	8.7	3.5				0.16	0.06	0.16	0.06				
	R 32	24	0.390	1.000	8.7	3.4				0.16	0.06	0.16	0.06				
	R 33	25	0.375	1.000	8.7	3.3				0.16	0.06	0.16	0.06				
	R 34	26	0.361	1.000	8.7	3.1				0.16	0.06	0.16	0.06				
	R 35	27	0.347	1.000	8.7	3.0				0.16	0.06	0.16	0.06				
	R 36	28	0.333	1.000	8.7	2.9				0.16	0.05	0.16	0.05				
	R 37	29	0.321	1.000	8.7	2.8				0.16	0.05	0.16	0.05				
	R 38	30	0.308	1.000	8.7	2.7				0.16	0.05	0.16	0.05				
	R 39	31	0.296	1.000	8.7	2.6				0.16	0.05	0.16	0.05				
	R 40	32	0.285	1.000	8.7	2.5				0.16	0.05	0.16	0.05				
	R 41	33	0.274	1.000	8.7	2.4				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 42	34	0.264	1.000	8.7	2.3				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 43	35	0.253	1.000	8.7	2.2				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 44	36	0.244	1.000	8.7	2.1				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 45	37	0.234	1.000	8.7	2.0				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 46	38	0.225	1.000	8.7	2.0				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 47	39	0.217	1.000	8.7	1.9				0.16	0.03	0.16	0.03				
	R 48	40	0.208	1.000	8.7	1.8				0.16	0.03	0.16	0.03				
	R 49	41	0.200	1.000	8.7	1.7				0.16	0.03	0.16	0.03				
	R 50	42	0.193	1.000	8.7	1.7				0.16	0.03	0.16	0.03				
	R 51	43	0.185	1.000	8.7	1.6				0.16	0.03	0.16	0.03				
	R 52	44	0.178	1.000	8.7	1.5				0.16	0.03	0.16	0.03				
R 53	45	0.171	1.000	8.7	1.5				0.16	0.03	0.16	0.03					
R 54	46	0.165	1.000	8.7	1.4				0.16	0.03	0.16	0.03					
R 55	47	0.158	1.000	8.7	1.4				0.16	0.03	0.16	0.03					
R 56	48	0.152	1.000	8.7	1.3				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 57	49	0.146	1.000	8.7	1.3				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 58	50	0.141	1.000	8.7	1.2				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 59	51	0.135	1.000	8.7	1.2				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 60	52	0.130	1.000	8.7	1.1				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 61	53	0.125	1.000	8.7	1.1				0.16	0.02	0.16	0.02					
合 計					435	166	0.00	166	18	17	8.0	3.1	26	20	8.3	146	33.9%

様式－5

費用対便益（残事業：残事業費-10%）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）			費 用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益		残存価 値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価 値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H 15～R 11年）	H 15	-23	2.465	1.420													
	H 16	-22	2.370	1.414													
	H 17	-21	2.279	1.407													
	H 18	-20	2.191	1.391													
	H 19	-19	2.107	1.369													
	H 20	-18	2.026	1.330													
	H 21	-17	1.948	1.373													
	H 22	-16	1.873	1.371													
	H 23	-15	1.801	1.336													
	H 24	-14	1.732	1.338													
	H 25	-13	1.665	1.314													
	H 26	-12	1.601	1.271													
	H 27	-11	1.539	1.267													
	H 28	-10	1.480	1.258													
	H 29	-9	1.423	1.230													
	H 30	-8	1.369	1.189													
	R 1	-7	1.316	1.163													
	R 2	-6	1.265	1.164													
	R 3	-5	1.217	1.129													
	R 4	-4	1.170	1.083													
	R 5	-3	1.125	1.050													
	R 6	-2	1.082	1.000													
	R 7	-1	1.040	1.000													
	R 8	0	1.000	1.000													
R 9	1	0.962	1.000					5.0	4.8			5.0	4.8				
R 10	2	0.925	1.000					5.0	4.6			5.0	4.6				
R 11	3	0.889	1.000					5.0	4.4			5.0	4.4				
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.855	1.000	8.7	7.4				0.16	0.14	0.16	0.14				
	R 13	5	0.822	1.000	8.7	7.2				0.16	0.13	0.16	0.13				
	R 14	6	0.790	1.000	8.7	6.9				0.16	0.13	0.16	0.13				
	R 15	7	0.760	1.000	8.7	6.6				0.16	0.12	0.16	0.12				
	R 16	8	0.731	1.000	8.7	6.4				0.16	0.12	0.16	0.12				
	R 17	9	0.703	1.000	8.7	6.1				0.16	0.11	0.16	0.11				
	R 18	10	0.676	1.000	8.7	5.9				0.16	0.11	0.16	0.11				
	R 19	11	0.650	1.000	8.7	5.7				0.16	0.10	0.16	0.10				
	R 20	12	0.625	1.000	8.7	5.4				0.16	0.10	0.16	0.10				
	R 21	13	0.601	1.000	8.7	5.2				0.16	0.10	0.16	0.10				
	R 22	14	0.577	1.000	8.7	5.0				0.16	0.09	0.16	0.09				
	R 23	15	0.555	1.000	8.7	4.8				0.16	0.09	0.16	0.09				
	R 24	16	0.534	1.000	8.7	4.6				0.16	0.09	0.16	0.09				
	R 25	17	0.513	1.000	8.7	4.5				0.16	0.08	0.16	0.08				
	R 26	18	0.494	1.000	8.7	4.3				0.16	0.08	0.16	0.08				
	R 27	19	0.475	1.000	8.7	4.1				0.16	0.08	0.16	0.08				
	R 28	20	0.456	1.000	8.7	4.0				0.16	0.07	0.16	0.07				
	R 29	21	0.439	1.000	8.7	3.8				0.16	0.07	0.16	0.07				
	R 30	22	0.422	1.000	8.7	3.7				0.16	0.07	0.16	0.07				
	R 31	23	0.406	1.000	8.7	3.5				0.16	0.06	0.16	0.06				
	R 32	24	0.390	1.000	8.7	3.4				0.16	0.06	0.16	0.06				
	R 33	25	0.375	1.000	8.7	3.3				0.16	0.06	0.16	0.06				
	R 34	26	0.361	1.000	8.7	3.1				0.16	0.06	0.16	0.06				
	R 35	27	0.347	1.000	8.7	3.0				0.16	0.06	0.16	0.06				
	R 36	28	0.333	1.000	8.7	2.9				0.16	0.05	0.16	0.05				
	R 37	29	0.321	1.000	8.7	2.8				0.16	0.05	0.16	0.05				
	R 38	30	0.308	1.000	8.7	2.7				0.16	0.05	0.16	0.05				
	R 39	31	0.296	1.000	8.7	2.6				0.16	0.05	0.16	0.05				
	R 40	32	0.285	1.000	8.7	2.5				0.16	0.05	0.16	0.05				
	R 41	33	0.274	1.000	8.7	2.4				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 42	34	0.264	1.000	8.7	2.3				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 43	35	0.253	1.000	8.7	2.2				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 44	36	0.244	1.000	8.7	2.1				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 45	37	0.234	1.000	8.7	2.0				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 46	38	0.225	1.000	8.7	2.0				0.16	0.04	0.16	0.04				
	R 47	39	0.217	1.000	8.7	1.9				0.16	0.03	0.16	0.03				
	R 48	40	0.208	1.000	8.7	1.8				0.16	0.03	0.16	0.03				
	R 49	41	0.200	1.000	8.7	1.7				0.16	0.03	0.16	0.03				
	R 50	42	0.193	1.000	8.7	1.7				0.16	0.03	0.16	0.03				
	R 51	43	0.185	1.000	8.7	1.6				0.16	0.03	0.16	0.03				
R 52	44	0.178	1.000	8.7	1.5				0.16	0.03	0.16	0.03					
R 53	45	0.171	1.000	8.7	1.5				0.16	0.03	0.16	0.03					
R 54	46	0.165	1.000	8.7	1.4				0.16	0.03	0.16	0.03					
R 55	47	0.158	1.000	8.7	1.4				0.16	0.03	0.16	0.03					
R 56	48	0.152	1.000	8.7	1.3				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 57	49	0.146	1.000	8.7	1.3				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 58	50	0.141	1.000	8.7	1.2				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 59	51	0.135	1.000	8.7	1.2				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 60	52	0.130	1.000	8.7	1.1				0.16	0.02	0.16	0.02					
R 61	53	0.125	1.000	8.7	1.1				0.16	0.02	0.16	0.02					
合 計					435	166	0.00	166	15	14	8.0	3.1	23	17	9.8	149	39.4%

様式－５

費用対便益（残事業：資産+10%）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益		残存価 値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価 値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H15～R11年）	H 15	-23	2.465	1.420													
	H 16	-22	2.370	1.414													
	H 17	-21	2.279	1.407													
	H 18	-20	2.191	1.391													
	H 19	-19	2.107	1.369													
	H 20	-18	2.026	1.330													
	H 21	-17	1.948	1.373													
	H 22	-16	1.873	1.371													
	H 23	-15	1.801	1.336													
	H 24	-14	1.732	1.338													
	H 25	-13	1.665	1.314													
	H 26	-12	1.601	1.271													
	H 27	-11	1.539	1.267													
	H 28	-10	1.480	1.258													
	H 29	-9	1.423	1.230													
	H 30	-8	1.369	1.189													
	R 1	-7	1.316	1.163													
	R 2	-6	1.265	1.164													
	R 3	-5	1.217	1.129													
	R 4	-4	1.170	1.083													
	R 5	-3	1.125	1.050													
	R 6	-2	1.082	1.000													
	R 7	-1	1.040	1.000													
	R 8	0	1.000	1.000													
	R 9	1	0.962	1.000					5.5	5.3			5.5	5.3			
	R 10	2	0.925	1.000					5.5	5.1			5.5	5.1			
	R 11	3	0.889	1.000					5.5	4.9			5.5	4.9			
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.855	1.000	9.6	8.2					0.16	0.14	0.16	0.14			
	R 13	5	0.822	1.000	9.6	7.9					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 14	6	0.790	1.000	9.6	7.6					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 15	7	0.760	1.000	9.6	7.3					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 16	8	0.731	1.000	9.6	7.0					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 17	9	0.703	1.000	9.6	6.7					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 18	10	0.676	1.000	9.6	6.5					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 19	11	0.650	1.000	9.6	6.2					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 20	12	0.625	1.000	9.6	6.0					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 21	13	0.601	1.000	9.6	5.8					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 22	14	0.577	1.000	9.6	5.5					0.16	0.09	0.16	0.09			
	R 23	15	0.555	1.000	9.6	5.3					0.16	0.09	0.16	0.09			
	R 24	16	0.534	1.000	9.6	5.1					0.16	0.09	0.16	0.09			
	R 25	17	0.513	1.000	9.6	4.9					0.16	0.08	0.16	0.08			
	R 26	18	0.494	1.000	9.6	4.7					0.16	0.08	0.16	0.08			
	R 27	19	0.475	1.000	9.6	4.6					0.16	0.08	0.16	0.08			
	R 28	20	0.456	1.000	9.6	4.4					0.16	0.07	0.16	0.07			
	R 29	21	0.439	1.000	9.6	4.2					0.16	0.07	0.16	0.07			
	R 30	22	0.422	1.000	9.6	4.1					0.16	0.07	0.16	0.07			
	R 31	23	0.406	1.000	9.6	3.9					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 32	24	0.390	1.000	9.6	3.7					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 33	25	0.375	1.000	9.6	3.6					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 34	26	0.361	1.000	9.6	3.5					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 35	27	0.347	1.000	9.6	3.3					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 36	28	0.333	1.000	9.6	3.2					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 37	29	0.321	1.000	9.6	3.1					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 38	30	0.308	1.000	9.6	3.0					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 39	31	0.296	1.000	9.6	2.8					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 40	32	0.285	1.000	9.6	2.7					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 41	33	0.274	1.000	9.6	2.6					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 42	34	0.264	1.000	9.6	2.5					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 43	35	0.253	1.000	9.6	2.4					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 44	36	0.244	1.000	9.6	2.3					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 45	37	0.234	1.000	9.6	2.2					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 46	38	0.225	1.000	9.6	2.2					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 47	39	0.217	1.000	9.6	2.1					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 48	40	0.208	1.000	9.6	2.0					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 49	41	0.200	1.000	9.6	1.9					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 50	42	0.193	1.000	9.6	1.8					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 51	43	0.185	1.000	9.6	1.8					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 52	44	0.178	1.000	9.6	1.7					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 53	45	0.171	1.000	9.6	1.6					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 54	46	0.165	1.000	9.6	1.6					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 55	47	0.158	1.000	9.6	1.5					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 56	48	0.152	1.000	9.6	1.5					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 57	49	0.146	1.000	9.6	1.4					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 58	50	0.141	1.000	9.6	1.4					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 59	51	0.135	1.000	9.6	1.3					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 60	52	0.130	1.000	9.6	1.2					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 61	53	0.125	1.000	9.6	1.2					0.16	0.02	0.16	0.02			
合 計					480	183	0.00	183	17	15	8.0	3.1	25	18	10.2	165	39.5%

様式－5

費用対便益（残事業：資産-10%）

水系名：富士川水系 河川名：富士川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）			費 用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価 値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便 益		残存価 値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便 益	現在価 値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
基準	R 8	0	1.000	1.000													
整備期間（H 15～R 11年）	H 15	-23	2.465	1.420													
	H 16	-22	2.370	1.414													
	H 17	-21	2.279	1.407													
	H 18	-20	2.191	1.391													
	H 19	-19	2.107	1.369													
	H 20	-18	2.026	1.330													
	H 21	-17	1.948	1.373													
	H 22	-16	1.873	1.371													
	H 23	-15	1.801	1.336													
	H 24	-14	1.732	1.338													
	H 25	-13	1.665	1.314													
	H 26	-12	1.601	1.271													
	H 27	-11	1.539	1.267													
	H 28	-10	1.480	1.258													
	H 29	-9	1.423	1.230													
	H 30	-8	1.369	1.189													
	R 1	-7	1.316	1.163													
	R 2	-6	1.265	1.164													
	R 3	-5	1.217	1.129													
	R 4	-4	1.170	1.083													
	R 5	-3	1.125	1.050													
	R 6	-2	1.082	1.000													
	R 7	-1	1.040	1.000													
	R 8	0	1.000	1.000													
	R 9	1	0.962	1.000					5.5	5.3			5.5	5.3			
	R 10	2	0.925	1.000					5.5	5.1			5.5	5.1			
	R 11	3	0.889	1.000					5.5	4.9			5.5	4.9			
施設完成後の評価期間（50年）	R 12	4	0.855	1.000	7.8	6.7					0.16	0.14	0.16	0.14			
	R 13	5	0.822	1.000	7.8	6.4					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 14	6	0.790	1.000	7.8	6.2					0.16	0.13	0.16	0.13			
	R 15	7	0.760	1.000	7.8	5.9					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 16	8	0.731	1.000	7.8	5.7					0.16	0.12	0.16	0.12			
	R 17	9	0.703	1.000	7.8	5.5					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 18	10	0.676	1.000	7.8	5.3					0.16	0.11	0.16	0.11			
	R 19	11	0.650	1.000	7.8	5.1					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 20	12	0.625	1.000	7.8	4.9					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 21	13	0.601	1.000	7.8	4.7					0.16	0.10	0.16	0.10			
	R 22	14	0.577	1.000	7.8	4.5					0.16	0.09	0.16	0.09			
	R 23	15	0.555	1.000	7.8	4.3					0.16	0.09	0.16	0.09			
	R 24	16	0.534	1.000	7.8	4.2					0.16	0.09	0.16	0.09			
	R 25	17	0.513	1.000	7.8	4.0					0.16	0.08	0.16	0.08			
	R 26	18	0.494	1.000	7.8	3.9					0.16	0.08	0.16	0.08			
	R 27	19	0.475	1.000	7.8	3.7					0.16	0.08	0.16	0.08			
	R 28	20	0.456	1.000	7.8	3.6					0.16	0.07	0.16	0.07			
	R 29	21	0.439	1.000	7.8	3.4					0.16	0.07	0.16	0.07			
	R 30	22	0.422	1.000	7.8	3.3					0.16	0.07	0.16	0.07			
	R 31	23	0.406	1.000	7.8	3.2					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 32	24	0.390	1.000	7.8	3.0					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 33	25	0.375	1.000	7.8	2.9					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 34	26	0.361	1.000	7.8	2.8					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 35	27	0.347	1.000	7.8	2.7					0.16	0.06	0.16	0.06			
	R 36	28	0.333	1.000	7.8	2.6					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 37	29	0.321	1.000	7.8	2.5					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 38	30	0.308	1.000	7.8	2.4					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 39	31	0.296	1.000	7.8	2.3					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 40	32	0.285	1.000	7.8	2.2					0.16	0.05	0.16	0.05			
	R 41	33	0.274	1.000	7.8	2.1					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 42	34	0.264	1.000	7.8	2.1					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 43	35	0.253	1.000	7.8	2.0					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 44	36	0.244	1.000	7.8	1.9					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 45	37	0.234	1.000	7.8	1.8					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 46	38	0.225	1.000	7.8	1.8					0.16	0.04	0.16	0.04			
	R 47	39	0.217	1.000	7.8	1.7					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 48	40	0.208	1.000	7.8	1.6					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 49	41	0.200	1.000	7.8	1.6					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 50	42	0.193	1.000	7.8	1.5					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 51	43	0.185	1.000	7.8	1.4					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 52	44	0.178	1.000	7.8	1.4					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 53	45	0.171	1.000	7.8	1.3					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 54	46	0.165	1.000	7.8	1.3					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 55	47	0.158	1.000	7.8	1.2					0.16	0.03	0.16	0.03			
	R 56	48	0.152	1.000	7.8	1.2					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 57	49	0.146	1.000	7.8	1.1					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 58	50	0.141	1.000	7.8	1.1					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 59	51	0.135	1.000	7.8	1.1					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 60	52	0.130	1.000	7.8	1.0					0.16	0.02	0.16	0.02			
	R 61	53	0.125	1.000	7.8	1.0					0.16	0.02	0.16	0.02			
合 計					390	149	0.00	149	17	15	8.0	3.1	25	18	8.3	131	33.7%
