


応急復旧工事の進捗状況について


平成 27 年 9 月 17 日 15 時現在

- 9 月 17 日 15 時現在で法覆工を実施中。引き続き、法覆工および締切工を 24 時間体制で施工予定。
- 進捗率 (9 月 17 日 15 時現在)
  - 退避場・作業ヤード造成 完了 (9 月 10 日着手～9 月 11 日完了)
  - 荒締切工 84.1% (9 月 11 日着手)  
※着手より荒締切工までを 1 週間程度で完了予定
  - 鋼矢板による締切工 0.0% (未着手)  
※荒締切工完了より 1 週間程度で完了予定

概略図

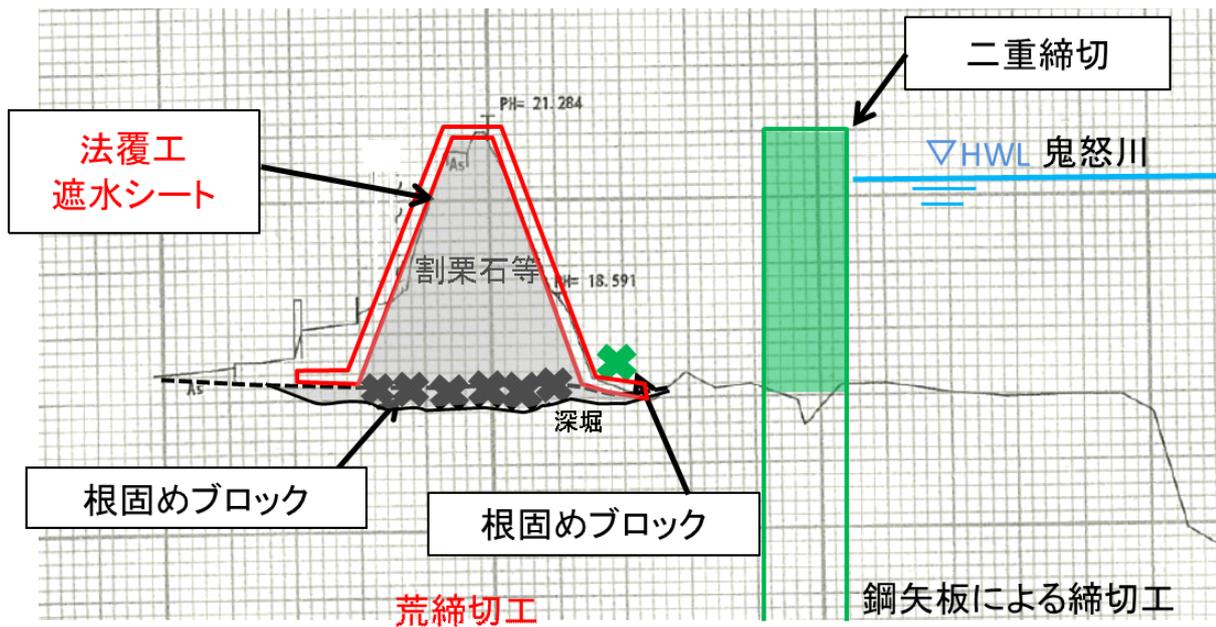

応急復旧工事実施状況（9月17日 13時頃）

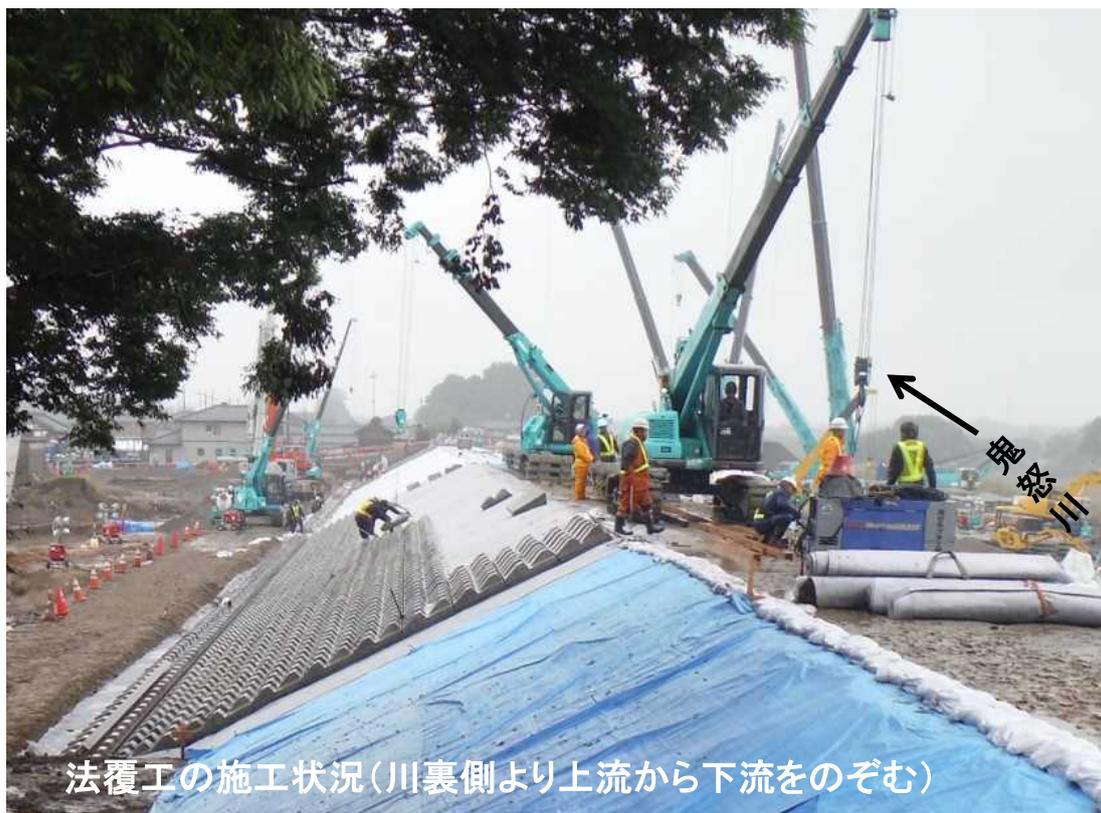

応急復旧工事実施状況（9月17日 13時頃）

