


応急復旧工事の進捗状況について

平成27年9月18日15時現在

- 決壊した堤防については、24時間体制で応急復旧工事を実施。
16日に、仮堤防が完成。
- 現在、護岸や矢板による補強工事を進めており、来週中に応急復旧を全て完了する予定。
- 進捗率（9月18日 15時現在）
 - 退避場・作業ヤード造成 完了（9月10日着手～9月11日完了）
 - 荒締切工 95.4%（9月11日着手）
※16日に仮堤防が完成
 - 鋼矢板による締切工 0.0%（未着手）
※荒締切工完了より1週間程度で完了予定

概略図

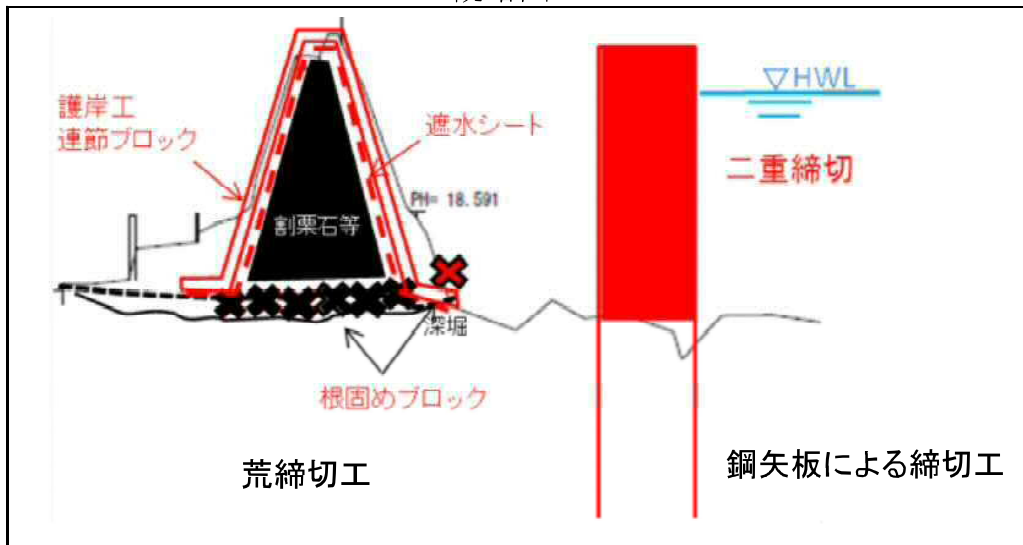

応急復旧工事実施状況（9月18日 13時30分頃）

