

令和2年4月24日（金）
国土交通省関東地方整備局
群馬県 馬恋 村

記者発表資料

つまごいむら あがつまがわ 嬬恋村（吾妻川・国道144号）復旧連絡調整会議（第3回）の 開催結果について

なりいわはし
～出水期を控え、仮河道の整備など安全安心の確保を進めます。
鳴岩橋の仮橋迂回路が完成予定！5月8日午前10時に交通切り替え～

あがつまぐん つまごいむら おおざさ
令和元年東日本台風により群馬県吾妻郡嬬恋村大笹地先において発生した被害
の早期の復旧にあたっては、関係機関が緊密な連携を図りながら推進しています。

本日、『嬬恋村（吾妻川・国道144号）復旧連絡調整会議（第3回）』を持ち回りにて
開催し、各事業者から復旧工事の状況の報告、出水期における安全安心の確保と
役割分担について確認しました。また、引き続き、協力しながら早期に円滑に復旧事
業を進めていくことを確認しました。

<会議結果の要旨>

- ながいがわら
・長井川原地区周辺の保全を図るため、床固工等の早期完成に向けて、工事を進
めています。
- ・鳴岩橋の仮橋迂回路が完成するため、5月8日（金）午前10時に緊急迂回路から
仮橋迂回路へ交通を切り替えます。引き続き、緊急迂回路を早期に撤去し、出水
期における安定した川の流れの確保及び道路（仮橋迂回路）の保全を図るため、
群馬県と共に仮河道の整備を進めます。
- ・群馬県は復旧工事を進める他、出水期における大笹地区（仮橋周辺）の安定した
川の流れを確保するため、仮河道の整備を進めます。また、緊急迂回路に用いた
盛土材※を再利用し、工事期間の短縮を図ります。

※：早期完成を図るため、現地で入手困難であった盛土用土砂に代えて、台風により現地周辺に流れついた巨石を
砕きネット状の袋材に詰めたもの

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、刀水クラブ・テレビ記者会、高崎記者クラブ

問い合わせ先

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 副所長 宮崎 勝巳（みやざきかつみ）
（連絡先）0279-22-4177
高崎河川国道事務所 副所長 山崎 茂（やまざきしげる）
（連絡先）027-345-6000
群馬県 県土整備部 河川課 水害対策室長 平形 淳一（ひらかたじゅんいち）
（連絡先）027-226-3621
道路管理課 次長 菅谷 勝則（すがやかつのり）
（連絡先）027-226-3592
嬬恋村役場 建設課 課長 滝沢 勇司（たきざわゆうじ）
（連絡先）0279-96-0511

孺恋村(吾妻川・国道144号)復旧連絡調整会議 構成員

所 属		氏 名
国土交通省関東地方整備局	河川部 総合土砂管理官	笠原 治夫
	道路部 道路計画管理官	伏見 利行
	利根川水系砂防事務所 副所長	宮崎 勝巳
	利根川水系砂防事務所 長野原出張所長	堺野 武志
	高崎河川国道事務所 副所長	山崎 茂
群馬県 県土整備部	高崎河川国道事務所 孺恋緊急道路防災出張所長	黒岩 誠
	道路管理課 次長	菅谷 勝則
	河川課 水害対策室長	平形 淳一
	砂防課 次長	総見 良二
	中之条土木事務所長	石井 和範
孺恋村	中之条土木事務所 三原事業所長	小池 尚樹
	建設課長	滝沢 勇司

長井川原地区における災害復旧工事の進捗状況について

利根川水系砂防事務所

被災後の1号床固工付近



災害復旧工事(施工中)



国道144号鳴岩橋 復旧工事状況(4/17時点) 高崎河川国道事務所


写真① 渡河部仮橋状況



写真② 仮橋施工状況



写真③ 終点側仮橋施工状況

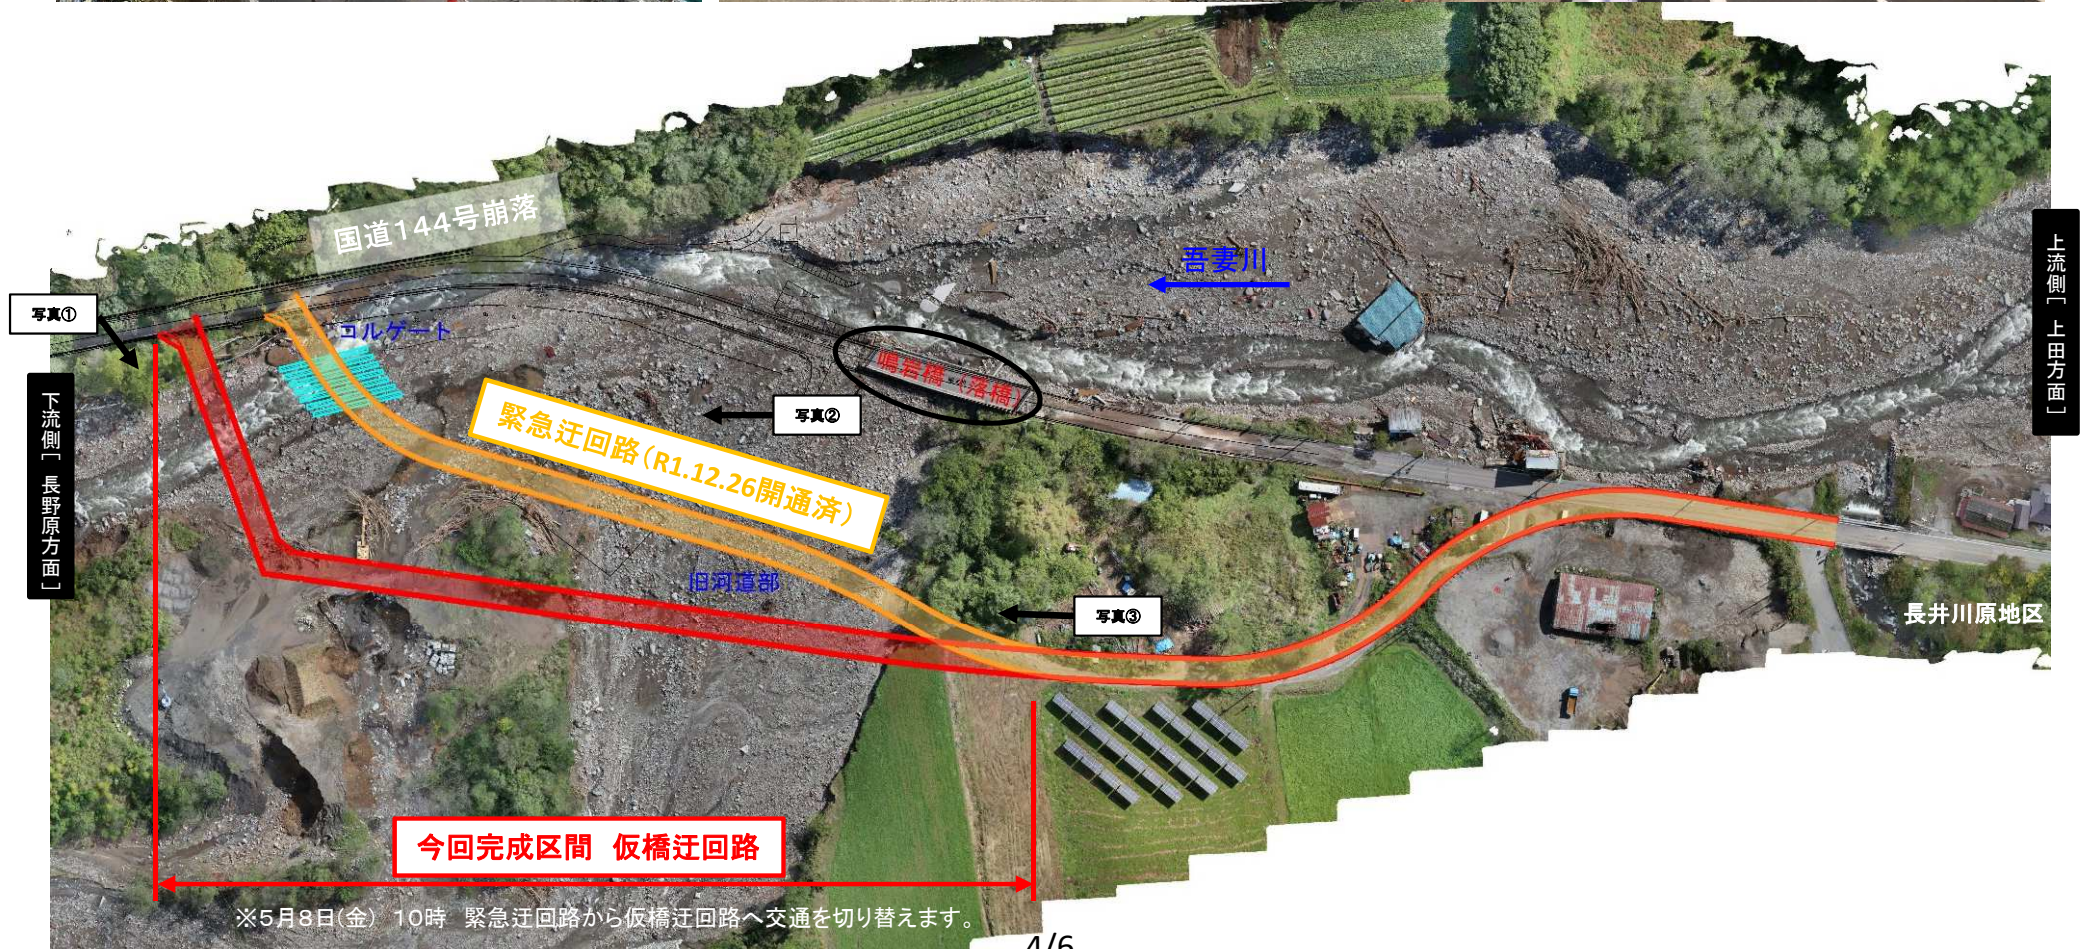


仮河道整備について

- ・群馬県は復旧工事を進める他、出水期における安定した川の流れを確保するため、仮河道の整備を推進。
- ・高崎河川国道は、出水期における安定した川の流れの確保を支援するとともに、道路(仮橋迂回路)の保全を図るため、仮河道の整備を推進。

また、緊急迂回路に用いた盛土材※を群馬県が施工する仮河道整備の護岸に再利用し、早期完成を支援します。

※：早期完成を図るため、現地で入手困難であった盛土用土砂に代えて、台風により現地周辺に流れついた巨石を砕きネット状の袋材に詰めたもの

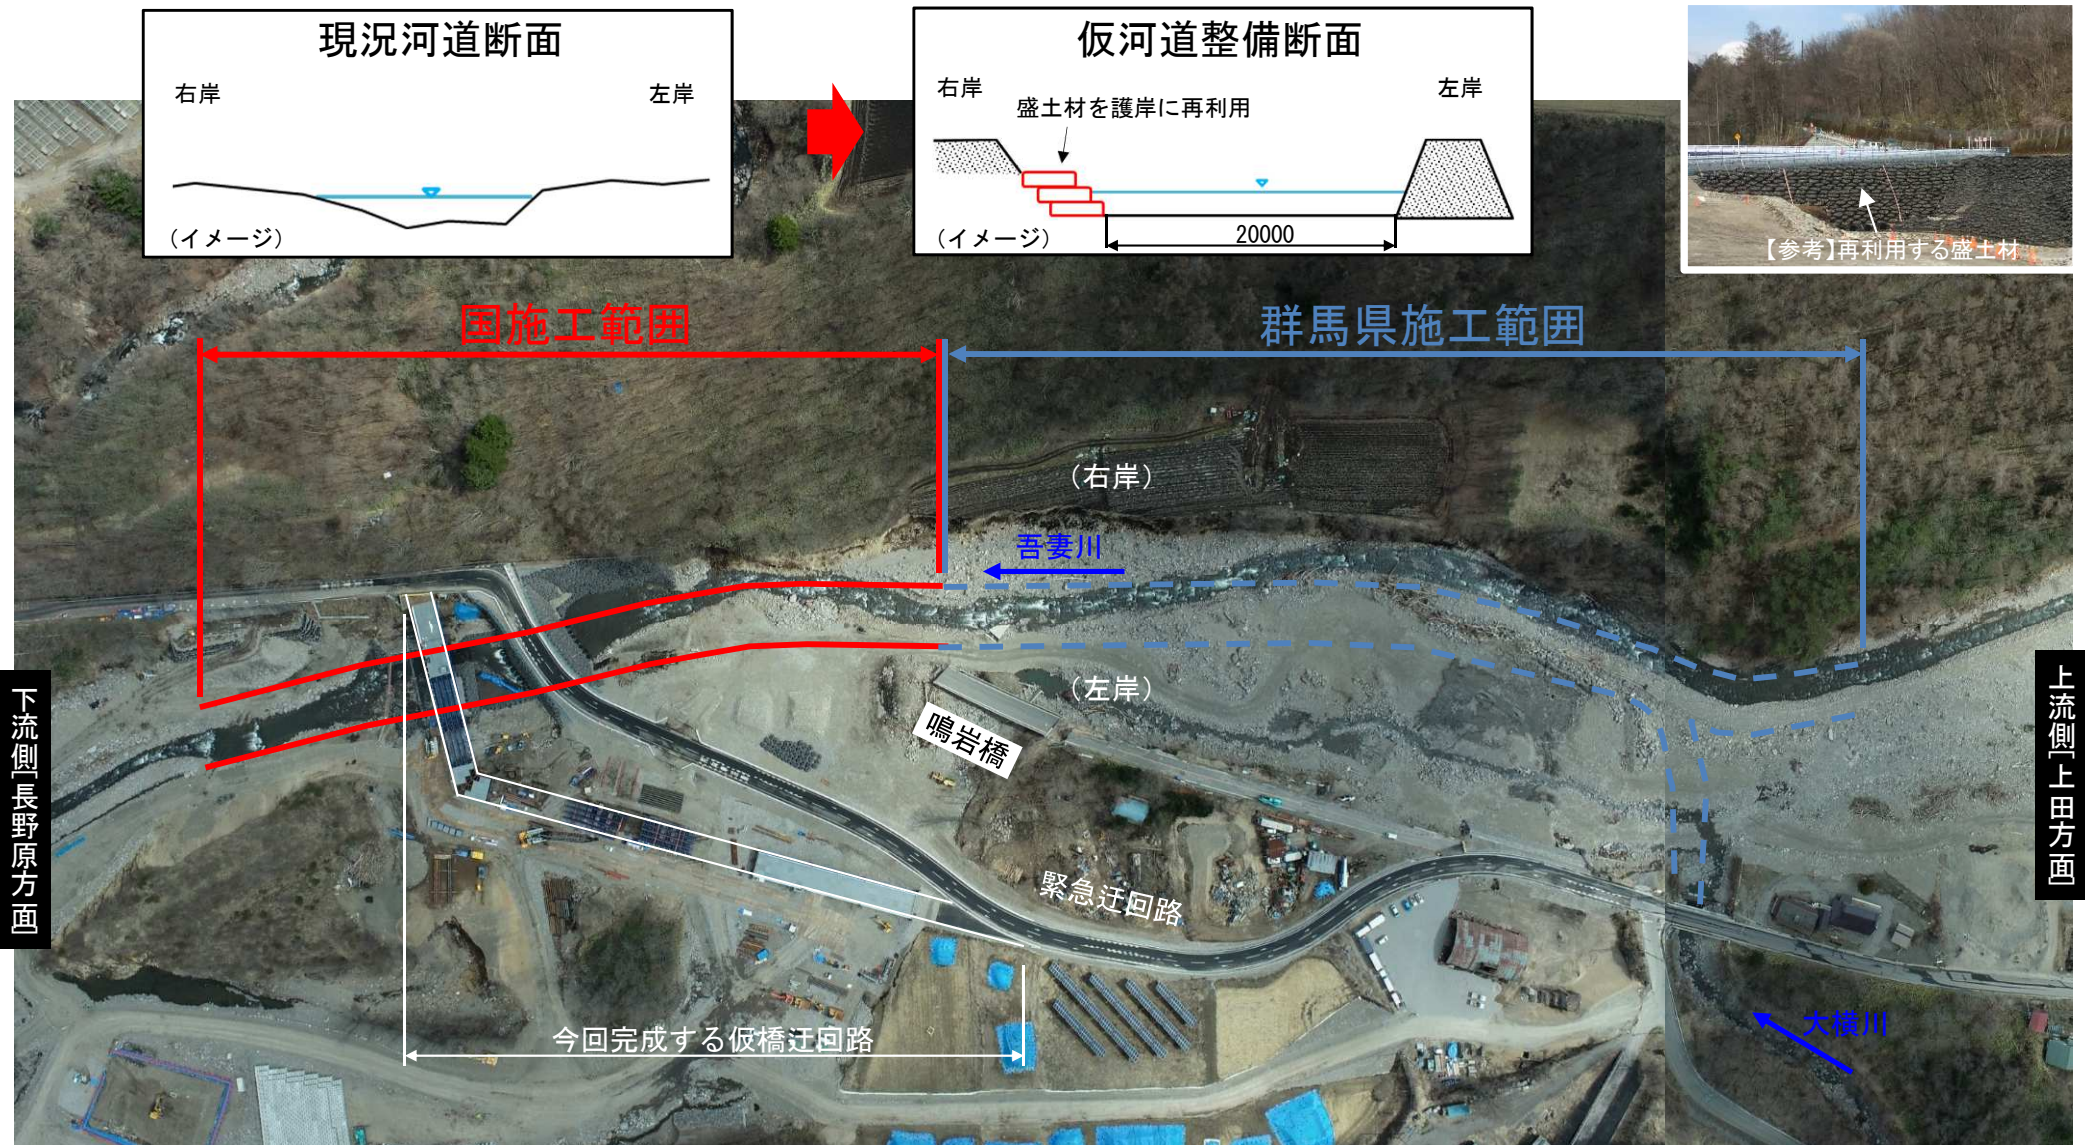

(国) 144号 (大笹～田代間) 道路災害復旧


群馬県 県土整備部
中之条土木事務所

○工事概要

工事名：道路災害復旧 令和元年災 第644号・第645号・第646号
河川災害復旧 令和元年災 第618号・第619号・第639号

工事場所：(国) 144号 吾妻郡嬭恋村大字大笹・田代地内(水管橋～毒水間)

○代表横断面図

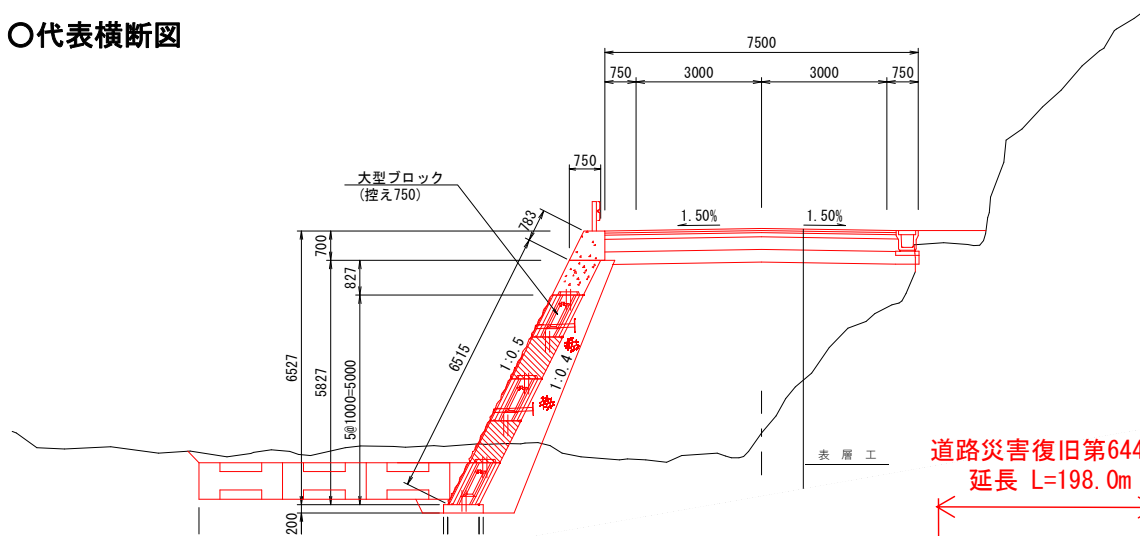

○主な工種

【道路災害復旧】
大型ブロック積工
コンクリート根継工
根固ブロック工
落石防護柵工
舗装復旧工

【河川災害復旧】
ブロック積工
帯工
根固ブロック工
河道掘削工



○工事概要図



○工事発注

【道路災害復旧】

第644号 工期：令和2年3月2日～令和3年3月15日

第645号 その1 工期：令和2年1月10日～10月20日

その2 工期：令和2年3月2日～令和3年3月15日

第646号 令和2年度発注予定

【河川災害復旧】

第639号 工期：令和2年3月27日～11月2日

単独応急対策工 工期：令和2年3月18日～10月28日

第618号 令和2年度発注予定

第619号 令和3年度発注予定

水替・工事用道路設置状況

