# 多摩川緊急治水対策プロジェクト 事業費・事業期間について

- ○令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した多摩川において、国、都、県、市区が連携し、「**多摩川緊急治水対策プロジェクト**」を進めています。
- ○事業着手後に発生した課題に対応するため約64億円の増額及び事業期間を1年延長して取り組んでいきます。
- 最新調査結果及び関係機関調整による構造変更 工法変更 など
- 事業期間延長: *新型コロナウイルス感染症拡大の影響*

# 東京都

### ■河川における対策

全体事業費 約255億円(+64億円)※

令和元年度~令和7年度(1年延長) 事業期間 令和元年東日本台風洪水における

本川からの越水防止 河道掘削、樹木伐採、

堰改築、堤防整備 等

※土砂運搬等の進捗により、必要に応じて他事業と

#### ■流域における対策

- (下水道事業等の整備促進)
- 流出抑制施設の整備等
- 既存施設(五反田川放水路(建設中))の活用による雨水貯留
- ・下水道樋管等のゲート自動化・遠隔操作化等
- ・移動式排水設備(排水ポンプ車等)の整備
- ・土のう等の備蓄資材の配備等

### ■ソフト施策

- 自治体との光ケーブル接続
- ・簡易型河川監視カメラの設置
- ・多機関連携型タイムラインの策定、運用
- ・講習会等によるマイ・タイムラインの普及促進
- 要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
- 自治体職員対象の排水ポンプ車運転講習会の実施等

### 【進捗状況】

a東京都世田谷区玉川地先



特殊堤区間整備状況(下流側)




連携して事業を実施



### ■事業費増の要因

地元住民及び関係機関との調整による構造変更 等




関係機関調整による構造変更(護岸追加及び取水施設の変更)



河道掘削の工法変更、土砂運搬等



(c) 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤地区 (多摩川27km付近)



(d) 東京都大田区南六郷地区 (多摩川5km付近)

c河道掘削



d 河道掘削



b東京都稲城市大丸地先






# 多摩川緊急治水対策プロジェクト 事業費変更の理由①

- (a) 堤防整備(世田谷区玉川地区)
- ・地元住民および関係機関との調整により、盛土による堤防から特殊堤防への構造変更による増
- ・張芝から護岸ブロックの設置への変更による増


など

# ◆策定時

・盛土による土堤整備を想定



### 平面図




現地状況(整備前)

フォトモンタージュ(整備後)

## ◆主な変更点


- ・地元住民及び関係機関との調整結果に基づき、 土堤からコンクリートの特殊堤防に変更
- ・張芝から護岸ブロック設置に変更 など



二子玉川築堤工事 工事全体平面図



フォトモンタージュ(整備後)



断面図(特殊堤)



断面図(法覆護岸工)


# 多摩川緊急治水対策プロジェクト 事業費変更の理由②

- **b** 大丸用水堰改築
- ・護岸及び取水施設(堤外水路等)の増
- ・ 魚類環境に配慮した仮締切の設置、水替えの増

など

# ◆策定時

・概略設計により設定

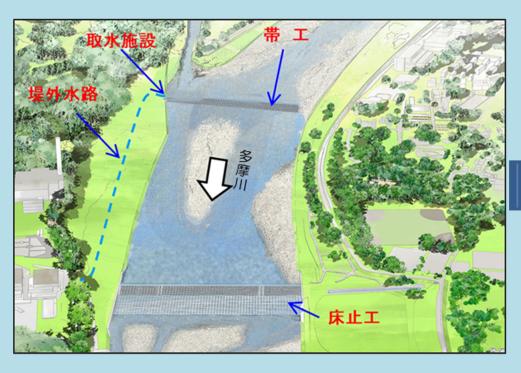


## ◆主な変更点

・詳細設計による護岸工の追加及び堤外水路 等の取水施設の構造変更



・施工時における、魚類環境に配慮した仮締切の設置、水替えの増工



# 多摩川緊急治水対策プロジェクト 事業費変更の理由③


- ©d 河道掘削
- ・陸上掘削から水上掘削(浚渫)への変更及び土運搬に伴う増
- ・アシ、ヨシ等の根茎除去の追加に伴う増

など



◆主な変更点 ⓒ 中流部:水上掘削への変更





付下流部:アシ・ヨシ等の根茎除去の追加





