


那珂川緊急治水対策プロジェクト～多重防御治水の推進～

- 令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した那珂川水系において、国、県、市町が連携し「那珂川緊急治水対策プロジェクト」を進めています。
- 事業着手後に発生した課題に対応するため約147億の増額及び事業期間を2年延長して取り組んでいきます。
- ⇒ 増額の要因：**地質調査結果による構造変更**、**土質調査結果による土質改良の増** など
- ⇒ 事業期間延長：**新型コロナウイルス感染拡大の影響**、**用地買収交渉に伴う家屋移転の対外調整**



完成工事箇所

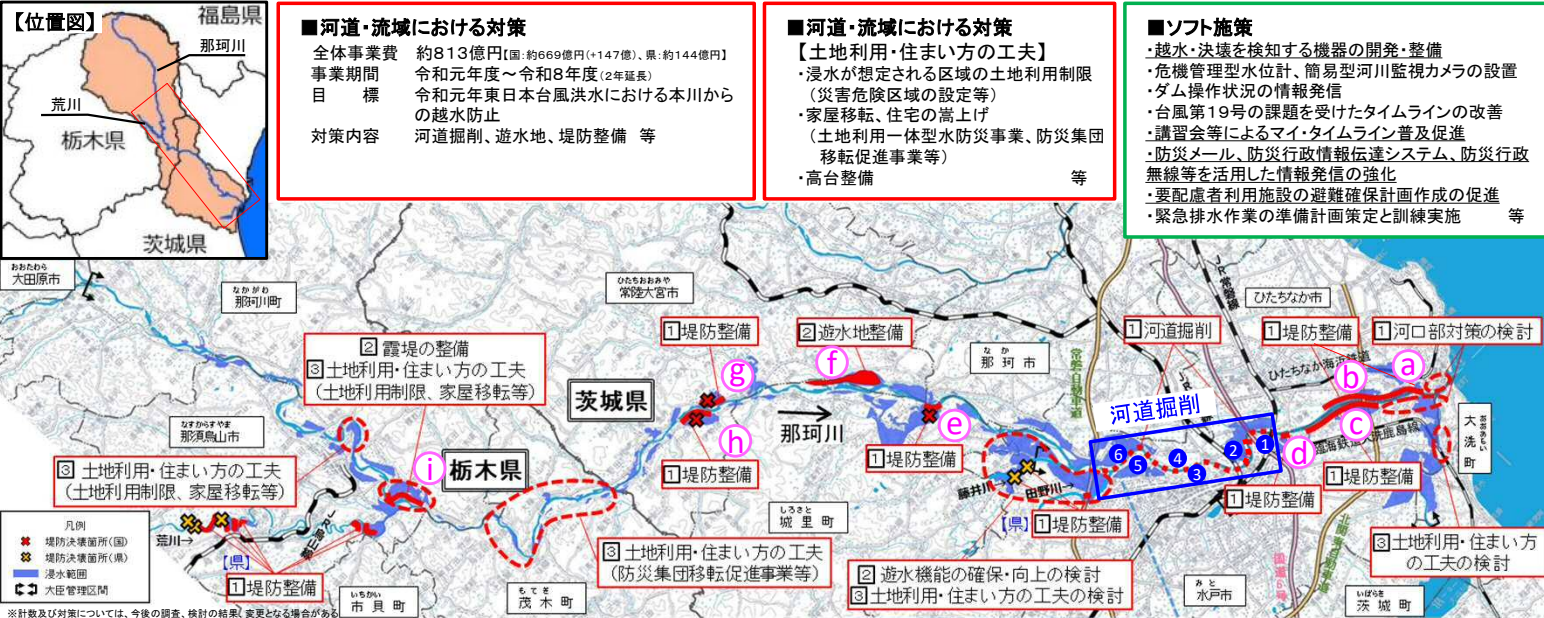

事業費増および事業期間延期の要因

