



多摩川緊急治水対策プロジェクト R5年度河道掘削実施箇所位置図

資料4-1-2

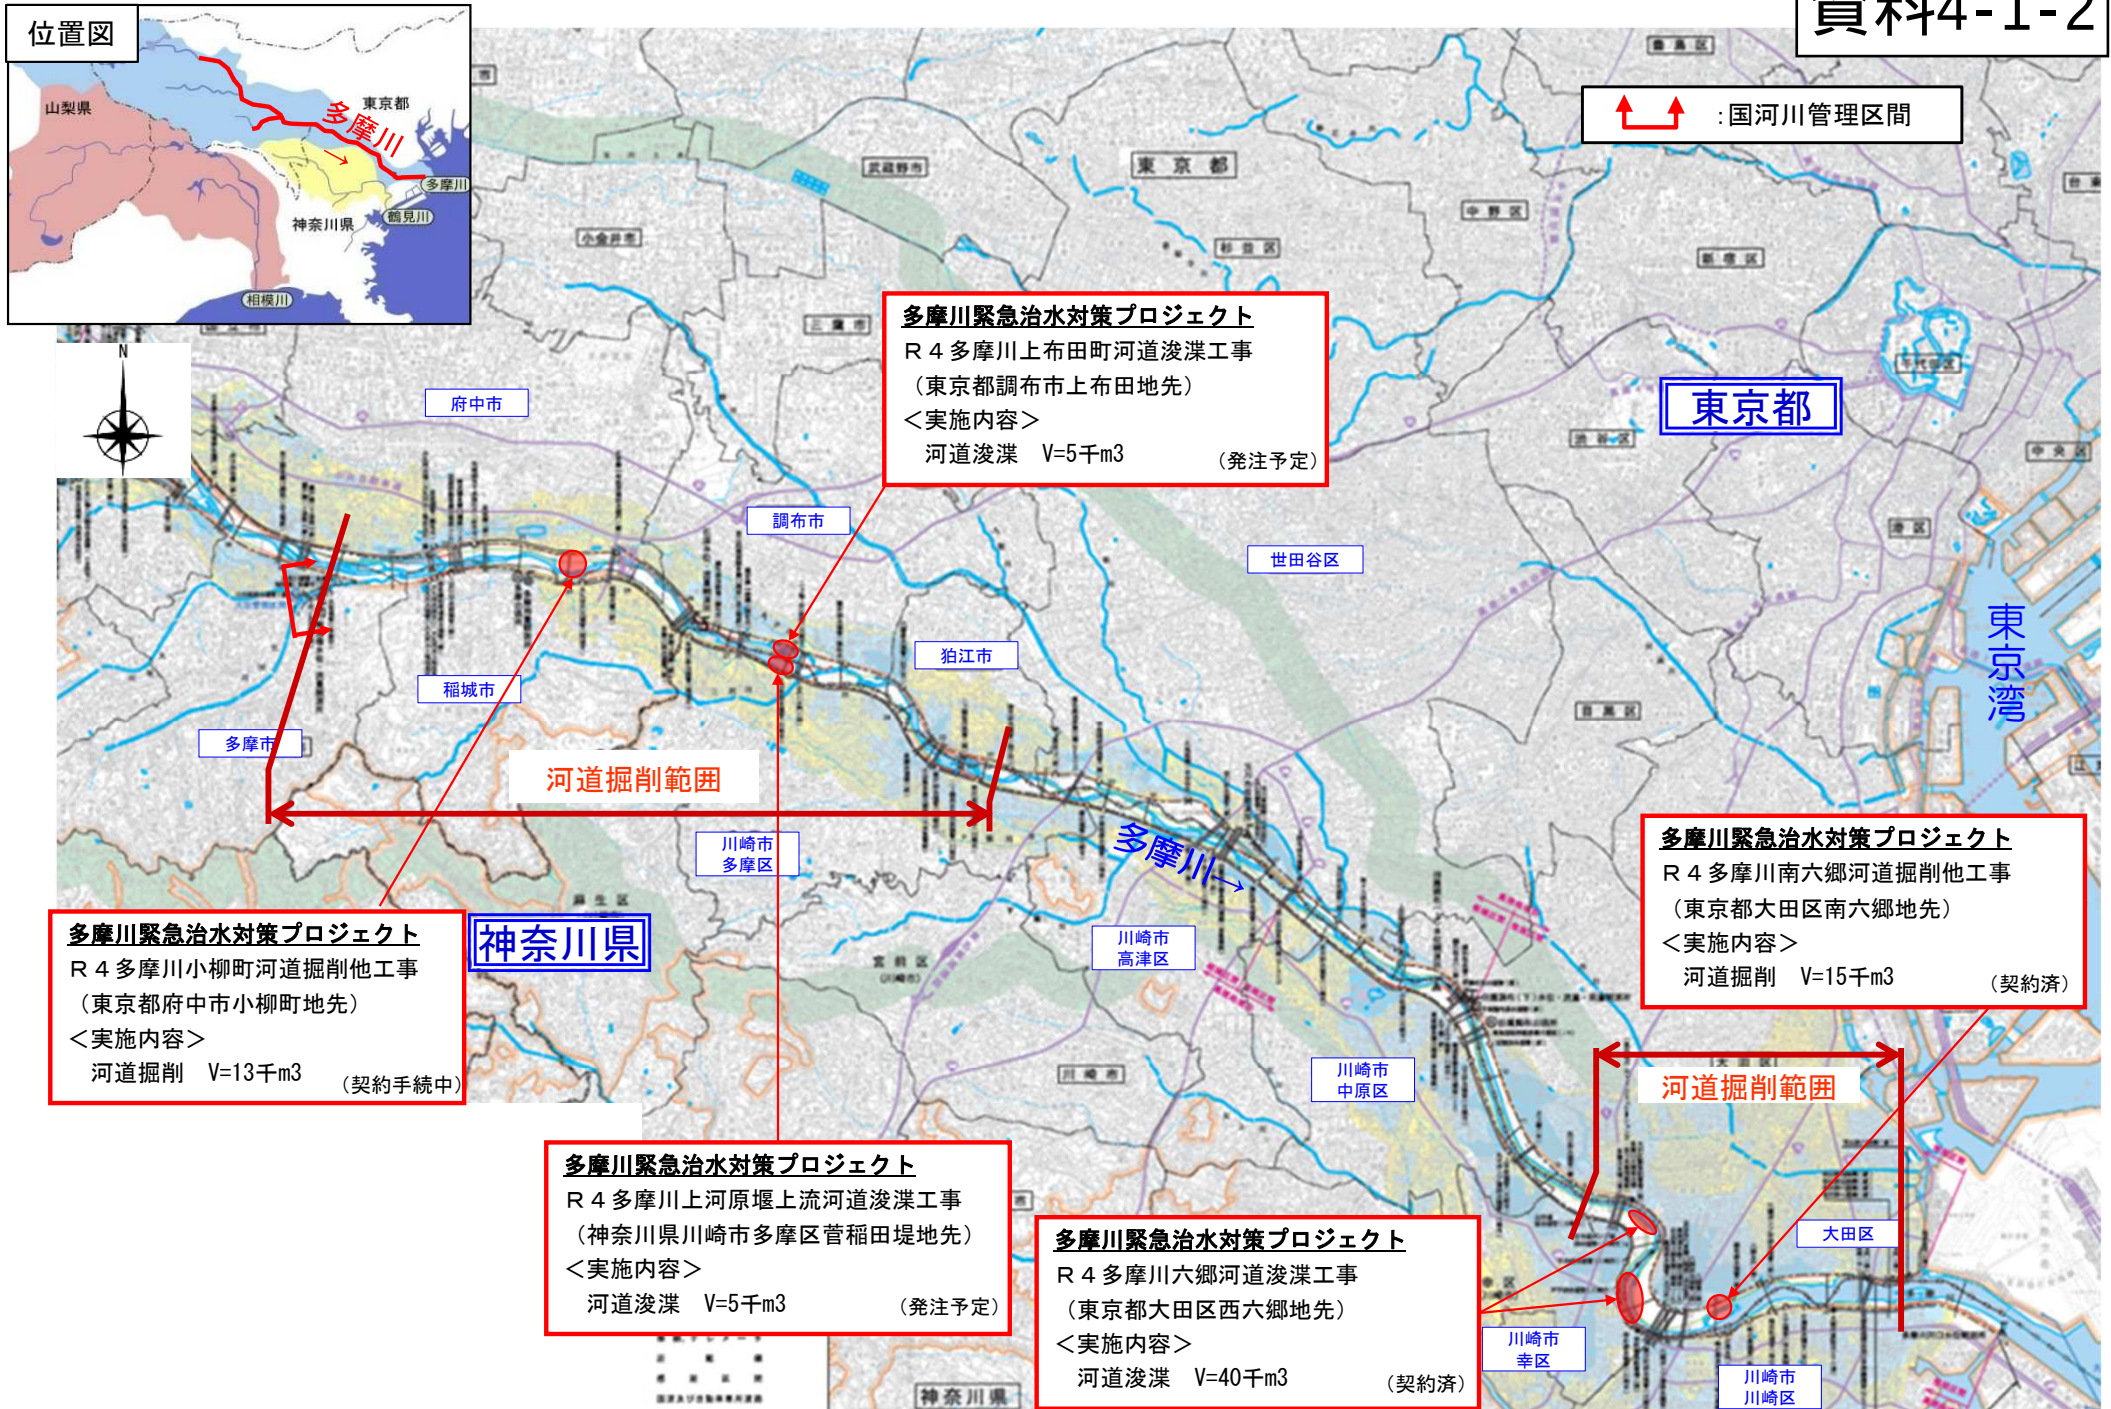

※R5年5月22日時点の情報となります。現地状況により今後変更となる場合がございます。

多摩川緊急治水対策プロジェクト R2～4年度河道掘削実施箇所位置図

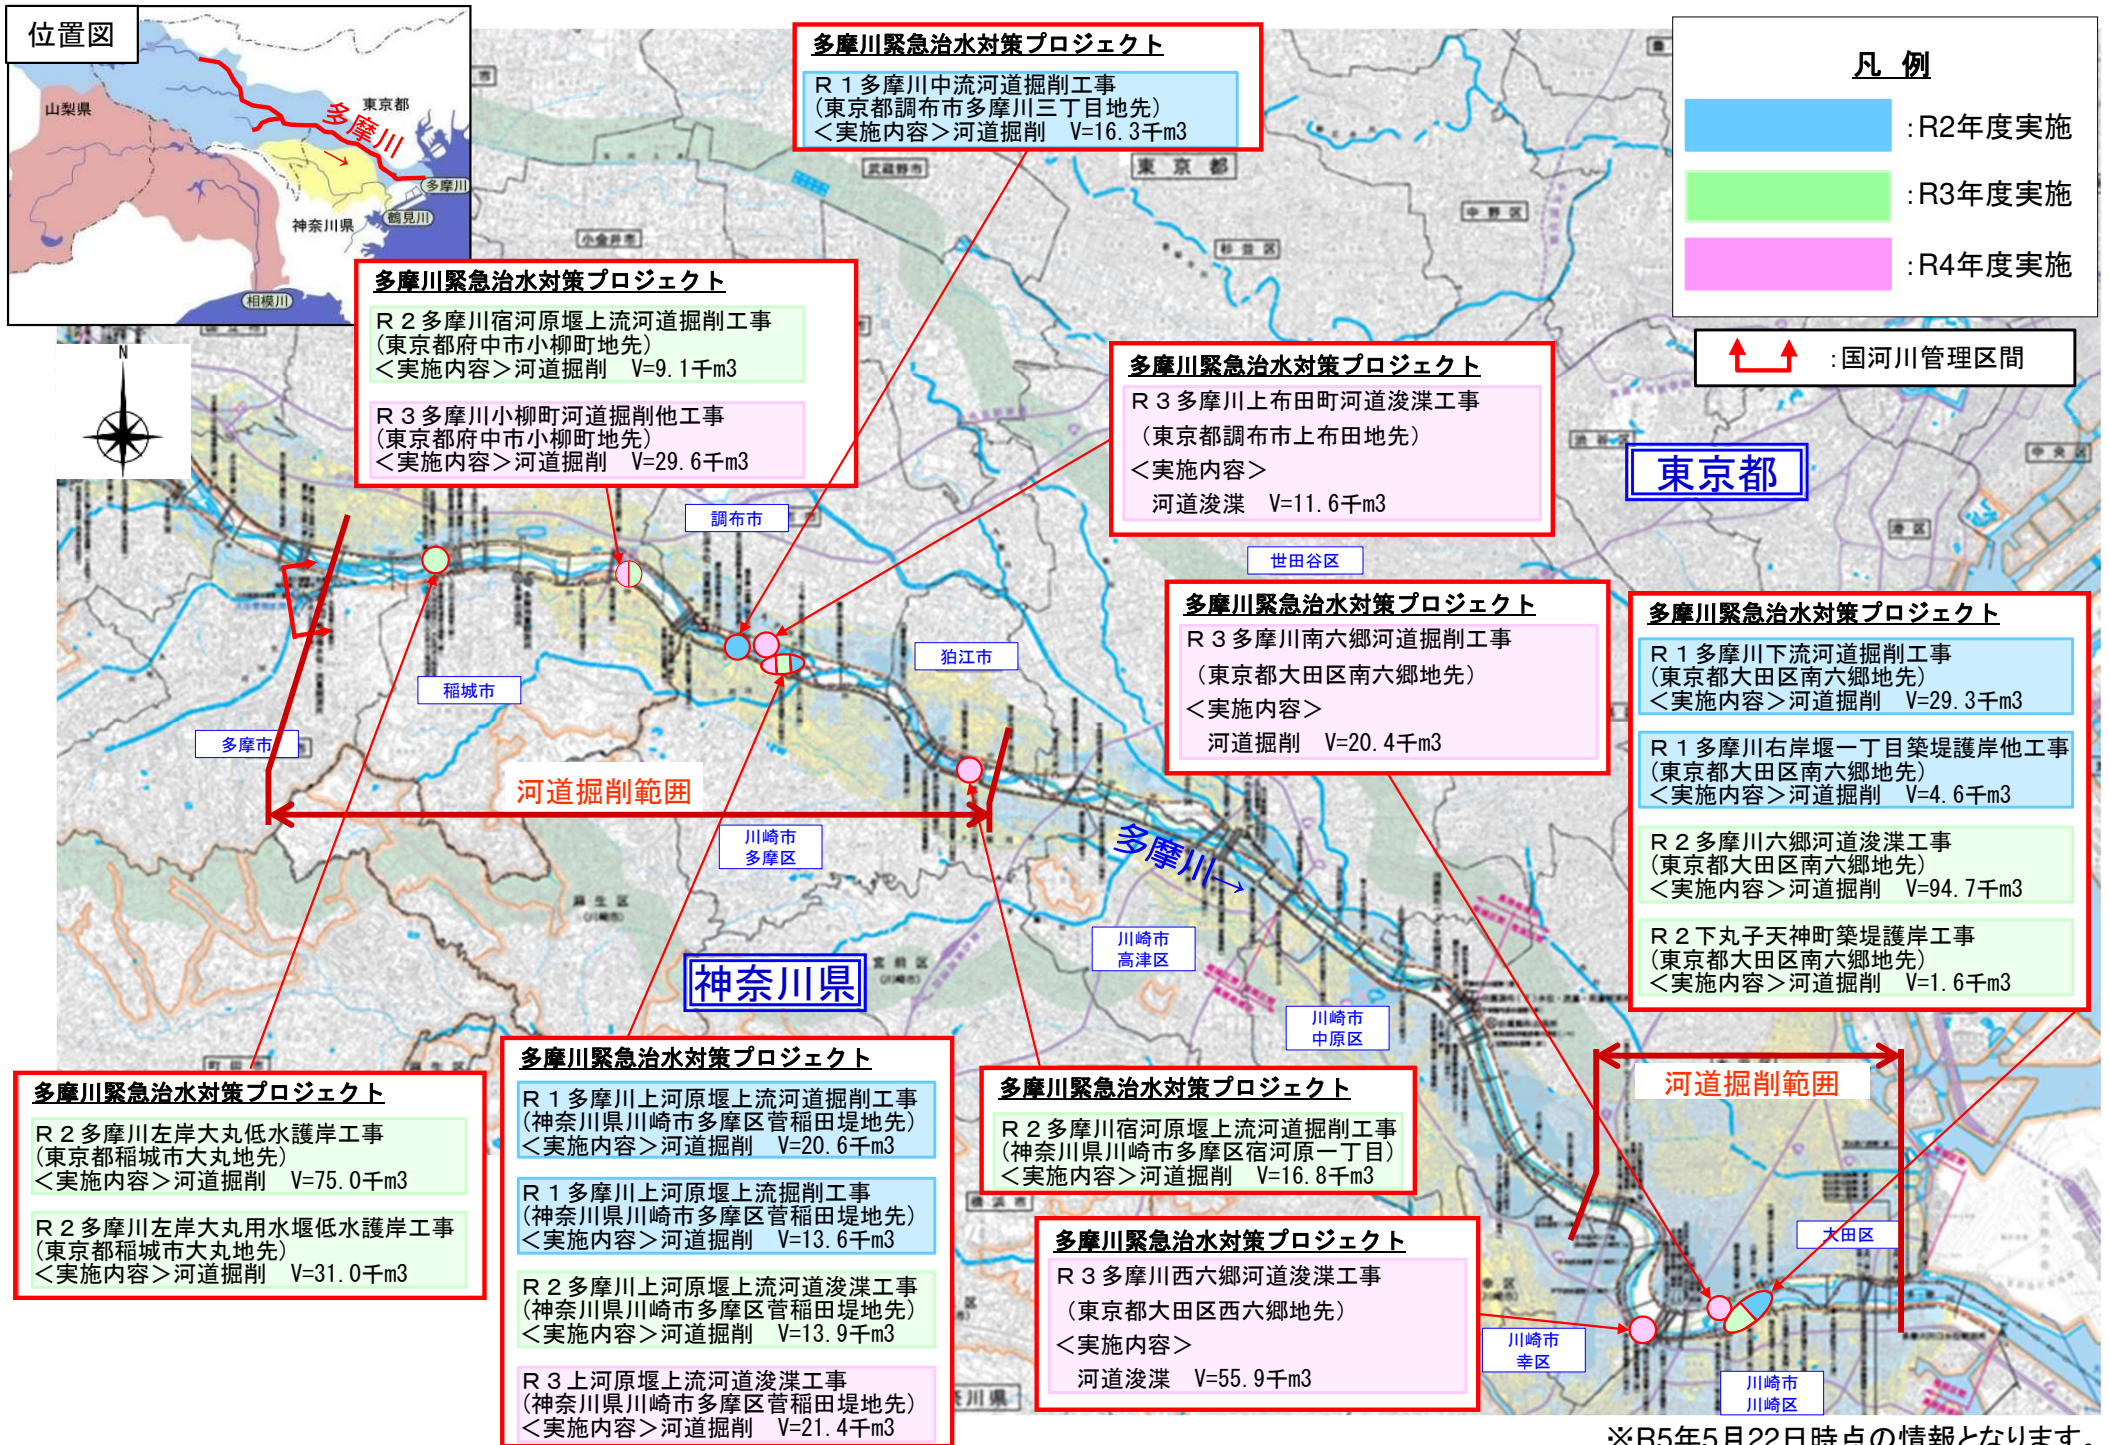

多摩川緊急治水対策プロジェクトの進捗状況

○令和元年東日本台風により、甚大な被害が発生した、多摩川において、国、都、県、市区が連携し、「多摩川緊急治水対策プロジェクト」を進めています。

○国、都、県、市区が連携し、以下の取り組みを実施していくことで、「社会経済被害の最小化」を目指します。

①被害の軽減に向けた治水対策の推進【河川における対策】

②地域が連携した浸水被害軽減対策の推進【流域における対策】

③減災に向けた更なる取組の推進【ソフト施策】

○令和5年度は河道掘削と堤防整備及び堰改築を継続するとともに、多機関連携型タイムラインの策定等を進めていきます。



■河川における対策

全体事業費 約255億円(+64億円)*

事業期間 令和元年度～令和7年度(1年延長)

目 標 令和元年東日本台風洪水における本川からの越水防止

対策内容 河道掘削、樹木伐採、堰改築、堤防整備 等

※土砂運搬等の進捗により、必要に応じて他事業と連携して事業を実施

■流域における対策

(下水道事業等の整備促進)

・流出抑制施設の整備等

・既存施設(五反田川放水路(建設中))の活用による雨水貯留

・下水道樋管等のゲート自動化・遠隔化等

・移動式排水設備(排水ポンプ車)等の整備

・土のう等の備蓄資材の配備等

■ソフト施策

・自治体との光ケーブル接続

・簡易型河川監視カメラの設置

・多機関連携型タイムラインの策定、運用

・講習会等によるマイ・タイムラインの普及促進

・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進

・自治体職員対象の排水ポンプ車運転講習会の実施 等



【最近の動き】

河川における対策 @東京都世田谷区玉川地先



特殊堤区間整備状況(下流側)

特殊堤区間整備状況(上流側)



令和5年4月撮影

■「河川における対策」の進捗 ※数量およびスケジュールは現時点での予定であり、今後の調査・検討・関係機関調整の進捗等により変更が生じる場合があります。

地区等	工 程 等	数 量	進 捗	令和2年度 まで	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
■災害復旧関係（護岸等）									
大田区西六郎四丁目ほか	低水護岸崩壊、高水敷洗掘等	21カ所／21箇所	100%	完了					
■堰改良復旧関係（河道掘削・堤防整備・堰改築）									
河道掘削									
	河道掘削	V=約47万㎡／約198万㎡	24%	約8万㎡	約25万㎡	約14万㎡	約8万㎡		
				完了	完了	完了	施工中		
				（完了=約47万㎡（約24％））					
堤防整備（二子玉川）㊶									
	<第1期>溢水箇所暫定堤防整備	L=約0.1km／約0.1km	100%	完了					
	<第2期>堤防整備	L=約0.00%／約0.54km	0%			施工中			
	緊急用河川敷道路橋梁整備	1橋	0%			施工中			
	特殊堤区間整備	L=約0.0km／約0.24km	0%			施工中			
	土堤区間整備	L=約0.0km／約0.3km	0%			施工中			
大丸用水堰改築 ㊷									
	関係機関協議	設計関係・手続等	—	設計協議完了	手続協議完了				
	低水護岸（高水敷造成）整備	L=約0.8km／約0.8km	100%		完了				
	帯工等（取水施設含む）	一式	0%			施工中			
	床止工（堰撤去含む）	一式	0%						

河川における対策 河道掘削

中流部河道掘削(しゅんせつ)



下流部河道掘削



河川における対策 ㊦東京都稲城市大丸地先

帯工等
(取水施設含む)
整備全景



帯工等
(取水施設含む)
帯工整備状況

