

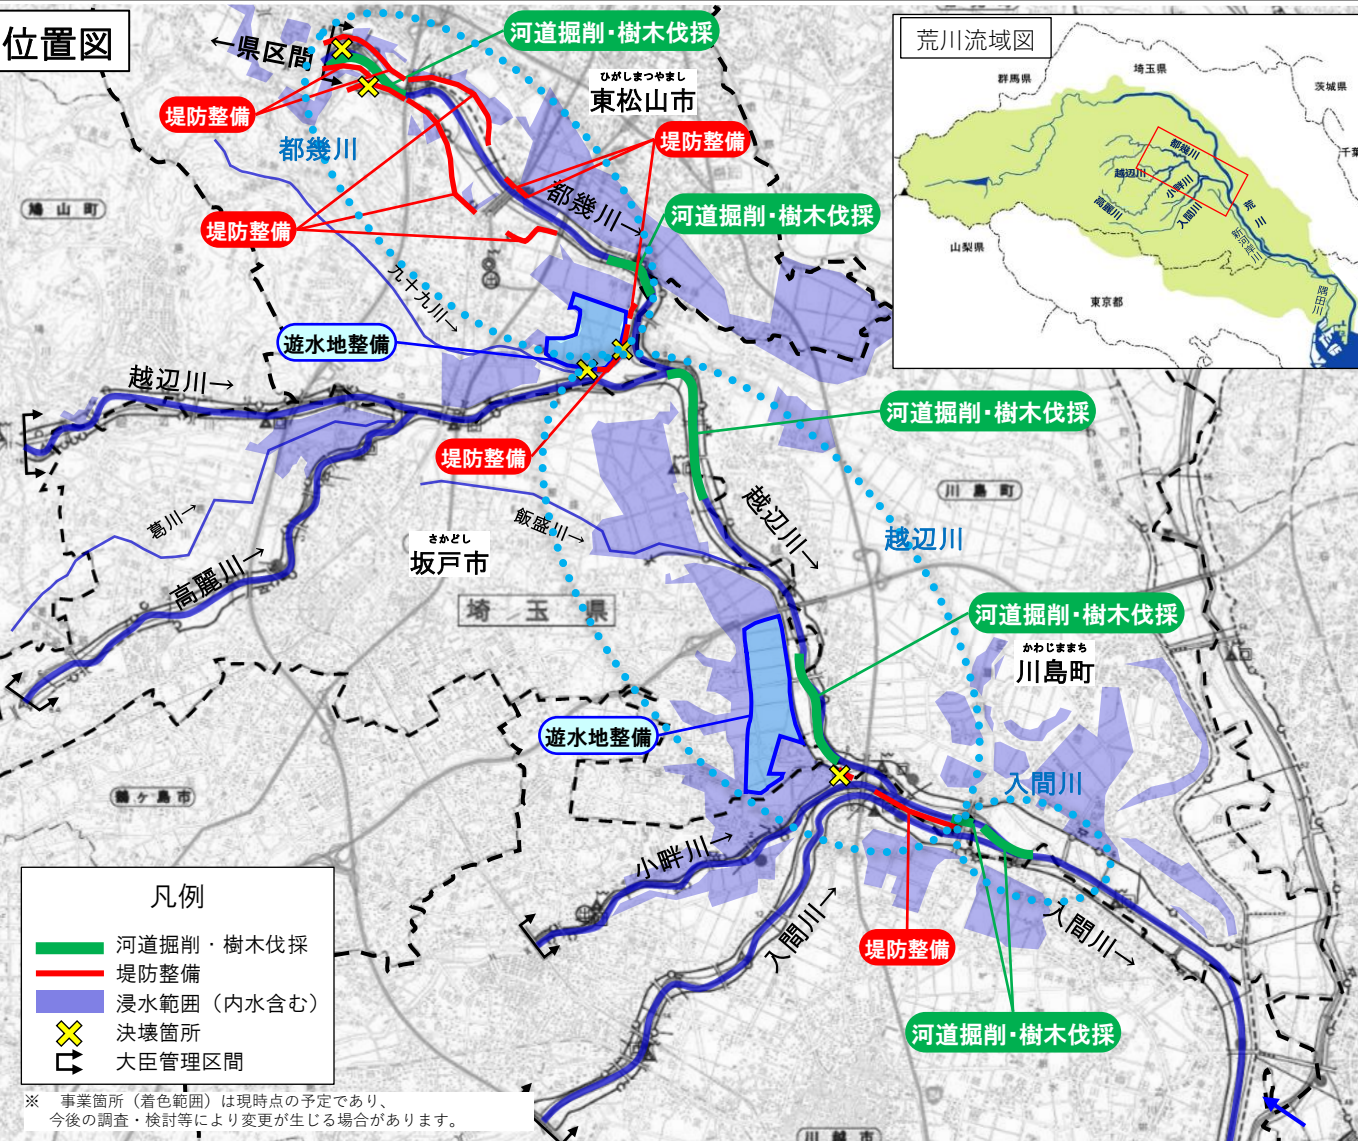


入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況

【令和7年3月末時点】

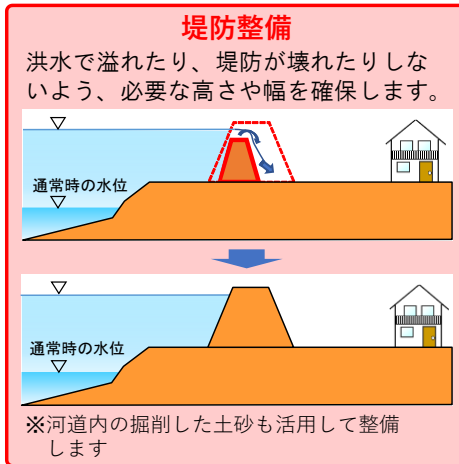

- 令和元年東日本台風と同規模の洪水に対して、再度災害を防ぐことを目標に、令和7年度までに河道掘削、堤防整備等を実施し、遊水地整備を進めていきます。
- 減災に向けた更なる取組として、関係機関等が連携し、円滑な水防・避難行動のための体制等の充実を図ります。

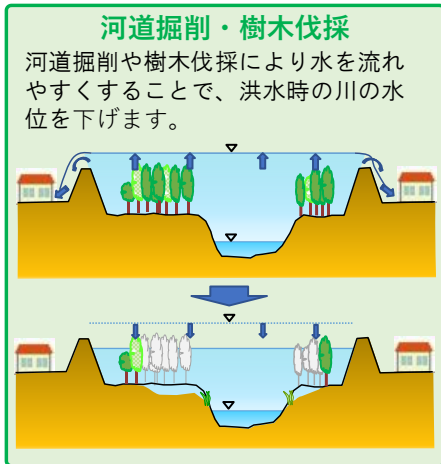

【整備手順の考え方と進捗状況】

河道掘削は上下流バランスを踏まえ、下流入間川区間から実施し、全体的な水位低下を図ります。並行して都幾川区間では堤防整備を先行的に進め、安全に流せる洪水の量を増加させます。

		進捗	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度以降
入間川	河道掘削・樹木伐採 約67万m3	100%		測量 施工						プロジェクト目標達成
	用地取得	100%		用地調査・用地取得(河道掘削)						
越辺川	河道掘削・樹木伐採 約39万m3	92.8%		測量 施工						
	堤防整備 約13万m3	100%		施工						
	遊水地整備		検討	測量					施工	
	用地取得	96.9% 0%		用地調査・用地取得(河道掘削) 用地調査・用地取得(遊水地)						
都幾川	河道掘削・樹木伐採 約12万m3	64.7%		測量		施工				
	堤防整備 約54万m3	63.1%		測量 施工						
	遊水地整備		検討	測量					施工	
	用地取得	98.2% 41.1%		用地調査・用地取得(河道掘削・築堤) 用地調査・用地取得(遊水地)						

※ 数量・スケジュールは現時点での予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。
※ 上記の対策の他、河川管理上必要な対策を行う場合があります。
※ 国管理区間のみの進捗状況を示しており、令和7年3月末時点で河道掘削数量を見直しました。

東松山市下青鳥地先 (都幾川左岸 4.8k付近)



簡易型河川監視カメラ・越水センサー設置状況

