



入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況

【令和7年9月末時点】

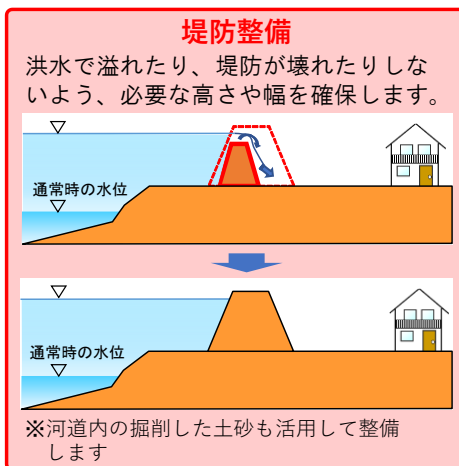

- 令和元年東日本台風と同規模の洪水に対して、再度災害を防ぐことを目標に、令和7年度までに河道掘削、堤防整備等を実施し、遊水地整備を進めていきます。
- 減災に向けた更なる取組として、関係機関等が連携し、円滑な水防・避難行動のための体制等の充実を図ります。

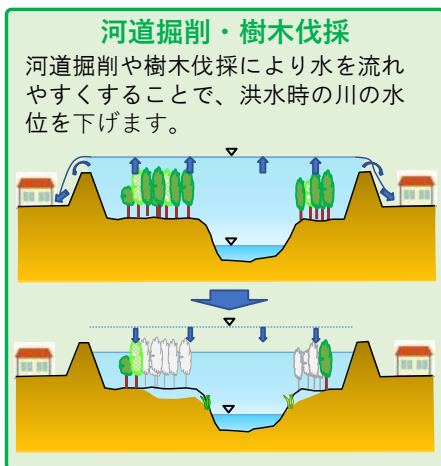

【整備手順の考え方と進捗状況】

河道掘削は上下流バランスを踏まえ、下流入間川区間から実施し、全体的な水位低下を図ります。並行して都幾川区間では堤防整備を先行的に進め、安全に流せる洪水の量を増加させます。

		進捗	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度以降
入間川	河道掘削・樹木伐採 約67万m ³	100%		測量 施工						プロジェクト目標達成
	用地取得	100%		用地調査・用地取得(河道掘削)						
越辺川	河道掘削・樹木伐採 約60万m ³	92.8%		測量 施工						
	堤防整備 約13万m ³	100%		施工						
	遊水地整備		検討	測量					施工	
	用地取得	97.7% 0%		用地調査・用地取得(河道掘削) 用地調査・用地取得(遊水地)						
都幾川	河道掘削・樹木伐採 約12万m ³	64.7%		測量		施工				
	堤防整備 約54万m ³	63.1%		測量 施工						
	遊水地整備		検討	測量					施工	
	用地取得	99.8% 54.4%		用地調査・用地取得(河道掘削・築堤) 用地調査・用地取得(遊水地)						

※ 数量・スケジュールは現時点での予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。
※ 上記の対策の他、河川管理上必要な対策を行う場合があります。
※ 国管理区間のみを進捗状況を示しています。

東松山市下青鳥地先 (都幾川左岸 4.8k付近)

着工前



令和6年5月撮影

完成後(堤防整備、河道掘削及び樹木伐採による流下能力の向上)



令和7年3月撮影


簡易型河川監視カメラ・越水センサー設置状況



越辺川右岸3.4k
(飯盛川樋門) 付近



都幾川左岸6.4k(越水センサー)

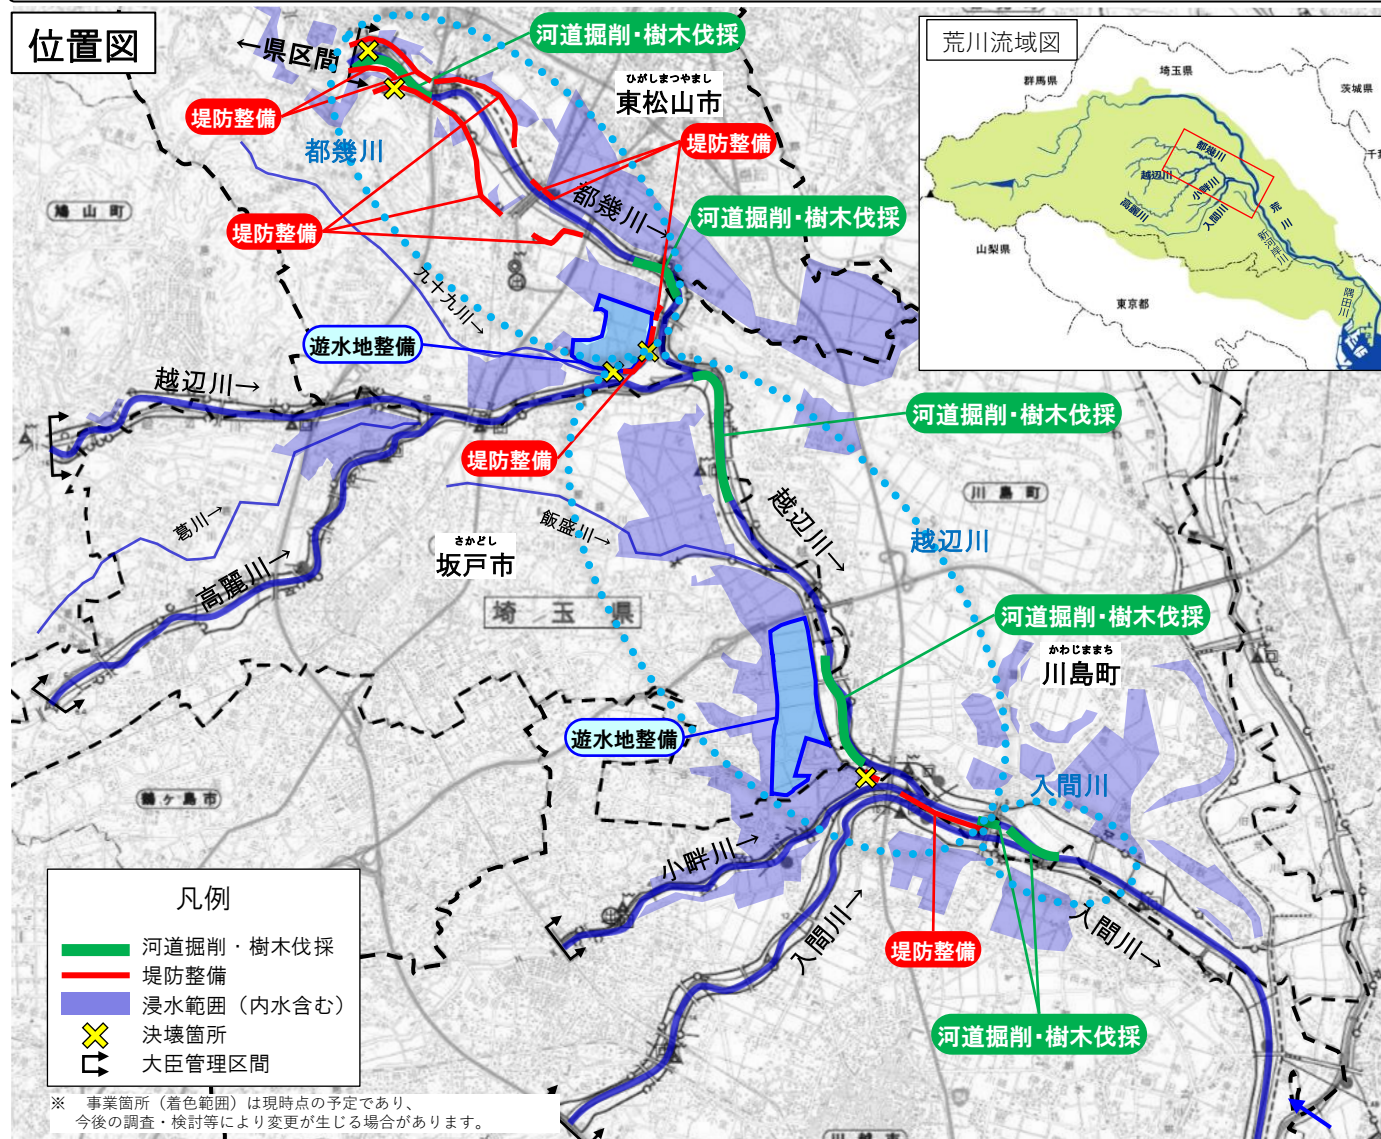

- 凡例
- 河道掘削・樹木伐採
 - 堤防整備
 - 浸水範囲(内水含む)
 - 決壊箇所
 - 大臣管理区間

※ 事業箇所(着色範囲)は現時点の予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。
