


R 3 荒川右岸古谷上築堤その1 工事

おわりました!!

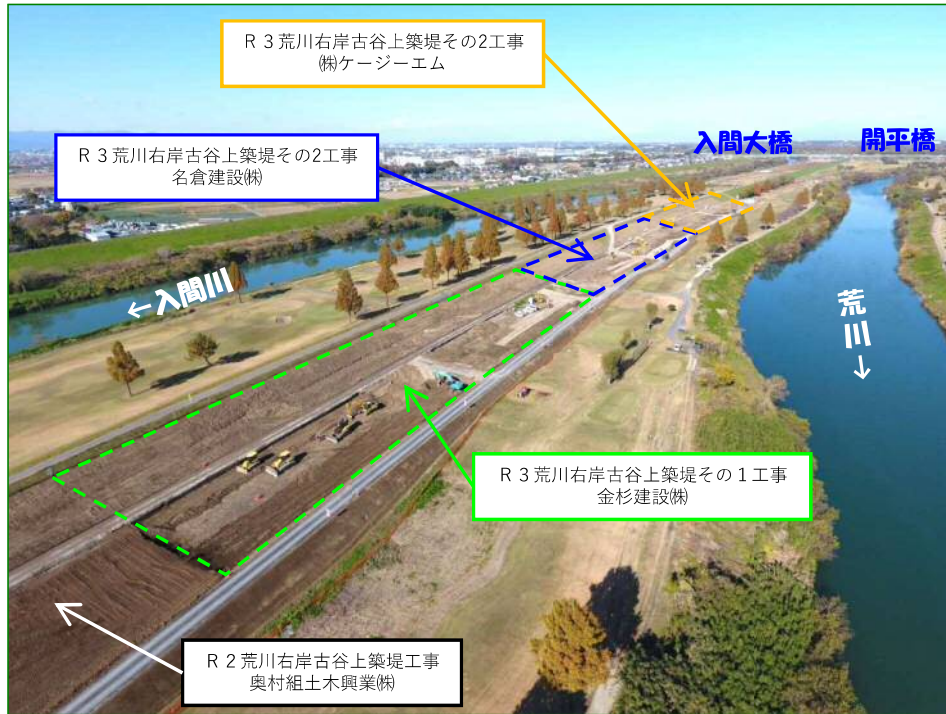

2021年11月26日 撮影

2022年3月28日 撮影 (完成)

令和3年10月より行ってきました川越市古谷上地先の築堤工事ですが、3月29日をもって工事が完了となりました。工事が無事故、無災害で終了させることができたのは、地域の皆様方のご理解とご協力あってのことだと深く感謝申し上げます。
長い間本当にありがとうございました。



KANASUGI



i-Construction

全力! 建設DX
荒川第二・三調節池

BIM/CIM

DX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組んでいます!!



2021年11月26日 撮影



2022年3月16日 撮影

盛土完了、野芝設置中




BIM/CIM



地上型レーザースキャナー

自社保有の機械を使用することにより現場状況により計測・解析・立会いを行うことができる。

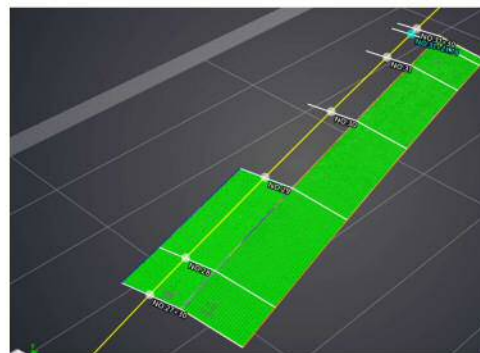

ヒートマップ

設計値に比べ施工された盛土の高さが色によって把握できる。緑色のため設計値の高さを満たしている。



自動追尾式TS/トレンドフィールド

自社の測量機械を使用することによりいつでも立会いを行うことができる。

自社で保有している地上型レーザースキャナーで出来形計測、解析、ヒートマップ作成までを行いました。

また、盛土出来形計測の立会いも自社保有の測量機器（自動追尾式TS、トレンドフィールド）を使用し検査を行いました！
