


〇〇月度		工事名 〇〇庁舎改修工事																									監督職員		監理事務所		現場代理人		監理技術者		No.			
月間工程表		受注者名 株式会社〇〇建設																									作成日: 令和〇年〇月〇日		印		印		印		3			
施工場所	月	〇〇月																															工期 自 令和〇年〇月〇日					
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	至 令和〇年〇月〇日					
曜日		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	記 事					
仮設工事							東外部足場組立							西外部足場組立							南外部足場組立							北外部足場組立					6日(月)安全大会					
3階 A通 2-3間																																			仮設間仕切 既存壁撤去		23日(木)コンクリート打設	
B通 4-5間																																					24日(金)安全衛生協議会	
2階 A通 2-3間							仮設間仕切					既存壁撤去					アンカー					配筋					型枠					CON打		キープラン				
B通 4-5間																																						
1階 A通 2-3間			配筋				型枠					CON打					脱型					グラウト型枠・打設																
B通 4-5間		仮設間仕切				既存壁撤去					アンカー					配筋					型枠					CON打		脱型										
外構		植栽移植																																				
電気設備工事							機器取外し																															
機械設備工事							機器取外し																															
施工図						2階耐震躯体図							3階耐震躯体図							1階平面詳細図							2階平面詳細図					現場閉所の報告(累計) 現場閉所の日数:〇日 対象期間の日数:〇日 現場閉所率:〇% ※累計は、着工から当該月末までとする。						
施工計画書						建具工事							内装工事					金属工事					塗装工事					防水工事										
主要行事						安全大会		定例会議								定例会議																				進捗状況		
																																				予定	今月(累計)	来月(累計)
																																				実施	〇〇%	〇〇%

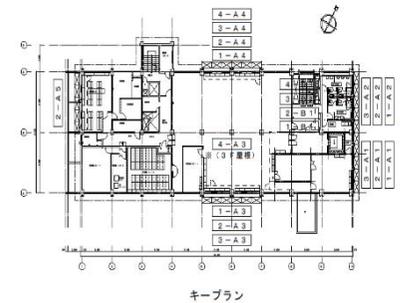

様式-30-1 (記載例)

令和〇年4月度 月間工程計画	〇〇庁舎改修工事		月間工程計画の記載例					受注者：株式会社〇〇建設				工期自 令和〇年01月17日	工期至 令和〇年10月20日	進捗状況(累計%)			監督職員		工事監理	現場代理人	主任技術者	計画No. 3																	
															4月					印	印	印	報告No.																
															予定	実施	予定																						
															12.0%		23.4%																						
4月																													計画作成日 令和〇年03月24日										
＜月＞		30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3			
＜日＞		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
＜曜日＞																																							
＜天気＞		晴：○ 雨：● 曇：◎ 雪：※																																					
仮設工事	東外部足場組立							西外部足場組立							南外部足場組立							北外部足場組立																	
3階	A通 2-3間																																						
	B通 4-5間																																						
2階	A通 2-3間	仮設間仕切							既存壁撤去							アンカー							配筋							型枠							CON打		
	B通 4-5間	仮設間仕切							既存壁撤去							アンカー							配筋							型枠							CON打		
1階	A通 2-3間	アンカー		配筋		型枠		CON打		アンカー		配筋		型枠		CON打		アンカー		配筋		型枠		CON打		アンカー		配筋		型枠		CON打							
	B通 4-5間	アンカー		配筋		型枠		CON打		アンカー		配筋		型枠		CON打		アンカー		配筋		型枠		CON打		アンカー		配筋		型枠		CON打							
外構	植栽移植																																						
電気設備工事	機器取外し																																						
機械設備工事	機器取外し																																						
【管理官署立会】	事務室立入																																						
【休日・夜間作業】	8:30~16:00																																						
【騒音・振動】	アンカー		★		★		CON打		★		アンカー		★		アンカー		★		★		CON打		★		CON打		★		アンカー		★		★						
【騒音・振動】	★																																						
【一工程の施工確認(受入検査等)】	右記について設計図書に適合することを確認したので報告する。 主任技術者 ○○ ○○ 印																																						
【監督職員等の検査・立会請求】	配筋検査							配筋検査							配筋検査							配筋検査																	
【工事材料搬入】	搬入日																																						
【施工計画書・報告書・施工図等】	2階耐震躯体図							3階耐震躯体図							1階平面詳細図							2階平面詳細図																	
【主要行事】	定例		○		★		安全大会		定例		○		★		安全大会		定例		○		★		安全衛生協議会		★		定例		○		★								
【週休2日】	現場閉所の報告(累計) 現場閉所率: ○%																																						
	現場閉所の日数: ○日																																						
	対象期間の日数: ○日																																						
	※累計は、着工から当該月末までとする。																																						
	【確認資料等】																																						
	工事材料搬入一覧表																																						
	・有																																						
	・無																																						

様式-30-1 (記載例)

令和〇年4月度 週間実施報告		〇〇庁舎改修工事 週間実施報告の記載例															工期自 令和〇年01月17日		進捗状況(累計%)					監督職員		工事監理		現場代理人		主任技術者		計画No.											
		受注者：株式会社〇〇建設															工期至 令和〇年10月20日		4月		5月			印		印		印		3													
		改工期		予定		実施			予定		12.0%			23.4%		報告No.																											
		指定工期													12																												
<月>		4月 実施報告																											計画作成日														
<日>		30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	令和〇年03月24日						
<曜日>		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	実施報告日						
<天気>晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※		○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	●	●	◎	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○												令和〇年04月22日					
仮設工事		東外部足場組立															西外部足場組立					南外部足場組立					北外部足場組立																
3階	A通 2-3間																仮設間仕切					既存壁撤去...					仮設間仕切		既存壁撤去...														
	B通 4-5間																																										
2階	A通 2-3間	仮設間仕切															既存壁撤去					アンカー					配筋					型枠		CON打		アンカー作業の遅延により19、20日に休日作業実施							
	B通 4-5間																										仮設間仕切					既存壁撤去					アンカー						
1階	A通 2-3間	アンカー															配筋					型枠					CON打					脱型		グラウト型枠・打設									
	B通 4-5間	仮設間仕切															既存壁撤去					アンカー					配筋					型枠		CON打		脱型							
外構		梅栽移植																																									
設備工事		機器取外し															機器取外し												機器取外し														
機械設備工事		機器取外し															機器取外し												機器取外し														
【管理官署立会】																													事務室立入														
【休日・夜間作業】																													8:30~16:00		★		19、20日の休日作業は17日に報告し監督承諾済み										
【騒音・振動】		アンカー															CON打					アンカー					アンカー					CON打		CON打		アンカー		★					
【(-)工程の施工確認(受入検査等)】		アンカー引張試験															配筋検査					アンカー引張試験					アンカー引張試験							<確認資料等> アンカー引張試験報告書 配筋検査報告書									
【監督職員等の検査・立会請求】		配筋検査															配筋検査					配筋検査					配筋検査																
【工事材料搬入】		鉄筋															CON					鉄筋												工事材料搬入一覧表 ・有									
【施工計画書・報告書・施工図等】		2階耐震躯体図															3階耐震躯体図					1階平面詳細図					2階平面詳細図																
【主要行事】		定例															安全大会					定例					定例					安全衛生協議会		定例									
【週休2日】		現場閉所の報告(累計) 現場閉所率:0% 現場閉所の日数:0日 対象期間の日数:0日 ※累計は、着工から当該月末までとする。																																									
