

R4年6月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

1.R 2 武智川下流床固群工事（施工者：木下建設（株））

場所：長野県諏訪郡富士見町富士見地先（施工場所はこちらをクリック）

(<https://maps.gsi.go.jp/vector/#15.414/35.897067/138.229089/&ls=vstd&disp=1&d=l>)

工期：R2年8月8日～R5年1月31日



下流上空より施工箇所（全景）を望む



上流より施工箇所を望む（流路護岸工）

武智川下流床固群のうち、床固工、帯工、護岸及び人道橋を施工し、土砂・洪水を安全に流下させ、土砂災害を防止する。現在、右岸側の流路護岸工を実施中。

R4年6月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

2. R 3 黒川第五砂防堰堤工事（施工者：（株）早野組）

場所：山梨県北杜市白州町上教来石地先（施工場所はこちらをクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.813063/138.229251/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R3年8月3日～R4年7月29日



下流より本堰堤を望む（コンクリート堰堤工）



下流 左岸上部より本堰堤を望む（コンクリート堰堤工）

釜無川右支黒川において、土砂流出に伴う下流域での土砂・洪水氾濫の被害を防止・軽減するため、砂防堰堤を施工する工事。現在、コンクリート堰堤工を実施中。

R4年6月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

4. R 3 中島砂防堰堤右岸斜面对策工事（施工者：（株）芦沢組土木）


場所：山梨県北杜市白州町鳥原地先（施工場所はここをクリック）

（<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.821754/138.204768/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

工期：R4年5月10日～R5年1月31日



【着手前】上空より施工箇所を望む

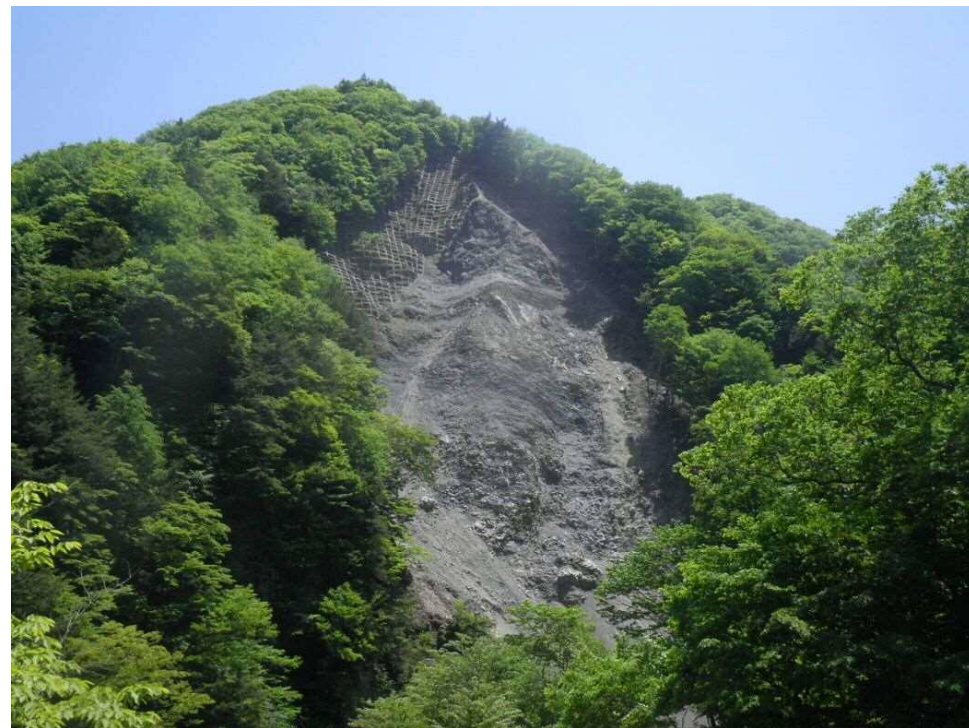

【着手前】対岸より施工箇所を望む

中島砂防堰堤の改築にあたり、支障となる右岸崩壊地からの落石対策を行う斜面对策工事。前年度工事から継続で現在、資材搬入などのためのモルルール、ケーブルクレーンの仮設工を実施中。
