


作業前アオコ発生状況②



作業前アオコ発生状況③



7月11日アオコ対策状況

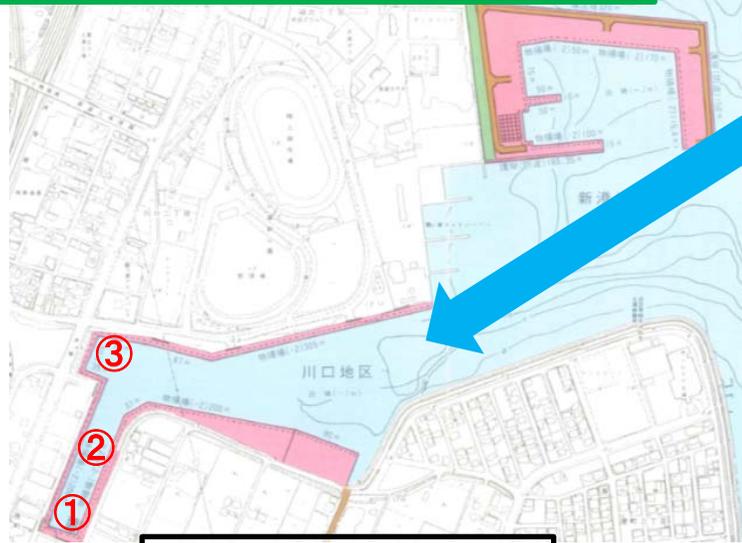

作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内図面箇所、レベル4~5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業を行いました。
4. 対策効果: 攪拌作業の実施及び午後からの南西の風により、アオコレベル4~5がレベル2~3程度まで改善しました。



作業前アオコ発生状況



水面清掃船「水馬」によるアオコ回収作業



7月11日アオコ対策状況

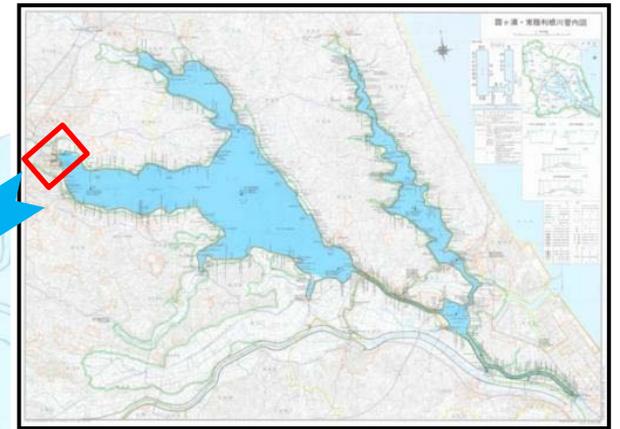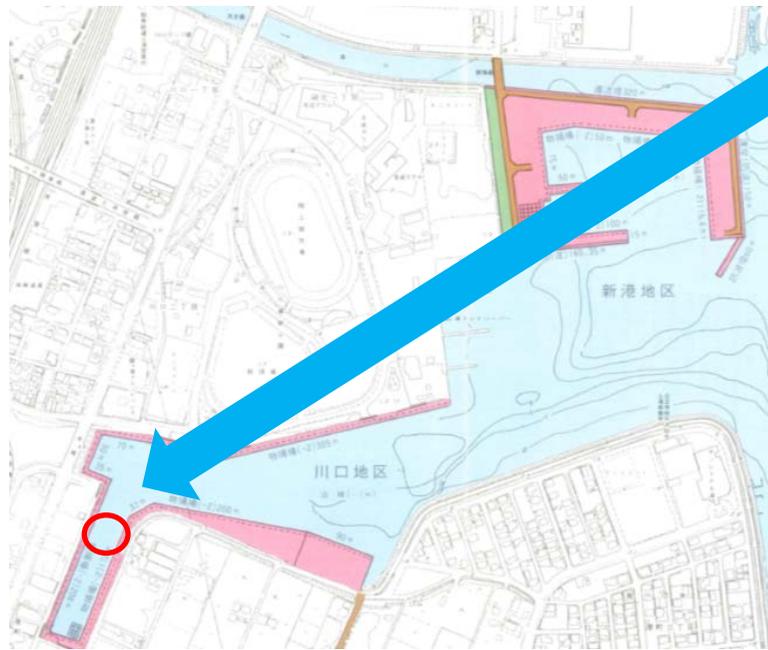

アオコ脱水完了後



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 水面清掃船「水馬」周辺、レベル4~5に達していました。
3. 対策内容: 水面清掃船「水馬」にてアオコを回収・脱水し、ドラム缶(0.7本分)に収めました。
4. 対策効果: 回収作業の実施及び午後からの南西の風により、アオコレベル4~5がレベル2~3程度まで改善しました。
