




7月18日アオコ対策状況(攪拌)

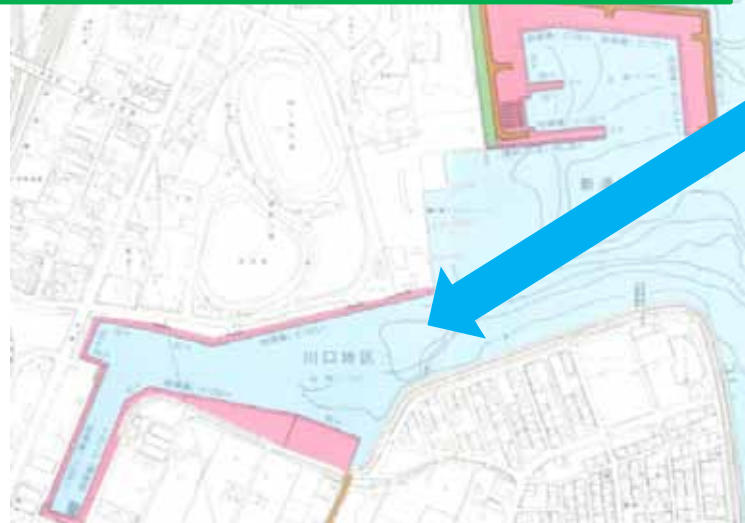


1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3 ~ 4のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業を行いました。
4. 対策効果: 攪拌することにより水流が発生し、アオコの堆積は見られずレベル3を維持しました。

作業前アオコ発生状況




7月18日アオコ対策状況(回収)

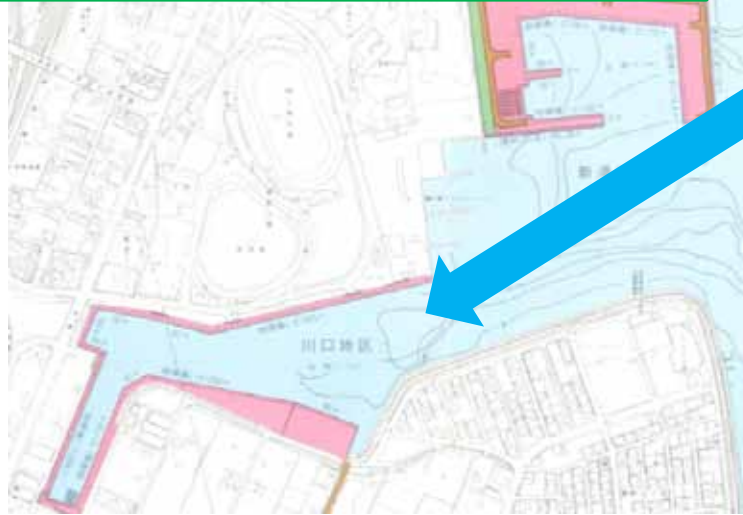

水馬アオコ回収



水馬アオコ浮上槽移送

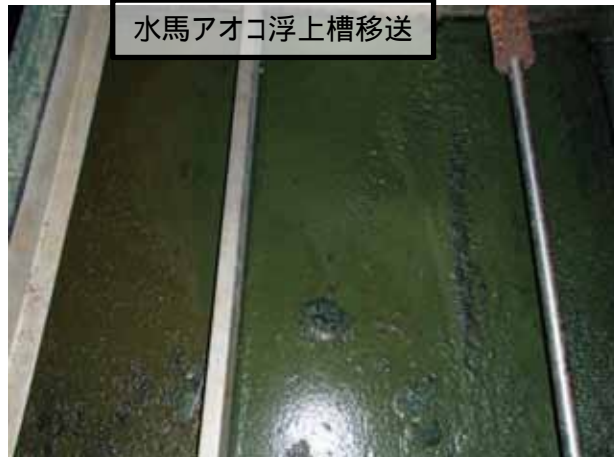

みずすまし錨設置



みずすまし回収機準備



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 風でアオコが土浦港内に入って来ており、レベル3~4のアオコ発生
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収、「みずすまし」の運転準備を行いました。
4. 対策効果: 「水馬」横はアオコを回収しているため、レベル3~4を維持しました。
