

作業前アオコ発生状況



作業船によるアオコ攪拌作業



# 7月19日アオコ対策状況



攪拌作業後



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～5のアオコ発生、朝のうちはレベル3程度であったが、風が東になり、気温の上昇とともにアオコが土浦港内に集まりだした。特にピオパーク横はレベル5強であった。
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業を行いました。
4. 対策効果: 攪拌することにより攪拌箇所はアオコの堆積は見られない。  
ピオパーク横では、攪拌によりレベル5強からレベル3～4に改善しました。  
気温30度を超える中での作業は、こまめな休憩が必要である。

作業前アオコ発生状況



# 7月19日アオコ対策状況

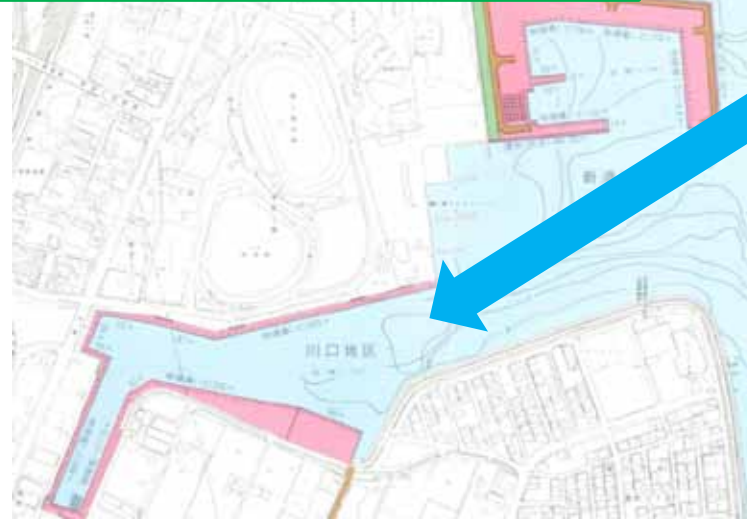

みずすまし運転準備

水馬アオコ回収



水馬アオコ脱水状況



水馬脱水アオコ0.5本



みずすましアオコ回収



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～5のアオコ発生、朝のうちはレベル3程度であったが、風が東になり、気温の上昇とともにアオコが土浦港内に集まりだした。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水、ドラム缶0.5本脱水。  
「みずすまし」の運転準備から午後よりアオコ回収
4. 対策効果: 午後から風が強くなってきたため、風波の影響でアオコレベルは3～4程度となった。  
アオコが無くなったという感じではないが、悪臭の発生は感じられない。
