


作業前アオコ発生状況



レベル6

7月23日アオコ対策状況

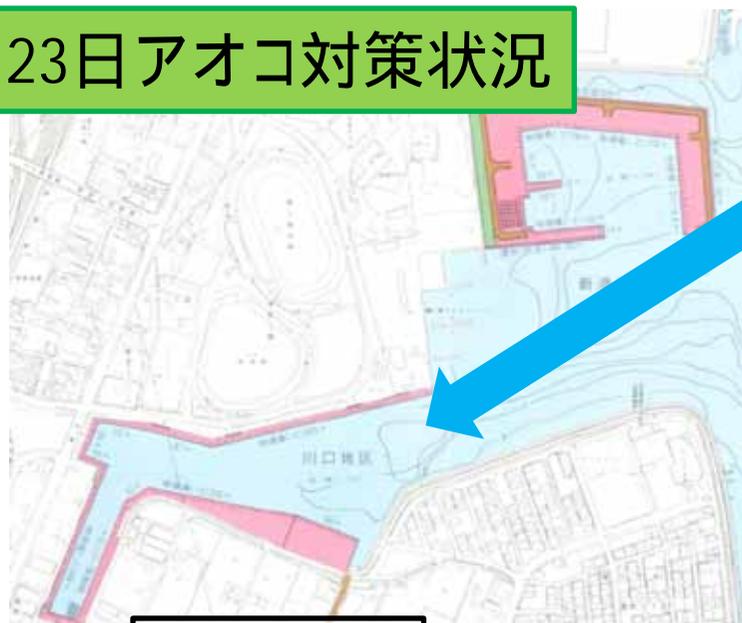

アオコ攪拌作業後



攪拌作業後

作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～6のアオコ発生、気温の上昇とともに、午後からアオコが土浦港内に寄せられて来ている。
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 攪拌作業を行った場所に関しては、攪拌前レベル5～6から攪拌後レベル3～4程度となる。ピオパーク横は特にひどくレベル6から攪拌後はレベル3～4に改善するが、時間とともにアオコが堆積してレベル5になる。

7月23日アオコ対策状況

作業前アオコ発生状況



作業前アオコ発生状況



みずすましアオコ脱水状況



水馬アオコ回収状況



みずすましアオコ回収状況



みずすまし脱水アオコ0.6本



水馬脱水アオコ1本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～6のアオコ発生、気温の上昇とともに、午後からアオコが土浦港内に寄せられて来ている。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶1本、「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶0.6本
回収箇所については、レベル6までにはなっていないが、アオコの悪臭と気温の上昇で、回収作業は大変である。
