

中川下流だより

出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページ
(<http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa>)に掲載しています。

国土交通省関東地方整備局
江戸川河川事務所
中川下流出張所発行
東京都葛飾区高砂1-3-15
電話(03)3694-2757
2013年 2月28日【第15号】

「中川下流出張所管内の工事施工状況について」

中川下流出張所における工事施工状況をお知らせします(平成24年度発注工事)。
工事の概要は下記のとおりです。

- ①中川浚渫工事(工期：H24.10.2～H25.3.29 工事場所：八潮市南川崎地先)
中川の河底に溜まった土砂を撤去し、洪水を流れやすくするための工事です。
今回の工事では、中川22km付近で約33,000m³の土砂を(延長約700m)撤去します。
- ②青戸八丁目地区築堤護岸工事(工期：H24.10.26～H25.3.25(延期予定) 工事場所：葛飾区青戸八丁目地先)
中川大橋上流部(中川右岸13.8km付近)で、洪水に備えて堤防を強くするための工事です(延長約150m)。
- ③水道配水本管中川横断部撤去工事(工期：H24.11.1～H25.6.14 工事場所：葛飾区新宿一丁目地先)
中川大橋下流部(中川左岸13.5km付近)の河床に埋設されている、用途廃止となった水道管(東京都管理)を東京都から委託されて撤去する工事です。
- ④圪川排水樋管ゲート設備修繕工事(工期：H24.10.6～H25.3.15 工事場所：八潮市圪地先)
中川右岸18.5km地点に設置されている圪川排水樋管のゲートの補修を行う工事です。



工事箇所位置

①中川浚渫工事



浚渫箇所

三郷放水路

②青戸八丁目地区築堤護岸工事




現場作業位置図

施工箇所
中川右岸13.8km～13.95km

③水道配水本管中川横断部撤去工事

[施工箇所平面図]

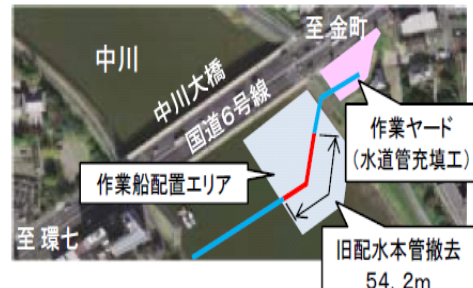


④圪川排水樋管ゲート設備修繕工事



圪川排水樋管

各工事の施工状況(→ は中川の流れる方向です)

①中川浚渫工事…(しゅんせつ工 1式、揚土工 1式、仮設工 1式)

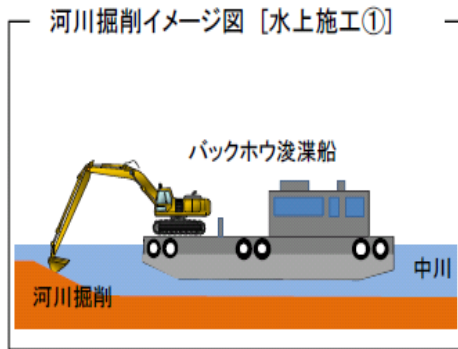


溜まった土砂を掘っています。



掘った土砂を仮置きしています。

②青戸八丁目地区築堤護岸工事…(矢板護岸工 1式、法覆工 1式、根固工 1式、仮設工 1式)

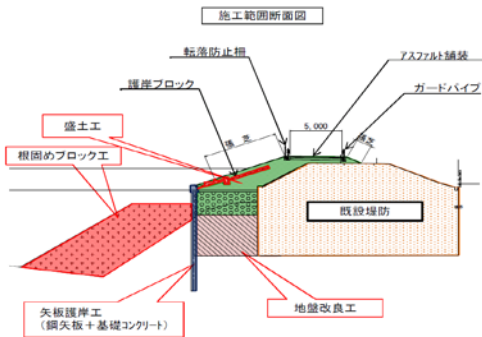


鋼矢板を打ち込んでいます。



鋼矢板の打ち込み完了です。

③水道管撤去工事…(埋設管撤去 1式、揚土工 1式、仮設工 1式)

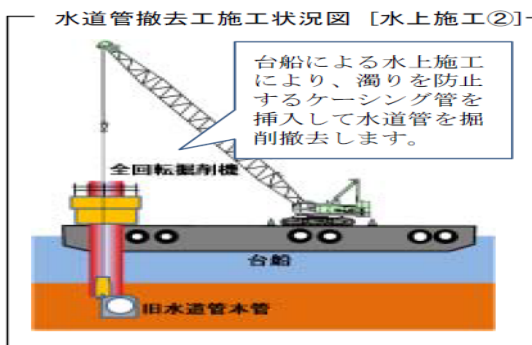


水道管の上に溜まった土砂を掘っています。



水道管を撤去しています。

④垢川ゲート修繕工事…(ゲート修繕 1式)

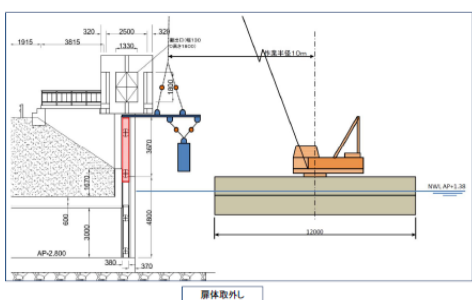

補修するため、扉体(ゲート)を一時取り外しています。

あとがき

中川下流出張所管内の工事について、安全に留意して進めたいと思います。

地域のみなさまのご協力よろしくお願ひ申し上げます。

「中川下流だより」編集委員会
責任者 小林建吾
