




水馬アオコ発生状況①

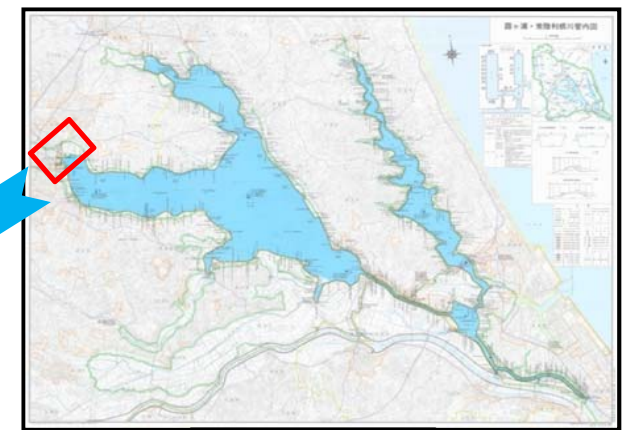

9月11日アオコ対策状況

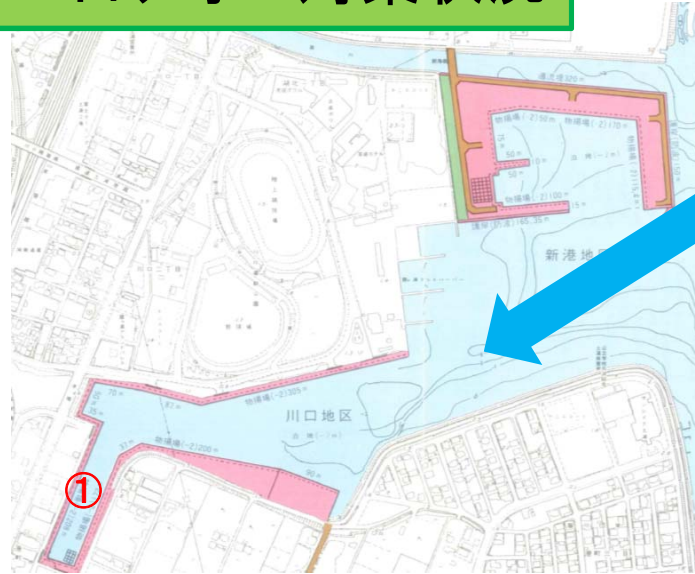

水馬脱水状況①

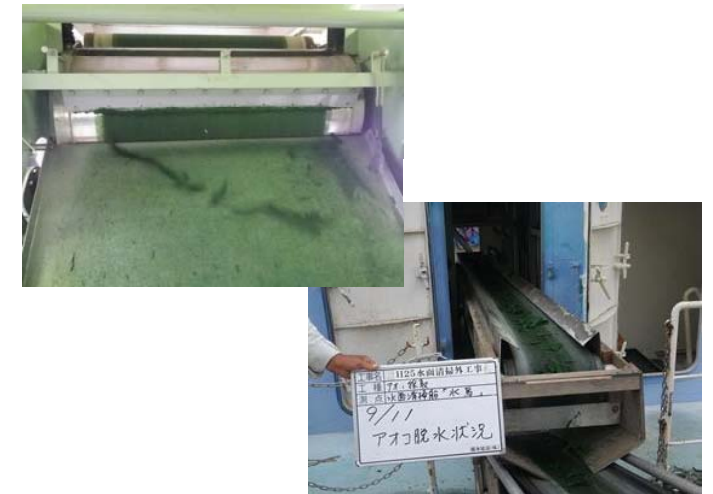

水馬脱水アオコ3本



水馬アオコ回収状況①




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル2~6のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ3本 累計26本
朝方の作業前は、水馬周辺はレベル4であったが、作業開始後3時間程するとアオコが浮上し始め、回収作業中、レベル5に上昇、その後、レベル5を維持。

作業前アオコ発生状況①



9月11日アオコ対策状況

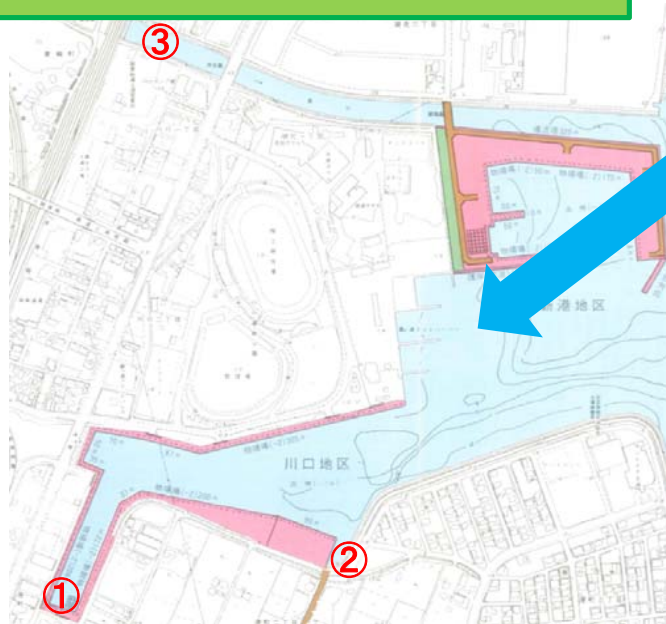

作業前アオコ発生状況③




作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業前アオコ発生状況②

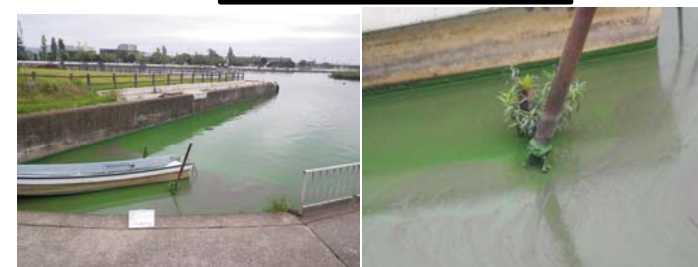

作業船によるアオコ攪拌作業③



1. 対策箇所: 土浦港、新川
2. 発生状況: 土浦港内、レベル2~6、新川レベル6のアオコ発生(午後)
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 朝方は北北西の風で、不動前レベル6、造船所前レベル4、全体が3程度とアオコは少ない感じであったが、作業開始後3時間程するとアオコが浮上し、レベル5となった。攪拌作業により、レベル3となる。
新川は河口側に浮遊し、フェンス部に滞留せず。午後、北東の風によりフェンス部に滞留し、レベル6となる。攪拌後レベル3となる。

