


作業前アオコ発生状況



# 7月28日アオコ対策状況

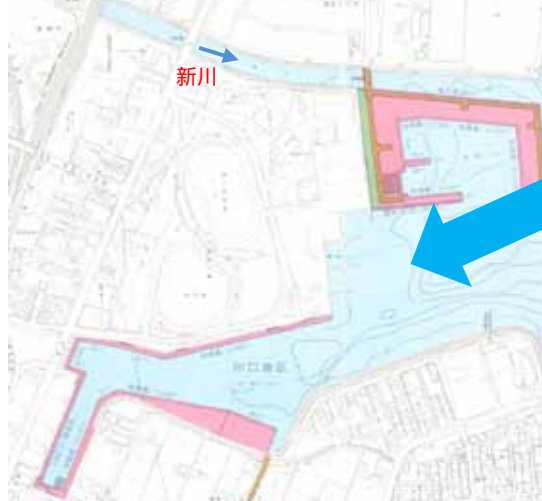

作業前アオコ発生状況

作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～6のアオコ発生。新川上流レベル4～5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 攪拌箇所についてはレベル3～4程度まで下がり、腐敗したアオコは拡散される。悪臭は多少残るが、見た目は改善される。



水馬アオコ回収状況



作業前アオコ発生状況



# 7月28日アオコ対策状況



みずすましアオコ回収状況



水馬アオコ脱水状況



みずすまし脱水状況



水馬脱水アオコ4本



みずすまし脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4 ~ 6のアオコ発生
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶4本、「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶2本  
気温が高く、回収箇所のアオコはレベル6である腐敗が始まると悪臭が発生して来る為、作業状況は劣悪である。
