


作業前アオコ発生状況



8月1日アオコ対策状況

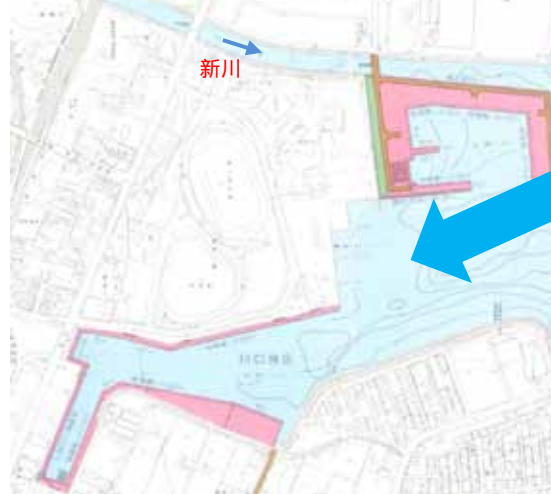

アオコ攪拌作業後



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業




作業船によるアオコ攪拌作業



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～5のアオコ発生。ピオパーク横はレベル5強
新川上流レベル4～5、フェンス周囲はレベル5強
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 南東の風で、アオコが土浦港内に寄せられて来ていたが、攪拌作業によりレベル3～4程度で維持され、腐敗による悪臭までは無い。

8月1日アオコ対策状況

作業前アオコ発生状況

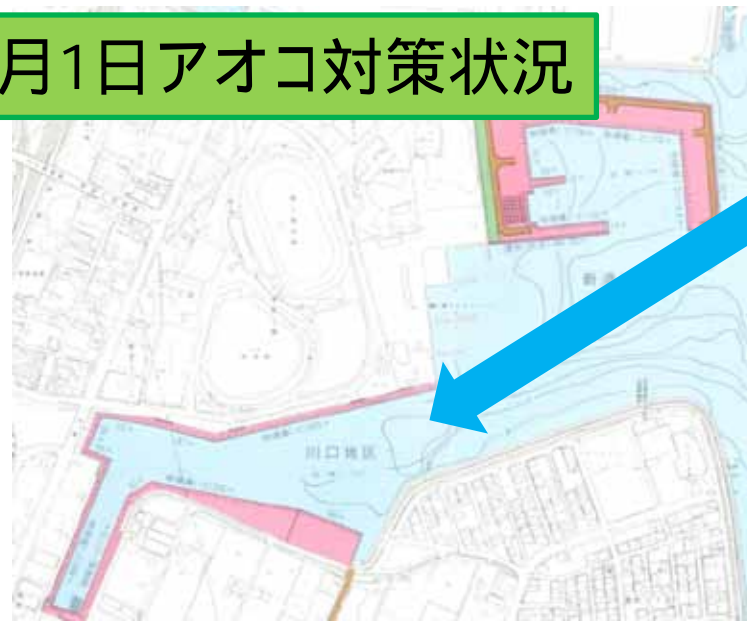

水馬アオコ脱水状況



水馬アオコ回収状況



みずすましアオコ回収状況



みずすまし脱水状況



みずすまし脱水アオコ2本



水馬脱水アオコ3本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～5のアオコ発生、
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本、「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶2本
南東の風でアオコが土浦港内奥の観光ホテル前にどんどん寄せられて来ていたが、攪拌作業と回収作業を行うことで、レベル6までには行かず何とかレベル3～5を維持していた。
本日も気温は高温であり、日差しの照り返しが非常に厳しい一日で、アオコ回収作業は大変であり、こまめな休憩が必要である。
