

作業船によるアオコ攪拌作業



8月9日アオコ対策状況



攪拌作業後



作業船によるアオコ攪拌作業



攪拌作業前



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業




1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3～5のアオコ発生。新川上流レベル5強
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 朝から東から北東の風で、土浦港内はバイオパーク横と新川が「レベル5強あったが、攪拌により、レベル3～4で臭気もあまり感じられなかった。他は攪拌作業と風波によりレベル3程度であった。

水馬アオコ回収状況



8月9日アオコ対策状況

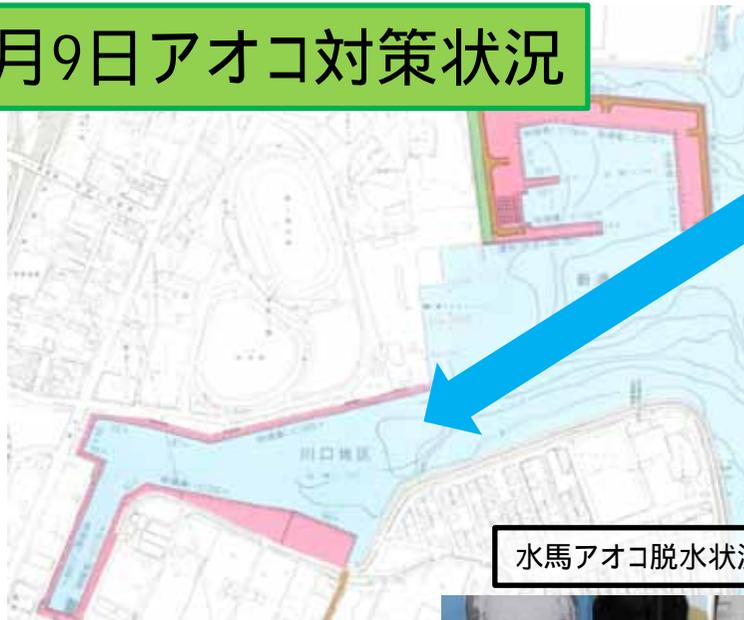

アオコ発生状況状況



みずすましアオコ回収状況



水馬アオコ脱水状況



みずすましアオコ脱水状況



水馬脱水アオコ3本



みずすまし脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3 ~ 5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶2本。
東から北東の風の為、水馬・みずすましで回収しているコンビニ前・観光ホテル前にアオコが吹きよせれていたが、回収効果からレベルは3 ~ 4程度を維持
本日も風は冷たく日陰にいると良いが、相変わらず日差しは強く、外の回収作業は大変であった。
